

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๐๖๓ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน ซีที - วีที และมิเตอร์แบ่งแดนชั่วคราว ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๗	๒๓ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงาน ผมต.กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน ซีที , วีที และมิเตอร์แบ่งแดน บริเวณข้างวัดสิรินธร	SF๖ KTD ๐๗S-๐๗ สะพานข้ามคลอง วัดสิรินธร คลองแค	Dis KTD ๐๗S-๑๒ สามแยก วรรณวิจิตร ชนแดน อมน.	นายรินทร์ พจน์สมพงษ์ พงษ.๗ ผปบ. โทร.๐๘๗-๗๐๒๐๕๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพจรุญ กระจ่มทอง ตำแหน่ง พงษ.๗ ผปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๘-๓๖๒๒๔๙๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD7 จาก KTD75-07 ถึง KTD75-12

ในวันที่ 23 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1400/2566

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีระชัย เสรหมิง ประสานงานการขอดับไฟกับ กก.นพจรุญ กระจ่มทอง
17 ก.ย. 66

(นายวีระชัย เสรหมิง)

ตำแหน่ง รจก.๔ แทน น.ผ.ค.น.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณมิเตอร์แบ่งแดนสิรินธร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT VT		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1400/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	18 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภภัทร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	
4	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		load 5.38 MW
5	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	load 3.38 MW
6	- ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนไปรับจาก ONC03						
7	KTD07S-11	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ช่าง บ.โอโนโน
8	KTD07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินธร
9	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
10	KTD07S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สามแยกวรรณวิจิตร
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
16	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	
17	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
18	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
20	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
21	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	
22	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		load 5.38 MW
23	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	load 3.38 MW
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
26	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	KTD07S-12	ปลด	สับ		กทบ.		DIS สามแยกวรรณวิจิตร
28	- ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนไปกลับจาก ONC03						
29	KTD07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินธร
30	KTD07S-11	สับ	ปลด		กทบ.		SF6 ช่าง บ.โอโนโน


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
32	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
33	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
34	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณข้างวัดสิรินธร ตำบลอ้อมน้อย
 เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กทบ. สับเปลี่ยน ซีที, วีที และมีเตอร์แบ่งแดนชำรุด
 วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

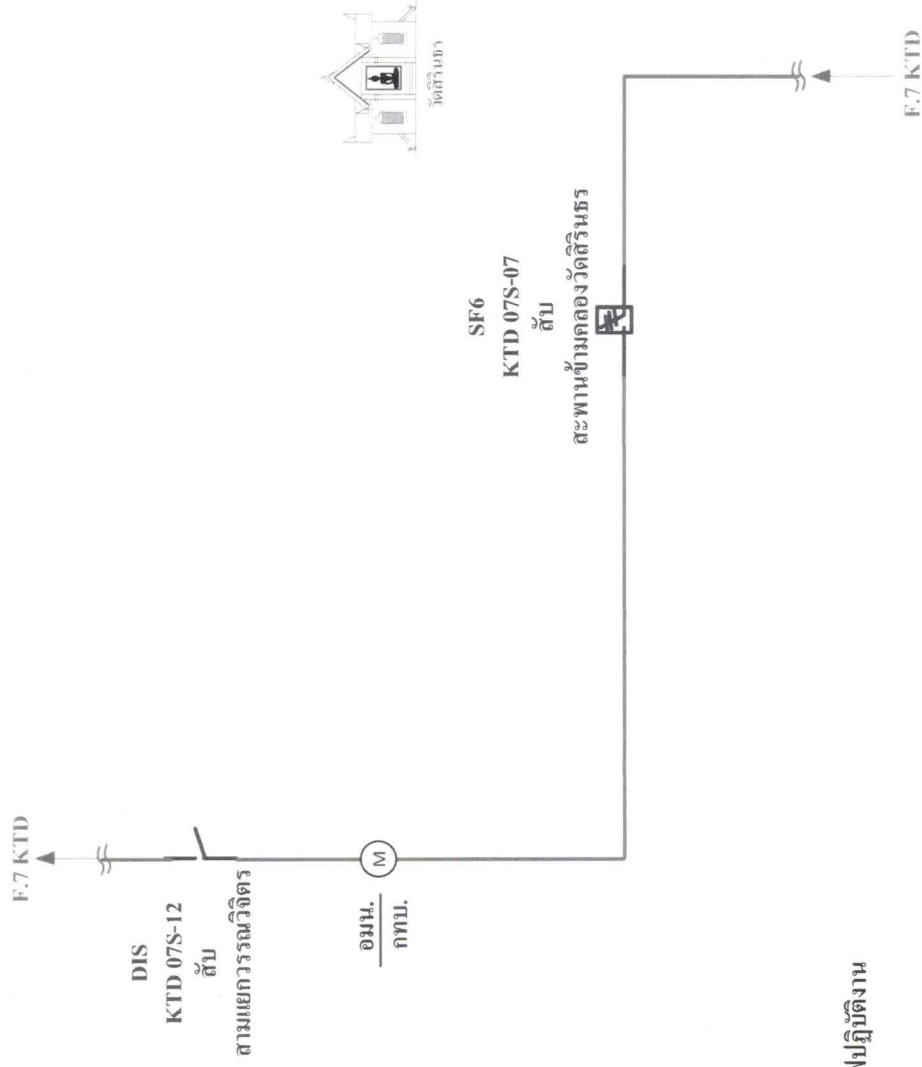

หมายเหตุ
 ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

แผนผังเบื้องต้น หลักรูปภาพ บริเวณข้างวัดสิรินธร ตำบลอ้อมน้อย
 เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กทบ. สับเปลี่ยน จีที, วีที และมีเตอร์แบ่งแดนชำระ
 วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

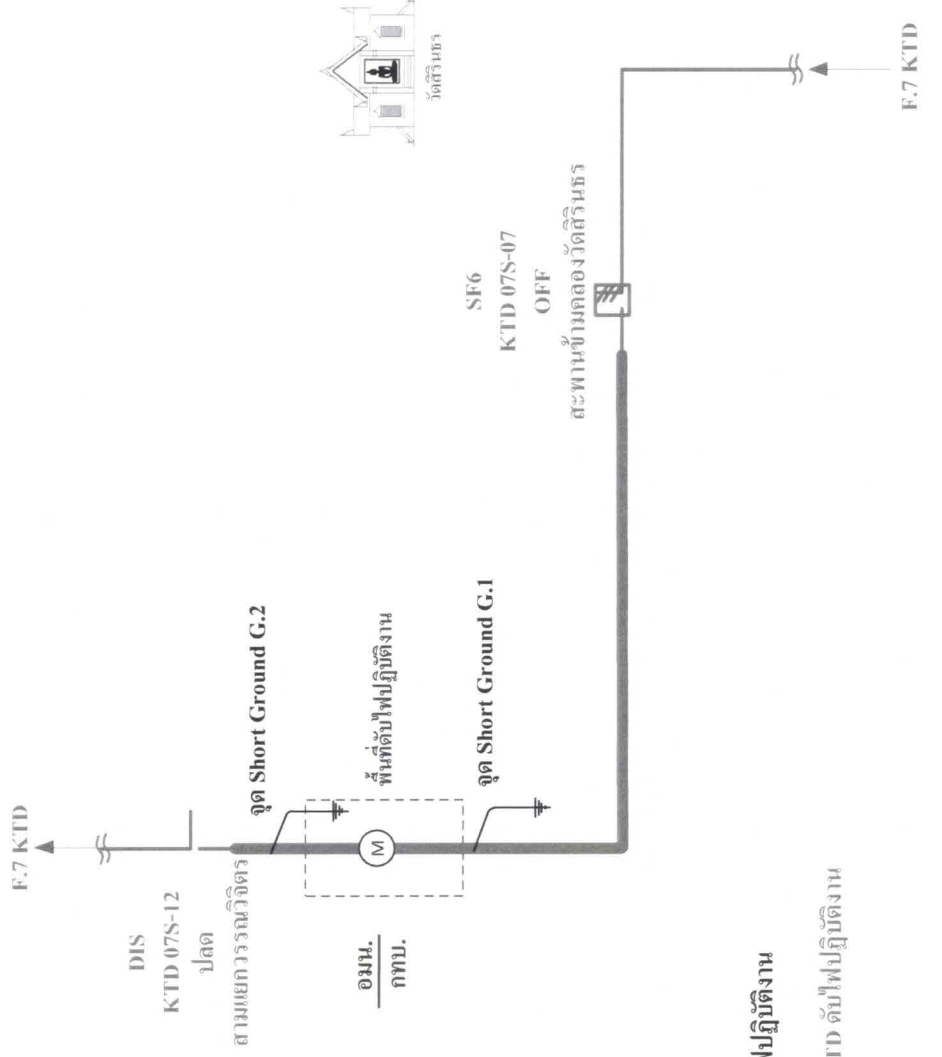

หมายเหตุ ไม่มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

เส้นทึบสีเขียว ไลน์วงจร 7 KTD ดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground G.1 - G.2

