



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**Switching Deadline**

7 ก.พ. 2567

เลขที่ ก.๓.กบข.(นส.) ๒๑๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวน

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)...จะขอตัดไฟต้น Riser Pole สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๒ รหัส SMX ๕S-๐๑ เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อนสายลิตเข้าหัว Pothead เฟส C พร้อมทั้งตรวจสอบบริเวณจุดต่อ จุดสัมผัสทุกจุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMX ๕VB-๐๑	๑๑ ก.พ. ๖๗	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนสายลิตเข้าหัว Pothead เฟส C ต้น Riser Pole หน้าสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๒	SMX ๕VB-๐๑	SMX ๕S-๐๑	นายไพรัช น้อยมณี พงษ.๗ ๐๘๑๕๗๑๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ.....ตำแหน่ง พงษ.๖ ผนส.กบข.(ก.๓).....โทร ๐๖๑๕๕๓๖๒๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวน..)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก.๓).....

๒๕๖๖.๑๒.๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMX ๕ จาก SMX ๕VB-๐๑ ถึง SMX ๕S-๐๑  
ในวันที่ 11 ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 172/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นุชทอง ฟางเงิน.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

(นายไพรัช น้อยมณี)  
จุดก.4 กกน ผน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. บข.๑.....

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 4 (สถานี SMX.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)






การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# รายงานผลการตรวจสอบจุดร้อน

## (Thermo Scan Reports)

ต้น Riser Pole รหัส SMX 5S-01 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 12

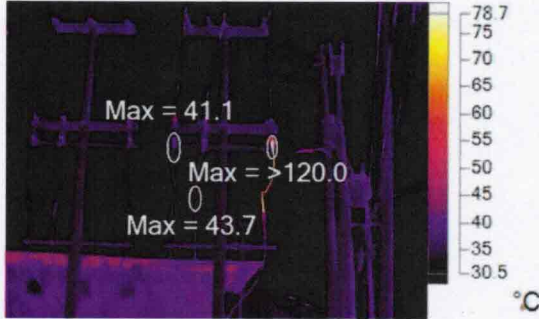

AC011600.IS2

1/16/2024 1:44:18 PM

-สายลีดเข้าหัว Pothead เฟส C



Visible Light Image

### Image Info

Emissivity	0.83
Image Range	-0.3°C to >120.0°C
Camera Model	Fluke TiX620/TiX640/TiX660
IR Sensor Size	640 x 480
Camera serial number	Fluke TiX620/TiX640/TiX660, 300437
Image Time	1/16/2024 1:44:18 PM
Distance to Target	9.00m
Humidity adjustment	65

### Main Image Markers

Name	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	>120.0°C	0.83	32.0°C	24.97
A1	41.1°C	0.83	32.0°C	10.81
A2	43.7°C	0.83	32.0°C	8.40

### Recommendation

Label	Value	Difference Temp.	Recommendation
A0	>120.0°C	>120.0°C	ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน
A1	41.1°C	9.1°C	ตามแผนงาน
A2	43.7°C	11.7°C	ตามแผนงาน

Difference Temp.: อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิใช้งาน

### Remark

๑.ตรวจสอบพร้อมดำเนินการแก้ไข ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย ผบส.กบข.ฝปบ.ก.๓
