



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ธ.ค. 2566

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๒๘๕๙ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อให้ บริษัท โซลาโก จำกัด ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ KV. ภายใน โครงการโทรเชียว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV.	20-21-22 ธ.ค.66	19.00 น.	04.00 น.	บำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ KV	LBL2YS-07 SPN2YS-0๘	ปลายสาย ปลายสาย	นายเอกอาทิตย์ ชูมีชัย 092-6977708

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) โทรเชียว * งานอ้างเลขที่ 1800 กบช(ก3) อีช โทรที่ชว-Section. ลิงค์ *

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)
รจก.(ท)รช. ผจก.กฟอ.บล.

หมายเหตุ

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคพ.พิจารณาแล้วเห็นควร

254K 14B-01 LBL2YS-07

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ 115KV จาก 254K 14B-01 ถึง 3PN2YS-08

ในวันที่ 20-21-22 ตั้งแต่วันที่ 19.00 น. ถึง 04.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1837/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ณิศ ชูศรี* ประสานงานขอตัดไฟกับ *นายเอกอาทิตย์ ชูมีชัย (บ.โซลาโก)*

(Signature)
(นายสุภัสวดี เทียงพวง)
๒๑.5 กกช. นพ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2แผ่น

เรียน ผจก. *กฟอ.บางเลน, กฟภ.บางเลน*

แผนผังแนบ..... -แผ่น

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

ผจพ. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VSPP บริษัท โซลาร์ โกล จำกัด (โครงการไทรเขียว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-21-22 ธ.ค. 66	ระหว่าง	19.00 น. ถึง 04.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	บ.โซลาร์โกล	งานที่ทำ	บำรุงรักษาในระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1837/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 19 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ รหัส SNO2YB-02,03 SNO03YB-02,03 จ่ายไฟ Close loop ปกติ						
3	ติดต่อ ทรานสเนะ ฝรล.ปรับรีเลย์ SPN02YB-01 และ กฟภ.1 ปรับรีเลย์ LBL02YB-01						
4	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SKY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรเขียว		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	LBL02YS-06	ปลด	ล๊ับ		บลง.	LBS	หน้า บ.ไทรเขียว
9	2SKY01YB-01	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	2SKY01YS-01	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
11	2SKY01YS-02	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
12	2SKY02YB-01	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	2SKY02YS-01	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
14	2SKY02YS-02	ล๊ับ	ปลด		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี
15	SPN02YS-08	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.	ABS	หน้า บ.ไทรเขียว
16	LBL02YS-07	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.	ABS	หน้า บ.ไทรเขียว
17	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้งสถานะไฟดับให้ บ.ไทรเขียว ทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ บ.ไทรเขียว ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SPN02YS-08	ปลด	ล๊ับ		บลง.	ABS	หน้า บ.ไทรเขียว
24	LBL02YS-07	ปลด	ล๊ับ		บลง.	ABS	หน้า บ.ไทรเขียว
25	2SKY01YS-01	ปลด	ล๊ับ		ไทรเขียว	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	2SKY01YS-02	ปลด	สับ		ไทรเชียว		- ไบมิต 115 เควี
27	2SKY01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ไทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	2SKY02YS-01	ปลด	สับ		ไทรเชียว		- ไบมิต 115 เควี
29	2SKY02YS-02	ปลด	สับ		ไทรเชียว		- ไบมิต 115 เควี
30	2SKY02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ไทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	LBL02YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.	LBS	หน้า บ.ไทรเชียว
32	ติดต่อ ทรนระ ทรล.ปรับรีเลย์ SPN02YB-01 และ กฟภ.1 ปรับรีเลย์ LBL02YB-01						
33	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	2SKY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ไทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

LBL2YS-06



SPN2YS-05


SPN2YS-04

LBL2YS-07

ผังงานดับไฟ โครงการ ไทรเขี้ยว

วันที่ 20-21-22 ธันวาคม 2566

เวลา 19:00 - 04:00 น.

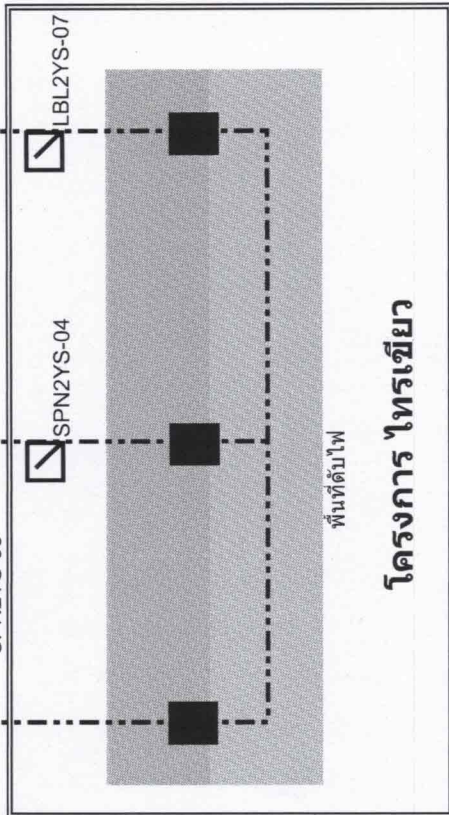

พื้นที่ดับไฟ

โครงการ ไทรเขี้ยว
