



Switching Deadline

11 ឆ.ប. 68

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ...จะดำเนินการ...ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.กฟส.กทบ และ ชุดงานฮอตไลน์ กฟส.สพ. ปฏิบัติงาน
แก้ไขเสาไฟเอนในซอยสายไทรรัก - คลองมะเคื่อ 3 (ศาลปู่ดำ) ,สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 10 ตามแผนผังแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMJ 09	16 เม.ย. 2568	8.30 น.	17.00 น.	แก้ไขเสาไฟเอนในซอยสายไย รัก - คลองมะเตือ 3 (ศาลปู่ดำ)	อุปกรณ์ตัดตอน ชั่วคราว (ถัดจาก อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA02S-08)	ปลดจุดเชื่อมสายแรง สูง หัวเสา DDE (ตามวิธีขุดรอกแบบชั่วคราว)	นายภฤณณะ ชนะภัย พชง.7 ผบ.ภ.พ.ส.ก.ทบ. โทร. 098 - 8315274

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ).....ตั้งแต่ ปลัดอุปกรณ์ตัดตอนชั่วคราว (ถัดจากอุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTA02S-08) จนถึง ปลัดจุดเชื่อมสายแรงส่ง หัวเสา DDE มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 25 ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.บ.บ.กฟส.กท. โทร 087-6715626

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long :13.645017, 100.280425.....
3.2 สิ้นสุด Lat,Long :13.644609, 100.280713.....

(นายมานิช วาสกริ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

១០ មេសា ២៥៦៨

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 5M9 จาก ... ถึง ...

ในวันที่ 16 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 637/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อัสภาณวัจน์ ธัมไพรัช ประธานงานการขอดับไฟกับ คุณสมพร ธวัชโรจน์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปปบ.(คพ)

เรียน อภ.สพ.(ก๓), อภ.วว.(ก๓), ผจก. กฟผ. กทบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวพิจดา พงษ์ศิริ)

2010.5 1994 UW. AN.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 3 แผ่น


ผจพ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


หน้า 1 จาก 2
เบสทาสวทชง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยสายใยรัก - คลองมะเดื่อ 3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 เม.ย. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาไฟเอนตามใบขอปฏิบัติงาน 637/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	11 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 เมษายน 2568
7. สิ่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรพัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุกัซซา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-
4	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
5	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
6	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
7	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-
8	ย้ายโหลด SMJ09 บางส่วน ไปจ่ายจาก KTA02						
9	KTA02S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 แยกศาลพ่อปู่
10	KTA04S-06	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ก่อนถึง บ.สยามเมธี
11	DIS ชั่วคราว SMJ09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ก่อนแยกศาลพ่อปู่
12	KTA04S-06	สับ	ปลด		กทบ.		SF6 ก่อนถึง บ.สยามเมธี
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง บริเวณจุดที่จะปฏิบัติงาน (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส						
15	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง บริเวณจุดที่จะปฏิบัติงาน (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
16	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการตัด DDE บริเวณฝั่งตรงข้ามบริเวณบึงหนองเบญจรงค์ (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการตัด DDE บริเวณฝั่งตรงข้ามบริเวณบึงหนองเบญจรงค์ (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
23	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
24	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-
25	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
26	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	-
28	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
29	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ							
30	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
31	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-	-
32	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
33	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
34	SMJ07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-	-
35	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-	-
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
38	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย							
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
40	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการเชื่อม DDE บริเวณฝั่งตรงข้ามบริษัทบูรณาเบญจรงค์ (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส เข้าทั้ง 3 เฟส							
41	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการเชื่อม DDE บริเวณฝั่งตรงข้ามบริษัทบูรณาเบญจรงค์ (วงจร SMJ09) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
42	ย้ายโหลด SMJ09 บางส่วน กลับจาก KTA02							
43	KTA04S-06	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ก่อนถึง บ.สยามเมธี
44	DIS ชั่วคราว SMJ09	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ก่อนแยกศาลพ่อปู่
45	KTA04S-06	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ก่อนถึง บ.สยามเมธี
46	KTA02S-08	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	แยกศาลพ่อปู่
47	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
48	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-	-
49	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
50	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
51	SMJ07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	-
52	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ถนนสายไยรัก - วิทยาลัยพ่อแก้ว
 เพื่อปฏิบัติงาน แกะไขเสาไฟเอนในซอยสายไยรัก - คลองมะเดื่อ 3
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันพุธที่ 16 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

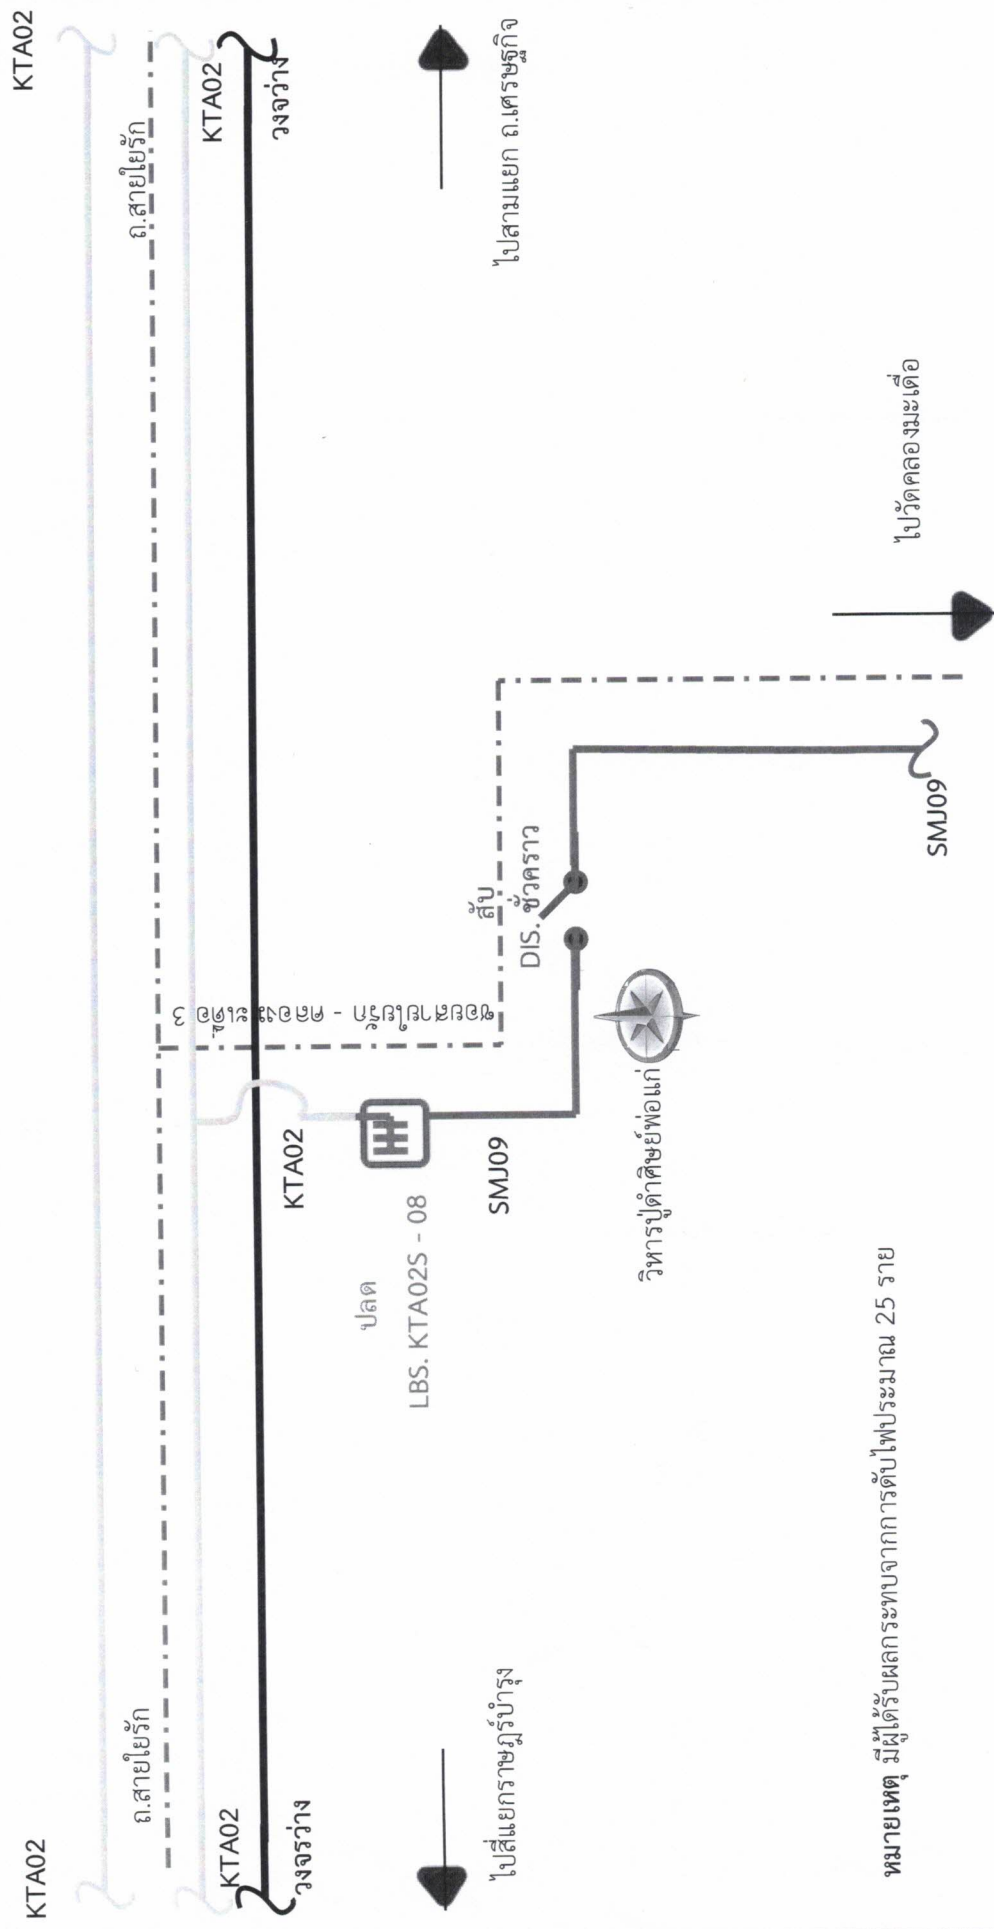

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟประมาณ 25 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไฟ บริเวณ ถนนสายไยรัก - วิหารปู่คำศิษย์พ่อแก่ เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขเสาไฟเอนในซอยสายไยรัก - คลองมะเดื่อ 3 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันที่ 16 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

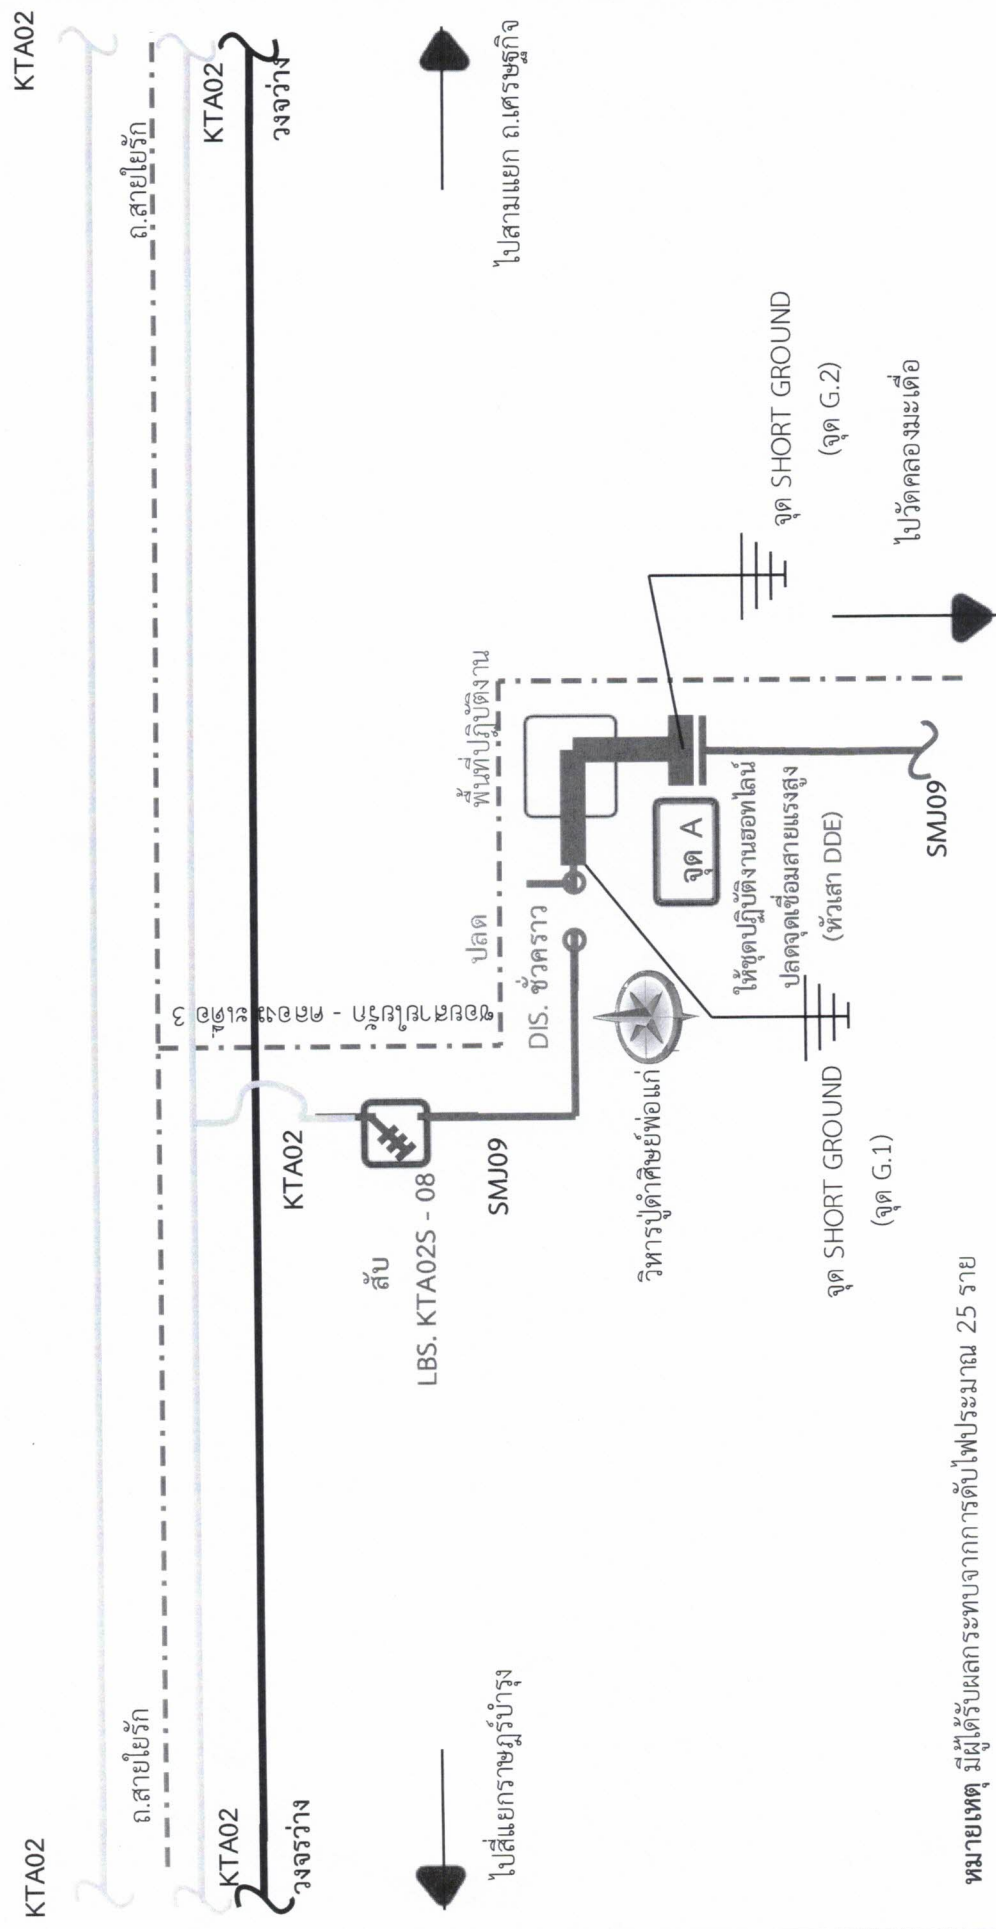

หมายเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟประมาณ 25 ราย

พื้นที่ดับไฟ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังตัดไฟ บริเวณ ถนนสายไยรัก - วิทยาลัยพ่วง

เพื่อปฏิบัติงาน แกะไขเสาไฟเอนในซอยสายไยรัก - คลองมะเดื่อ 3

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันพุธที่ 16 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานขอท่ไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง (หัวเสา DDE คือ วงจร SMJ09)

