

เลขที่ ก.ต.กฟส.อ.ดจ.- ๑๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านสะพาน
สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA06	20 ม.ค.2567	08.00 น.	16.30 น.	ตัดไฟปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณบ้านสะพาน	จุดตัด DDE	Dis ชั่วคราว คลอง 13	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๙-๘๓๖๘๑๙๔
๒	DOA06	27 ม.ค.2567	08.00 น.	16.30 น.	ตัดไฟปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณบ้านสะพาน	DIS ชั่วคราว สะพานโคกหม้อ	DBA03S-16 ตึสบ้านสะพาน	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๙-๘๓๖๘๑๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ผู้ใช้ไฟบริเวณบ้านสะพาน,บ้านดอนมะเกลือ,บ้านหนองกระพุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ นิลแดง ตำแหน่ง พชง.๗ ผก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร ๐๘๙-๘๓๖๘๑๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DOA6 จาก DDE ของ DOA06 ถึง Dis ชั่วคราว คลอง 13
ในวันที่ 20 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 67/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ส. พิษณุ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสำเร็จ นิลแดง


(นางสาวพิษณุ พงษ์ศิริ)
วันที่ 5 ม.ค. ๖๗


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. อ.จ. กฟส. อ.จ.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านสระด่าน (DOA06)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 67/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 11 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านสระด่าน
5	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ
6	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA03						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านสระด่าน
9	Dis ชั่วคราว (DOA06)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS คลอง 13
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
11	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE วงจร DOA06 - Dis ชั่วคราว คลอง13 (หม้อแปลง 2 เครื่อง)						
12	เมื่อ กฟส.ดอนเจดีย์ ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ จุดตัด DDE วงจร DOA06 - Dis ชั่วคราว คลอง13 แล้วเสร็จ						
13	แจ้ง ชุดฮอทไลน์ ทำการตัด DDE ในวงจร DOA06 (แบบมีไฟ ตามผังแนบได้)						
14	เมื่อ ชุดฮอทไลน์ ทำการตัด DDE ในวงจร DOA06 แล้วเสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดอนเจดีย์รับทราบ						
16	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
17	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ ทำการช้อดกราวด์ จุด G1,G2						
18	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
19	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
20	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
21	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สข.		R บ้านสระด่าน
22	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กฟส.ดอนเจดีย์ แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
24	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ ปลดช้อดกราวด์จุด G1,G2						
25	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
26	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA03R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
28	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	แจ้ง ชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE ในวงจร DOA06 (แบบมีไฟ)						
31	เมื่อ ชุดขอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE ในวงจร DOA06 แล้วเสร็จ						
32	แจ้ง กฟส.ดอนเจดีย์ นำโหลด วงจร DOA06 เข้าระบบได้ทั้งหมด						
33	เมื่อ กฟส.ดอนเจดีย์ นำโหลด วงจร DOA06 เข้าระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ						
34	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนกลับจาก DOA03						
35	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
36	Dis ชั่วคราว (DOA06)	ปลด	สับ		ดจ.		DIS คลอง 13
37	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านสระด่าน
38	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
39	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
40	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
41	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านสระด่าน
42	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ก่อนดับไฟ งานปรับปรุงบริเวณบ้านสะพานโคกหม้อ-R.โคกหม้อ(ช่วง 2) วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น.

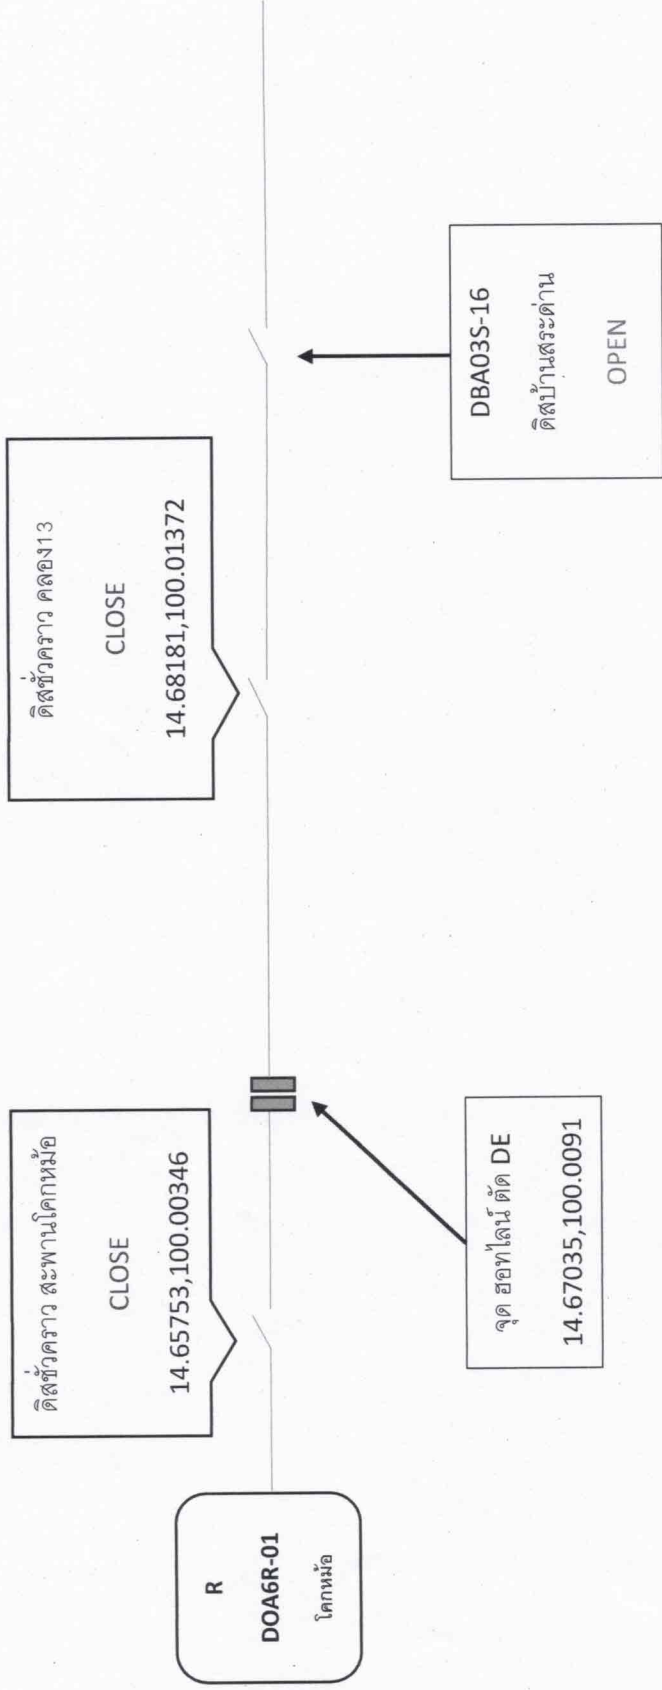

หลังดับไฟ งานปรับปรุงขบวนบ้านสระด่าน-R.โคกหม้อ(ช่วง 2) วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น.

