



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๓๐๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA4YB	20 ก.พ. 67	08.00	17.00	ถนนเสา และเชื่อม UG 115 kV เข้าระบบสายส่ง / มอเตอร์เวย์ ไทยน้ำทิพย์	- NCA4YS-05	- NCA4YS-07 - NCA4YS-06	นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชม.กร.กรย.(ก3) 099-1326977
2.	NCA02	20 ก.พ. 67	08.00	17.00		- NCA02S-04	- NCA02S-05 - NCA02S-07 - NCA02S-09	
3.	NCA07	20 ก.พ. 67	08.00	17.00		- SF6 ชค. แยกหมู่บ้าน สวนตาล	- NCA07S-12	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....รูปปั้นพระพิฆเนศ, ๗-๑๑ วัดหลวง, บั้ม PT, ซอยลูกชิ้นชาลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่ง วิศว.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ถอนเสา และเชื่อม UG 115 kV เข้าระบบสายส่ง.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
ชื่อ..... นายวณภูมิ บำรุงศรี..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๕..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์.....

ตำแหน่ง..... ชฟ.กร.กรย.(ก๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๙-๑๓๒๖๙๗๗..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.....

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวขำ ผ.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๒).....

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... บัสแก๊ส PT (๒วงจร)..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช.๐๒.....

จุดที่ ๒..... ร้านขายหลอดไฟ (๒วงจร)..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช.๐๔..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching.....

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผ.บ., ผ.กส., และ ผ.กร.กรย.(ก๓).....

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....


(นายชลิต สีขาวขำ)
ผ.บ.กฟอ.นครชัยศรี

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(ก๓) ถึง กบบ.(ก๓),กฟอ.นครชัยศรี
เลขที่ ที่ ก.๓ กรย.(ก) ๓๙๒ /๒๕๖๗ วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงานดับไฟ เพื่อดำเนินการปรับปรุงหัวเสาเพื่อรองรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑๑๕ เควี
บริเวณฝั่งตรงข้าม บจก.ไทยน้ำทิพย์
เรียน อก.ปบ.(ก๓),ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วย กรย.(ก๓) ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑๑๕ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม บจก.ไทยน้ำทิพย์ แล้วเสร็จ โดยมีแผนงานปรับปรุงหัวเสาเพื่อรองรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ๑๑๕ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม บจก.ไทยน้ำทิพย์ และนำเข้าใช้งานหลังจากผ่านการทดสอบ AC Withstand Voltage Test แล้ว

จึงขอแจ้งให้ กฟอ.นครชัยศรี ประสานงานดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี,ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณก่อสร้างงานดังกล่าวกับศูนย์จ่ายไฟพร้อมจัดทำ Switching Order ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยประสานงานกับนายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชผ.กร.กรย.(ก๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๑๓๒๖๙๗๗


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)


อก.รย.(ก๓)

๑๒ ก.พ.๒๕๖๗

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

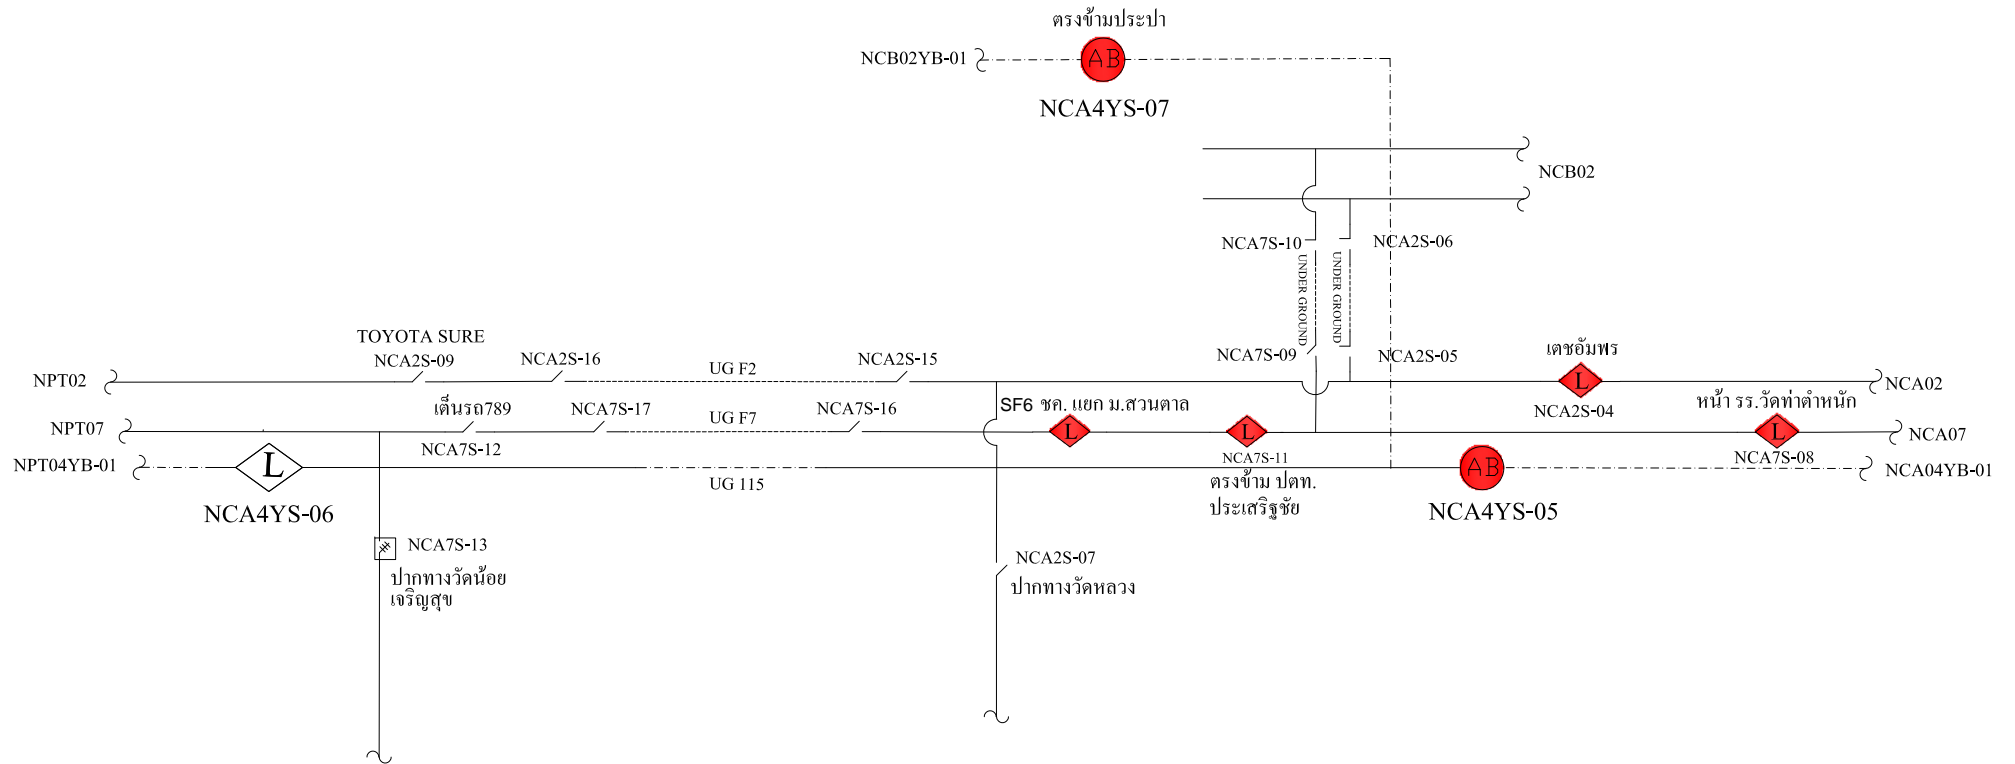

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

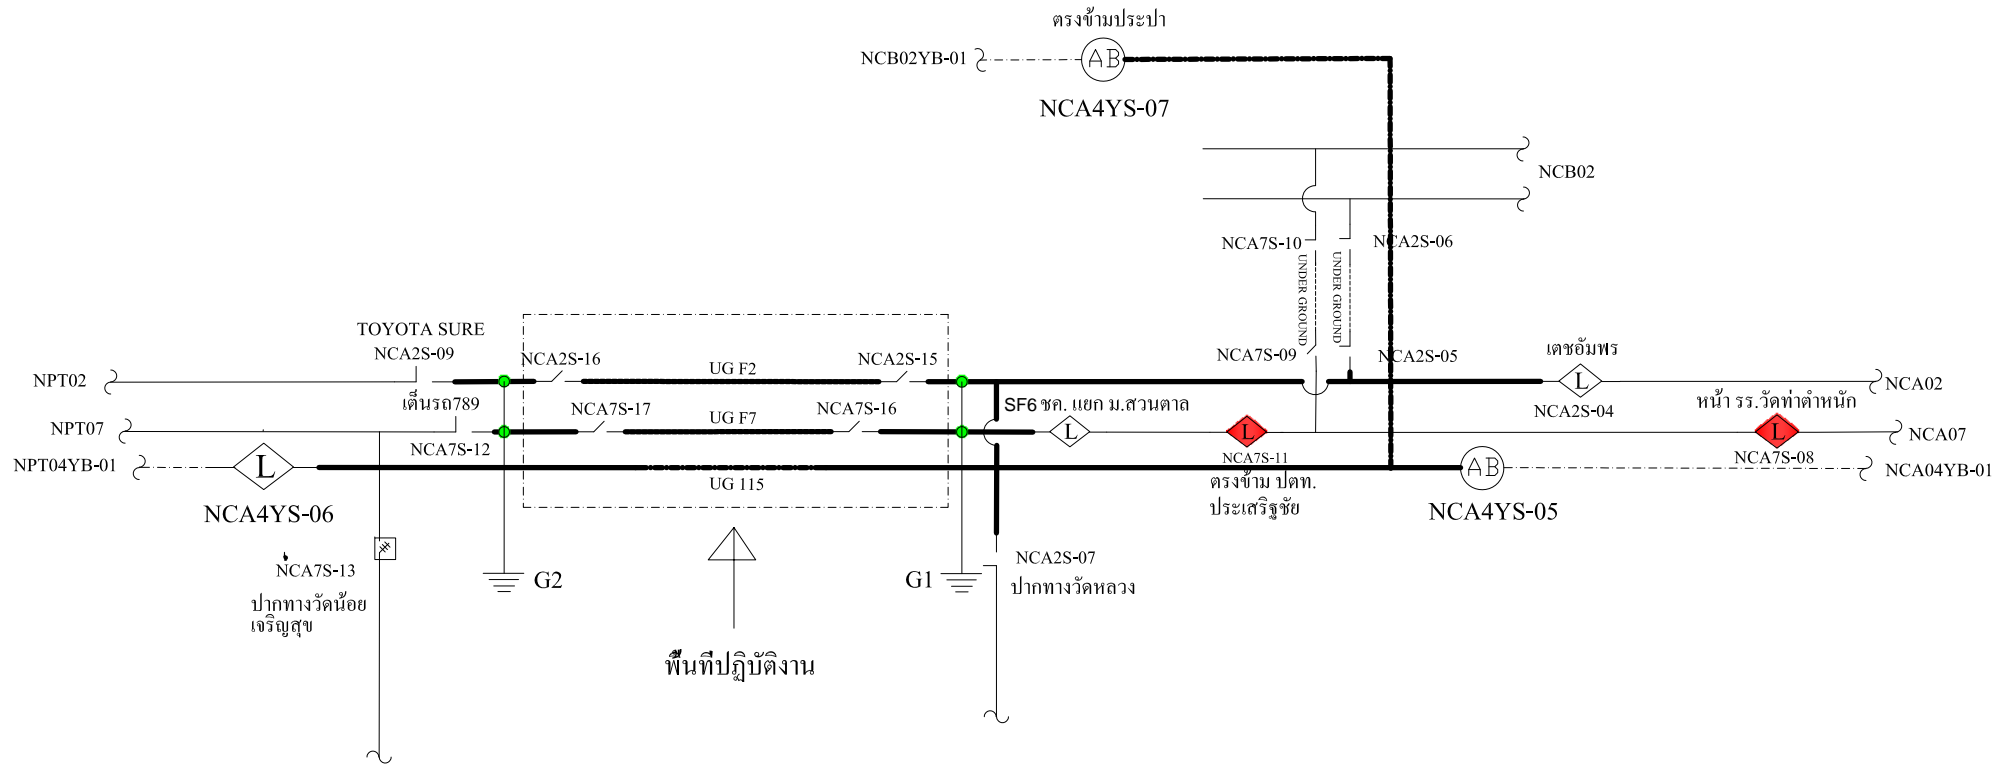

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

