



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๕๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง  
 ลังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB03	18 ม.ค. 68	08.00	17.00	ติดตั้ง TR202/ ห้วยพลู-บางกระ จัน-บางไทรซ้อน	- NCB03S-03	-NCB03S-06 -SF6 ชค. โรงงาน ชวานทอง	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พงษ.5 ผกส.นช. 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บางกระจัน,บางไทรซ้อน,อบต.ดอนแฝก,คลองบางปลาตุก,อบต.ห้วยพลู,คลองเจ๊กิ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่ง วิศว.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๑๕๔๑๑ Long ๑๐๐.๒๑๙๙๕๐๓  
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๒๗๒๑๑ Long ๑๐๐.๑๘๖๓๕๙๙

( นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ )  
 ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
 ผจก.กฟส.นครชัยศรี  
 ๗ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ติดตั้ง Tr๒๐๒ NCB๐๓

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ห้วยพลู-บางกระเจียน-บางไทรซ้อน

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. .... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายศาศวัต คุชรประกอบกิจ ..... ตำแหน่ง..... ชกจ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผกก.กฟส.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๕๔๙-๓๕๓๙ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ

ตำแหน่ง..... พงช.๕ ผกส.กฟส.นครชัยศรี ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๖๔๔-๖๖๖๒ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ..ผู้รับจ้าง

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า ..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... แยกบางกระเจียน ..... ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔

จุดที่ ๒ ก่อน รง.ชวานทอง..... ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒..... จุดที่ ๓ ..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

---

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

---

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง .....

---

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน

วันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชกจ.(ท) , ผบ., ผกส., จป. และ ผู้รับจ้าง

---

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๖ มกราคม ๒๕๖๘

### C๓ Safety CAP ๐๑

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน

เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้

๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง

หมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้

จ่ายไฟฟ้า


(นายชิต สิวาจา)

หน.บ.กฟส.นครชัยศรี

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

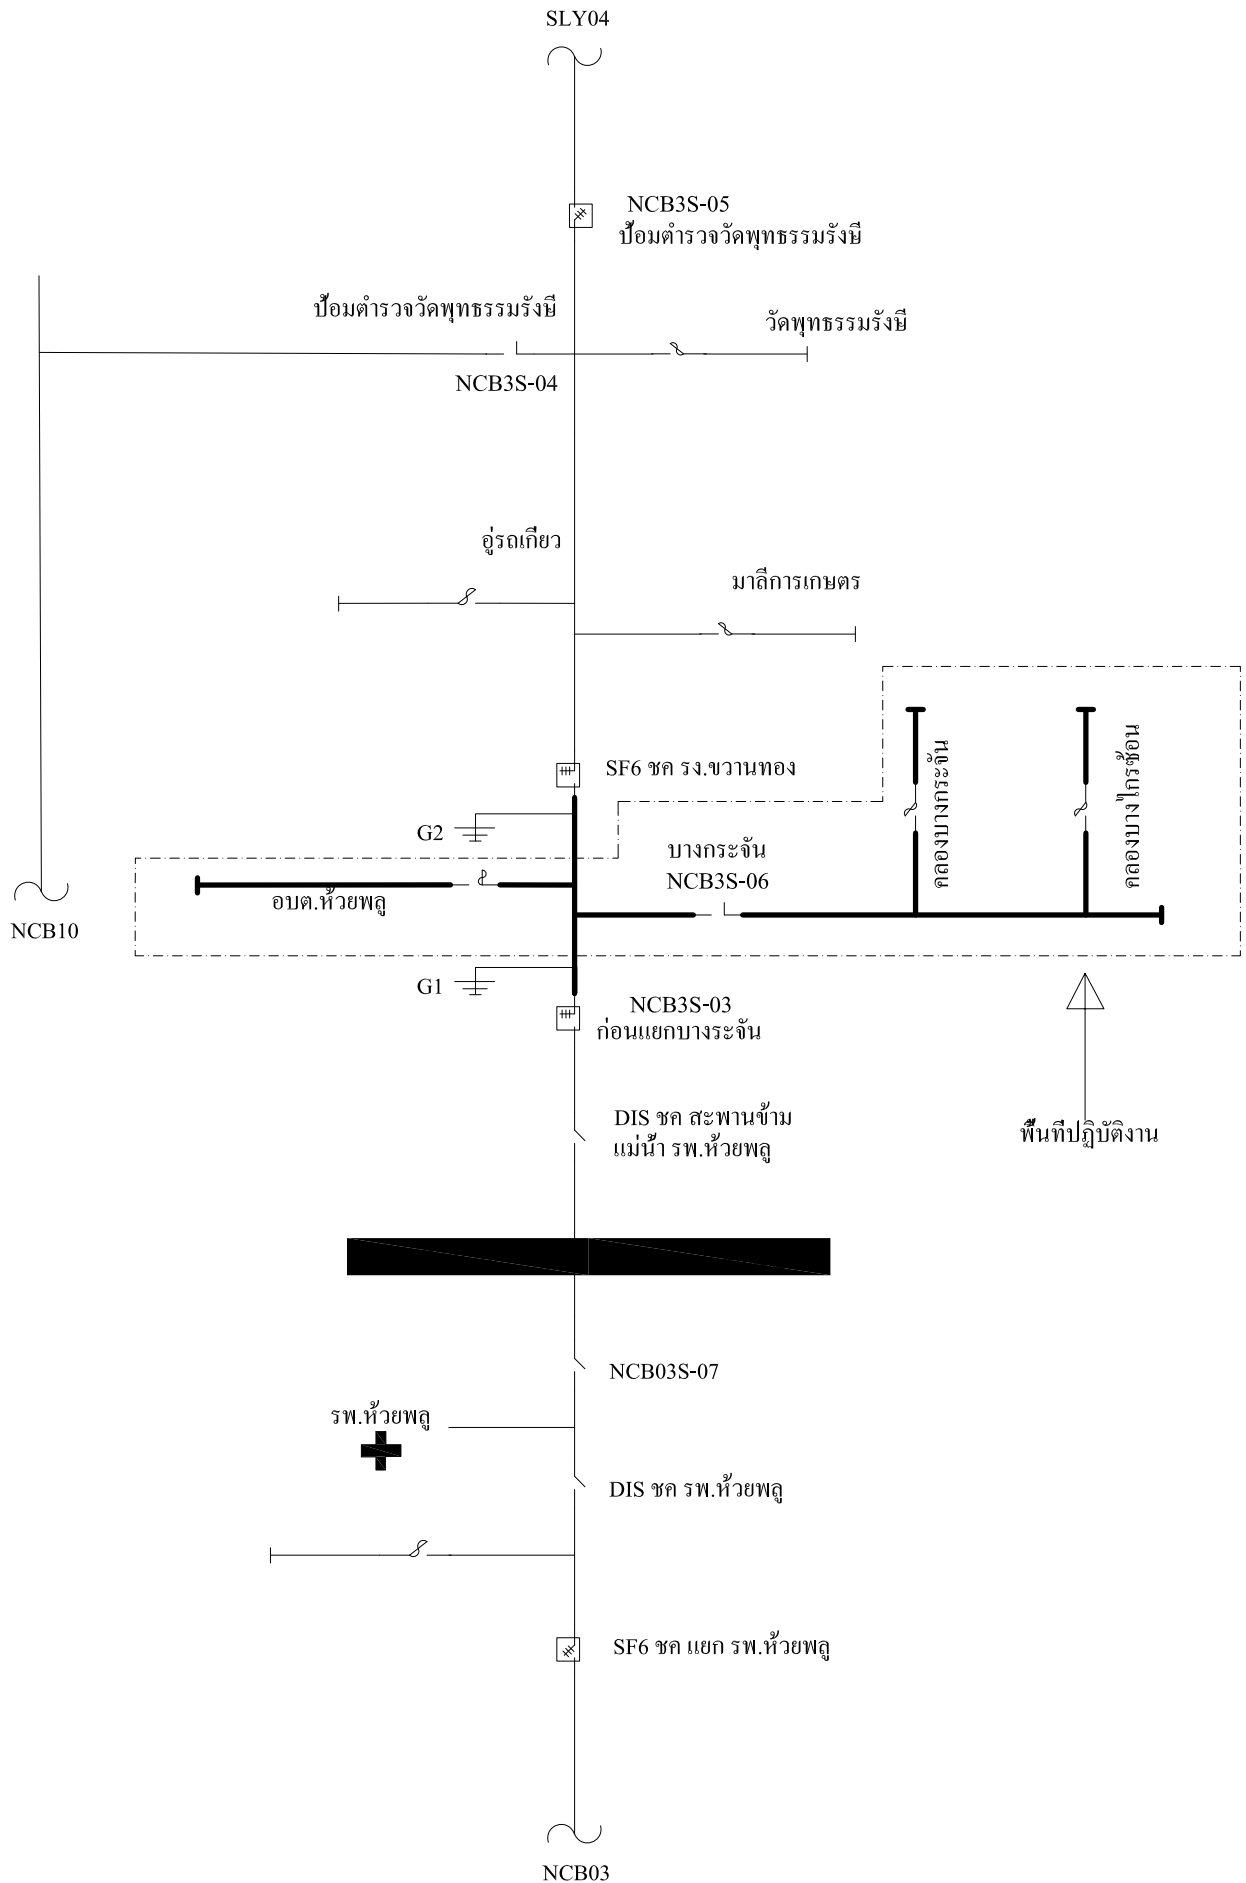

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

