



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๓๕๐ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ควรรประกอบกิจ

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB02	20 มี.ค. 68	08.00	17.00	ปป ระบบจำหน่าย/ปากทางวัดเสถียร - มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์ ขาเข้า กทม.	- NCB02S-16	-NCB02S-17 -NCB02S-22 -NCB02S-23	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พชง.5 ผกส.นช. 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เด็กกอบ,ไฮเทค, คริวท่าเรือเมืองกาญจน์,บึงบางจาก,อู่มานะยนต์,เชียงกง,ก้วยเตียนาย ป.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๕ ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๘๙๙๑ Long ๑๐๐.๑๔๐๔๓๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๐๗๓๔๙๗ Long ๑๐๐.๑๔๙๐๓๓๗

(นายศาสวัต ควรรประกอบกิจ)

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผ.จก.กฟส.นครชัยศรี

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ปป.ระบบจำหน่าย
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ปากทางวัดเสถียร -มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์ ขาเข้า กทม.
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ..... นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง..... ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๔๙-๓๕๓๙ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ
 ตำแหน่ง..... พง.๕ ผจก.กฟส.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๖๔๔-๖๖๖๒ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.,ผู้รับจ้าง

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... แยกวัดเสถียร ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔
 จุดที่ ๒..... มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒ จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน
 วันระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชก.(ท) , ผบ., ผจก., จป. และ ผู้รับจ้าง


๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘


 (นายชลิค สีขาวขำ)
 หน.บ.บ.กฟส.นครชัยศรี

๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้
 ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
 ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้
 จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

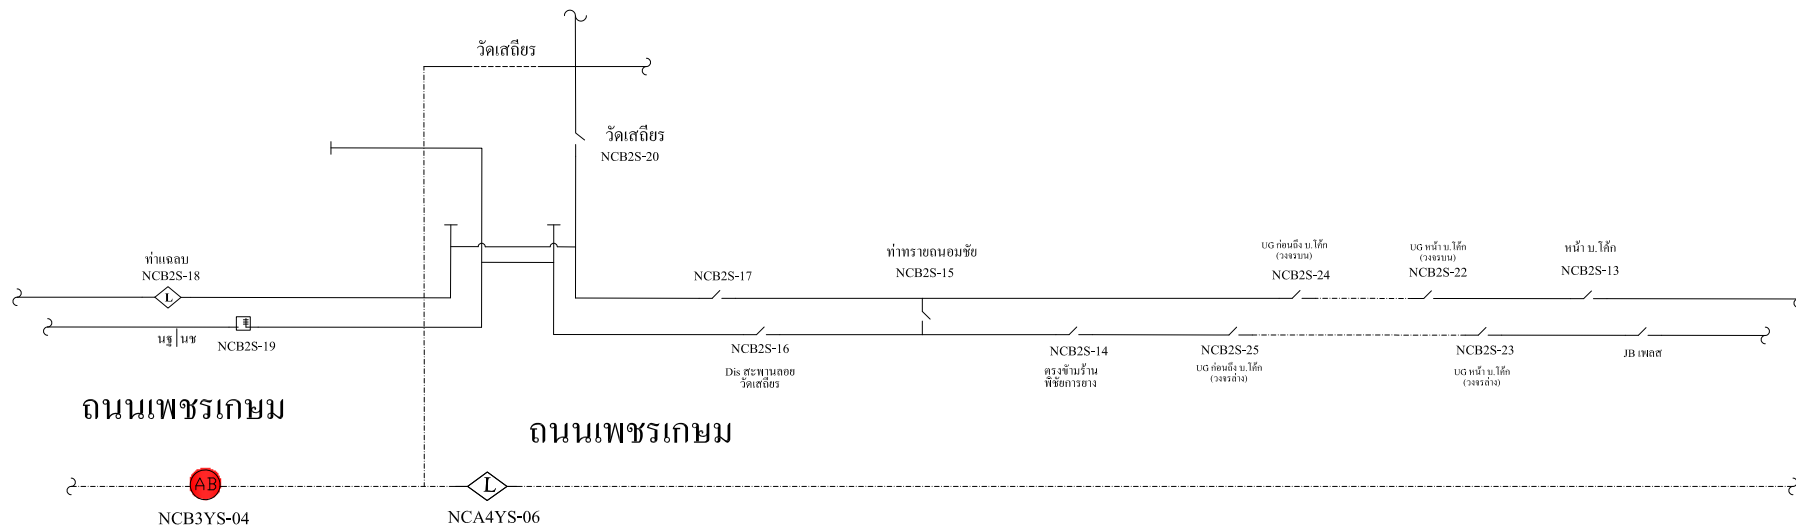


ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม

NCB3YS-04

NCA4YS-06

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

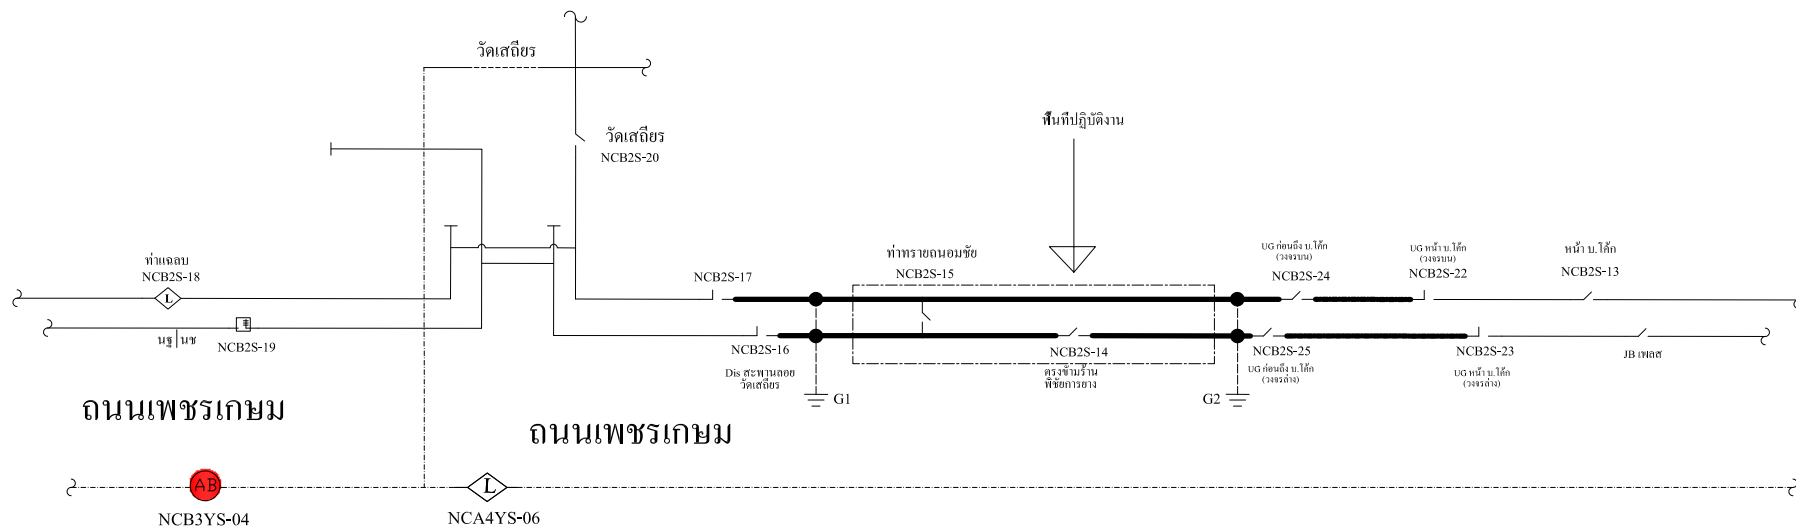

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

