



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) ๑๐๔๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้า
อ้อมใหญ่ 2 และ สถานีไฟฟ้าบางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	31 พ.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115 kV Underground Cable สถานี อ้อมใหญ่ 2	OYK 2YB-01	PMB 3YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโขง ชม.จค.กบส.
๒		1 มิ.ย. 67				OYK 3YB-01	SAA 6YB-01	
๓		2 มิ.ย. 67				OYK 1YB-01	OYK 1BVB-01	
๔		3 มิ.ย. 67				OYK 4YB-01	OYK 2BVB-01	
๕	115 kV	5 มิ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115 kV Underground Cable สถานีบาง ปลา	BAL 2YB-01	SME 3YS-08 (ปากทางสวนส้ม)	
๖		6 มิ.ย. 67				BAL 3YB-01	จุดปลดสายส่ง เสาหีส SD-AS- 3 ต้นที่ 17	
๗		7 มิ.ย. 67				BAL 1YB-01	BAL 1BVB-01	
๘		8 มิ.ย. 67				BAL 4YB-01	BAL 2BVB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง หน.บส.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

๙ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

จุดปลดในระบบสายส่งเสารหัส SD-AS-3 ต้นที่ 17 สำหรับเปลี่ยนแคล้มป์ยึดสาย 115 kV
Underground Cable สถานีบางปลา วงจร BAL 3YB-01

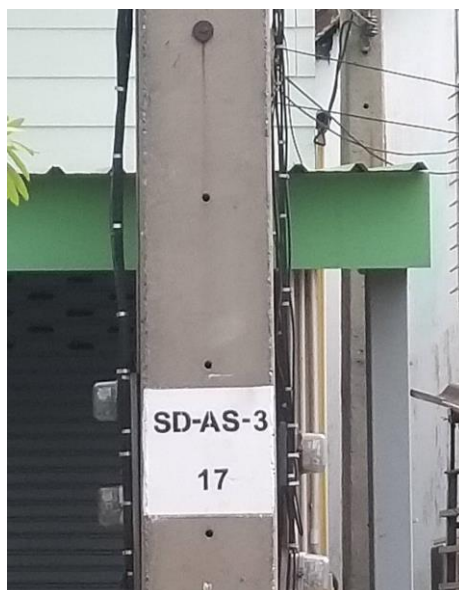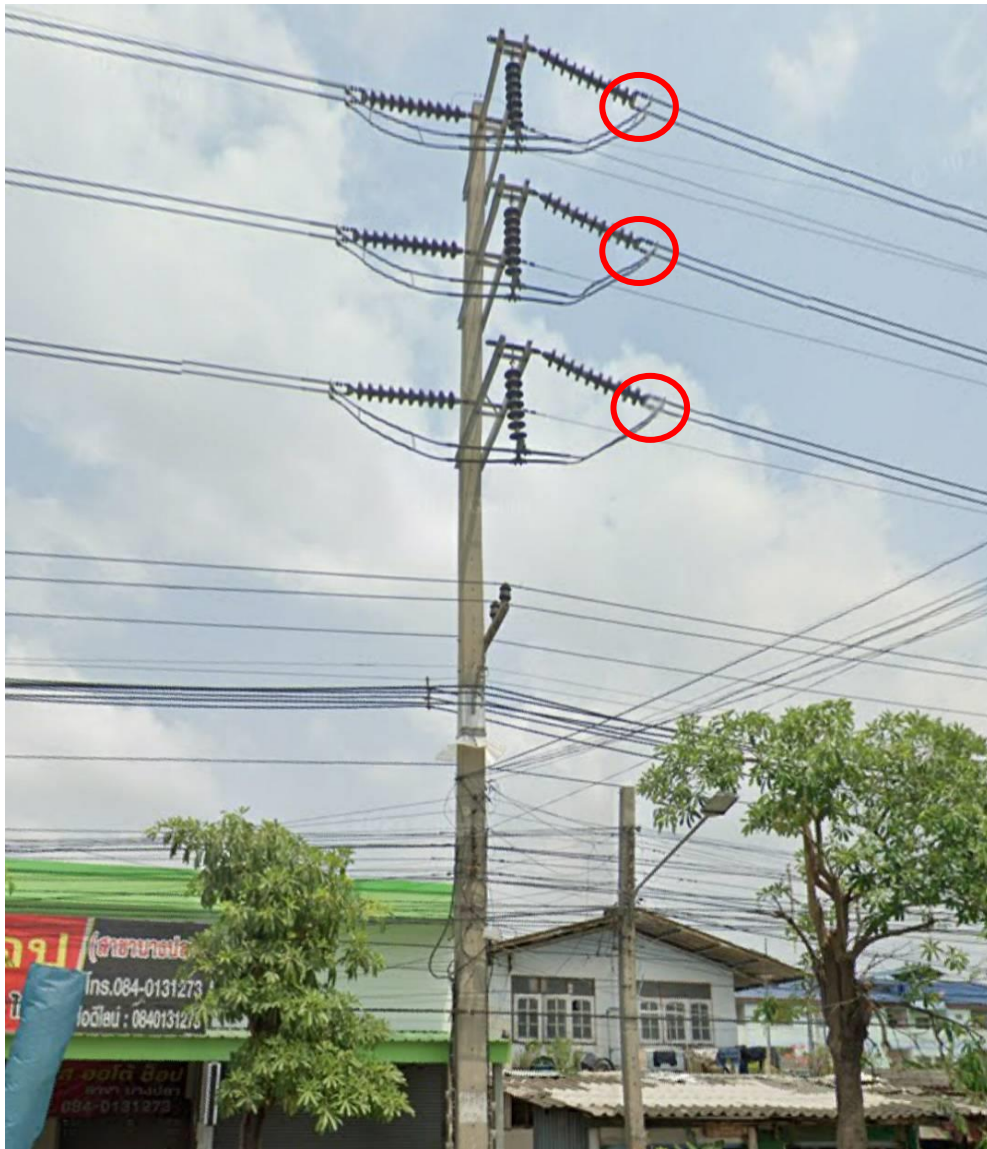



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. ถึง กบษ.(ก.3), กปบ.(ก.3)
เลขที่ กบส.(จค.) 823/2567 วันที่ 2 พ.ค. 2567
เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115 kV Underground Cable โล้นสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2, สถานีไฟฟ้าบางปลา เขต กฟภ.3

เรียน อก.บษ.(ก.3), อก.ปบ.(ก.3)

ด้วย กบส. มีแผนดำเนินการเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115 kV Underground Cable ที่เกิดการผุกร่อน และแตกหักของแฉลัมป์ไม้ จากวัสดุไม้เป็นวัสดุเรซิน ที่สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2 จำนวน 4 วงจร ต้น UG วงจร 2YB-01, 3YB-01 และที่หม้อแปลง 115 kV TP1 วงจร 1YB-01, TP2 วงจร 4YB-01 และสถานีไฟฟ้าบางปลา จำนวน 4 วงจร ที่ต้น UG วงจร 2YB-01, 3YB-01 และที่หม้อแปลง 115 kV TP1 วงจร 1YB-01, TP2 วงจร 4YB-01 (ภาพประกอบแนบท้าย) ซึ่งการชำรุดดังกล่าวหากปล่อยไว้นาน น้ำหนักของสายเคเบิลมีผลทำให้เกิดการดิ่งรั้งที่หัวเคเบิล อาจส่งผลให้หัวเคเบิลเกิดการชำรุดแบบฉับพลัน และเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ข้างเคียงได้

โดย ผจค.กบส. กำหนดแผนดับไฟเข้าดำเนินการเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115 kV Underground Cable สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2 จำนวน 4 วงจร และสถานีไฟฟ้าบางปลา จำนวน 4 วงจร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


กบส.จึงขอให้ กปบ.(ก.3) ประสานงานศูนย์จ่ายไฟ เพื่อดับไฟและย้ายโหลดวงจร สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2 และสถานีไฟฟ้าบางปลา ให้ กบส.เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ กบส. ทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายเอกพันธุ์ อตมกุลศรี)
อก.บส.

SCAN ส่ง

สภาพแคล้มป์ไม้ที่เกิดการผุกร่อน และแตกหักของแคล้มป์ไม้
สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2

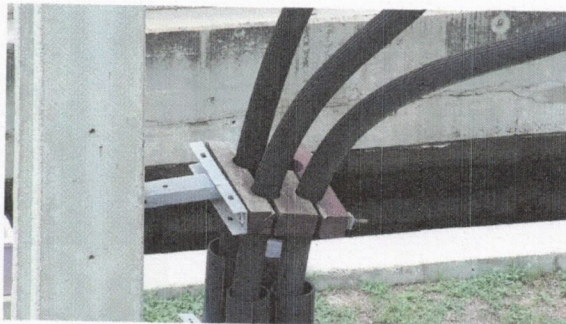

สภาพแคล้มป์ไม้ที่เกิดการผุกร่อน และแตกหักของแคล้มป์ไม้
สถานีไฟฟ้าบางปลา

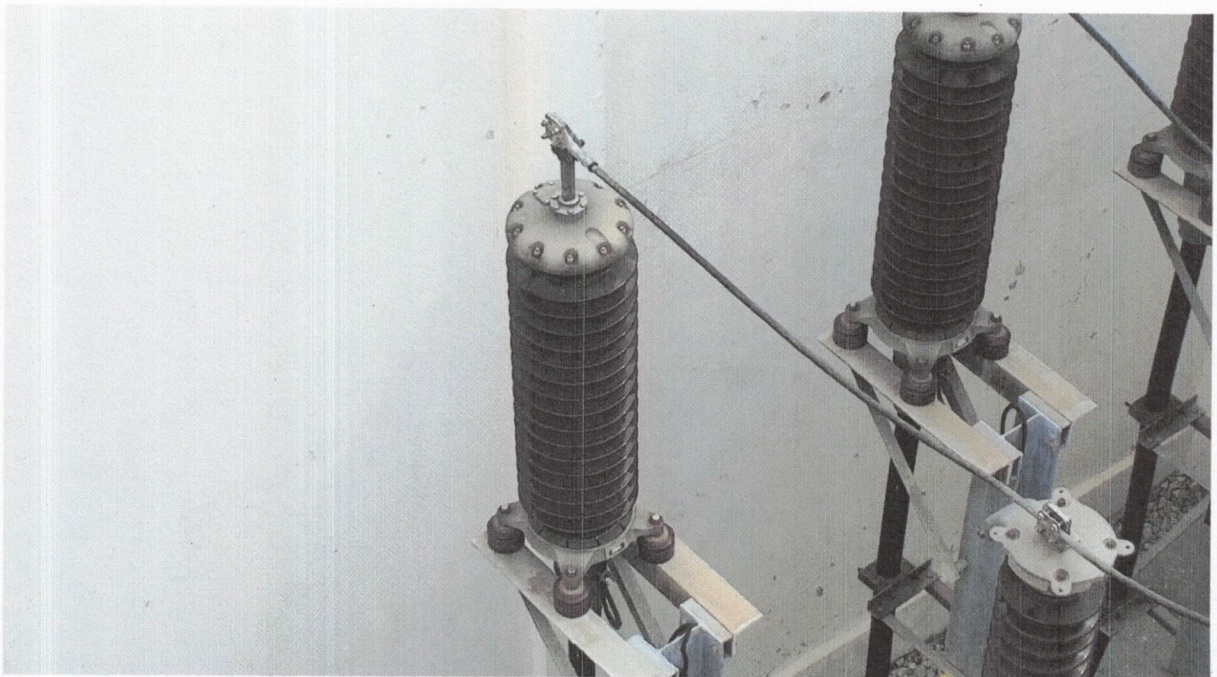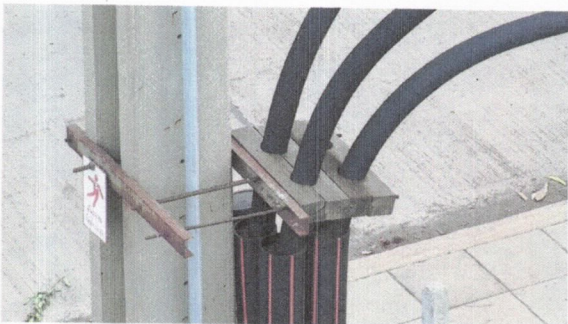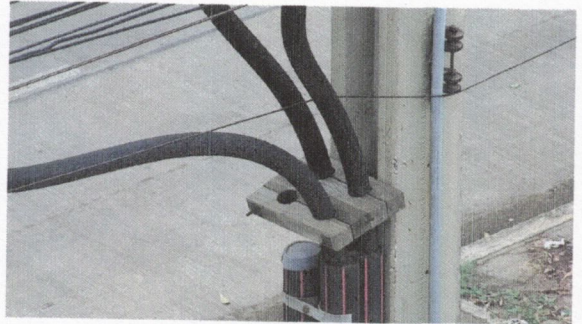

Substation Maintenance Division

Time Schedule for : เปลี่ยนแคบลัมปีดีสาย 115 KV Underground Cable ไกลสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 2 และสถานีไฟฟ้าบางปลา เขต กพท.3

Location : กพท.3

Item	Description	Day	พ.ค. 2567																															Remark			
			30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	เดินทางจากกพท. ไป สฟฟ.อ้อมน้อย 2	1																																			
2	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่ต้น UG วงจร 2YB-01 (อ้อมน้อย 2)	1																																			
3	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่ต้น UG วงจร 3YB-01 (อ้อมน้อย 2)	1																																			
4	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่หม้อแปลง 115 KV TP1 วงจร 1YB-01	1																																			
5	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่หม้อแปลง 115 KV TP2 วงจร 4YB-02	1																																			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเครื่องมือและเดินทางไป สฟฟ.บางปลา	1																																			
7	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่ต้น UG วงจร 2YB-01 (บางปลา)	1																																			
8	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่ต้น UG วงจร 3YB-01 (บางปลา)	1																																			
9	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่หม้อแปลง 115 KV TP1 วงจร 1YB-01	1																																			
10	เปลี่ยนแคบลัมปีดีสายที่หม้อแปลง 115 KV TP2 วงจร 4YB-02	1																																			
11	ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเครื่องมือและเดินทางกลับ กพท.	1																																			
รวมระยะเวลาการดำเนินการ		11																																			

ผู้ควบคุมงาน : นายอดิศักดิ์ ทองโง้ง

ผู้ปฏิบัติงาน : นายนิรุชา ลิฬังศ์, นายบวร ป่าสูงเหลี่ยม และนายคำรงค์ บุญสม

Fm-งานส-ผนค-04

แก้ไขครั้งที่ 0
