



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) 6/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

Switching Deadline

13/01/68

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลักประดู่ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| ๑. | F.๙ สถานี ด่านช้าง | ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านปลักประดู่ | R.บ้านปลักประดู่ DAA๐๙R-๐๓ | ไร่ทรัพย์ทวี DAA๐๙S-๒๔ | นายกนกพล เล็กกลับ พง.๕ ผกป. กฟส.ด่านช้าง เบอร์โทร. ๐๙๖- ๙๑๖๙๔๙๗ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน ๘๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติโนวโชค ตำแหน่ง ท.ผ.กป. โทร ๐๙๕๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๗๑๖๙๙,๙๙.๕๐๕๔๓ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๑๓,๙๙.๔๑๑๓๐

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DAA09 จาก PAA09R-03 ถึง PAA09S-24

ในวันที่ 16 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 41/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีร์ธีร์ โรมาริม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตติโนวโชค

3 ม.ค. 68

นายธีร์ธีร์ นายโรมาริม
อ.ก.๓.๕ ผกน. ๒๒.ค.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๖.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | |
|------------------------|---|---------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านปลักประดู่ ถึง ไร่ทรัพย์ทวี | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ม.ค. 68 | เวลา 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 41/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | วันที่ 3 มกราคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 มกราคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 มกราคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบ SF6 LWU02S-08 บ้านปลักประดู่ อยู่สถานะ OPEN+LOCK คาน | | | | | | |
| 3 | DAA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DAA | | |
| 4 | BOU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BOU | | |
| 5 | BOU01R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | หปร. | R | บ้านหนองขอน |
| 6 | DAA09R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | SCADA R | ปลักประดู่ |
| 7 | DAA09R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | SCADA AVR | ทุ่งแสม |
| 8 | ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU01 | | | | | | |
| 9 | BOU01S-09 | ปลด | สับ | | หปร. | SCADA SF6 | สี่แยกหนองผักแว่น |
| 10 | DAA09R-03 | สับ | ปลด | | ดช. | SCADA R | ปลักประดู่ |
| 11 | Sw.Source+load | สับ | ปลด | | ดช. | DIS | ปลักประดู่ |
| 12 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน | | | | | | |
| 13 | DAA09S-24 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | DIS | ไร่ทรัพย์ทวี |
| 14 | แจ้ง HOTLINE ปลดจุดจัมเข้า DAA09R-03 Recloser ปลักประดู่ ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 15 | เมื่อ HOTLINE ปลดจุดจัมเข้า DAA09R-03 Recloser ปลักประดู่ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 16 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 17 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 19 | เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย | | | | | | |
| 20 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 21 | DAA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DAA | | |
| 22 | BOU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BOU | | |
| 23 | BOU01R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | หปร. | R | บ้านหนองขอน |
| 24 | DAA09R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | SCADA AVR | ทุ่งแสม |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 25 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำการตัด DDE ทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ถึงจุดตัด DDE | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 26 | แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 27 | แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 28 | DAA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DAA | | |
| 29 | BOU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BOU | | |
| 30 | BOU01R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | หปร. | R | บ้านหนองซอน |
| 31 | DAA09R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดช. | SCADA AVR | ทุ่งแสม |
| 32 | แจ้ง HOTLINE เชื่อมจุดจัมเข้า DAA09R-03 Recloser ปลักประตู เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 33 | เมื่อ HOTLINE เชื่อมจุดจัมเข้า DAA09R-03 Recloser ปลักประตู เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 34 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 35 | DAA09S-24 | ปลด | สับ | | ดช. | DIS | ไร่ทรัพย์ทวี |
| 36 | ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU01 | | | | | | |
| 37 | Sw.Source+load | ปลด | สับ | | ดช. | DIS | ปลักประตู |
| 38 | DAA09R-03 | ปลด | สับ | | ดช. | SCADA R | ปลักประตู |
| 39 | BOU01S-09 | สับ | ปลด | | หปร. | SCADA SF6 | สี่แยกหนองผักแว่น |
| 40 | DAA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DAA | | |
| 41 | BOU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BOU | | |
| 42 | BOU01R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | หปร. | R | บ้านหนองซอน |
| 43 | DAA09R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | SCADA R | ปลักประตู |
| 44 | DAA09R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดช. | SCADA AVR | ทุ่งแสม |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย / สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์
บ้านปลักประดู่
ก่อนดับไฟ

วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08.00-17.00 น.

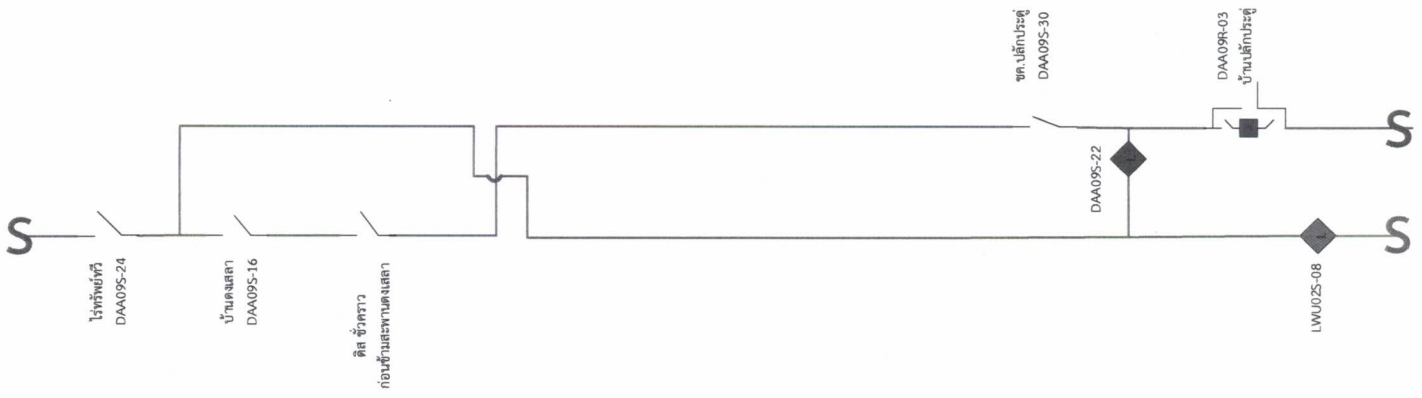

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย / สับเปลี่ยนรีโคลสเตอร์

บ้านปลักประดู่

๓๓๓๓๓

วันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 08.00-17.00 น.

หมยเหตุ รั่วฟ้าจาก
R.หมยขอบ

25๖๘

โรงหล่อหุ้ม
DAA09S-24

บ้านคองเตลา
DAA09S-16

คัส ชั่วคราว
ก่อนขึ้นสะพานคองเตลา

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเปลี่ยนสาย ACSR50 เป็น SAC50
บริเวณ DAA09S-30 ถึง คัสชั่วคราวก่อนสะพานคองเตลา

ชด. ปลักประดู่
DAA09S-30

DAA09S-22

DAA09R-03
บ้านปลักประดู่

LWU02S-08

สับเปลี่ยนรีโคลสเตอร์ และ Disconnecting Switch ด้าน Source/Load โดยตรงตามภาพด้านข้าง
สับเปลี่ยน Disconnecting Switch ด้าน Bypass และปลดสายลิฟท์โคลสเตอร์ โดยชุดของไม่กระช้ำ

