



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บป) ๒ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณเชล
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ออ.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณสะพานวัดมอญ ถึง สะพานหลักสอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงบริเวณสะพานวัด มอญ ถึง ปากคลองโรงสี อัญมณีผล	- BNP๔S-๐๕ (หน้าวัดมอญ)	- BNP๔S-๐๗ (ธุรกิจกิมลี)	นายไพโรวัลย์ พัดเกร็ด ตำแหน่ง พชง.๖ โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๗๘๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสะพานวัดมอญ สะพานหลักสอง อนาคต.หลักสอง ปากคลองตาข่า ริมคลองดำเนินสะดวก.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๐๑๐๙๒ Long ๑๐๐.๑๒๙๔๖๖
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๒๒๗๐๘ Long ๑๐๐.๑๗๐๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิช จันขันตี)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNPA จาก BNPA S-05 ถึง BNPA S-07
ในวันที่ 12 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 40/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภสวัสดิ์ เขียวพูน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์

(นายสุภสวัสดิ์ เขียวพูน)
๖๑ก.๕ โทร.๓๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สค.๒ (บพว)

ออ.บช.(ก.๓), ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจก. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.บป.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานวัดมอญ - ปากคลองโรงสีชัยภูมิผล (BNP04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สก2.(บพว.)	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 40/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	3 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	3 มกราคม 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	3 มกราคม 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.	R	ริมคลองดำเนิน
3	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	BNP04S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.	SF6	หน้าวัดมอญ
6	BNP04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.	SF6	ธุรกิจกัมลี้
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.	R	ริมคลองดำเนิน
12	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	ตรวจสอบ DDE วงจร BNP04 บริเวณตู้ตู้แม่เจริญ ดำเนินการเชื่อมต่อ เรียบร้อย						
16	ตรวจสอบ D/F ชั่วคราว วงจร BNP04 บริเวณกิ่งไฟศาลาศิลป์คำไม้ ดำเนินการรื้อถอน พร้อมปลด DDE เรียบร้อย						
17	ตรวจสอบ DDE ชั่วคราว วงจร BNP04 บริเวณโรงสีชัยภูมิผล ดำเนินการปลดออก เรียบร้อย						
18	ตรวจสอบไลน์แยกวัดหลักสอง วงจร BNP04 ย้ายแนวเชื่อมต่อเข้าก่อน DDE วงจร BNP04 บริเวณกิ่งไฟศาลาศิลป์คำไม้ เรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.	R	ริมคลองดำเนิน
23	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	BNP04S-05	ปลด	สับ		บพว.	SF6	หน้าวัดมอญ
26	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.	SF6	ธุรกิจกัมลี้
27	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.	R	ริมคลองดำเนิน
28	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผัง Single Line Diagram ก่อนปฏิบัติงาน

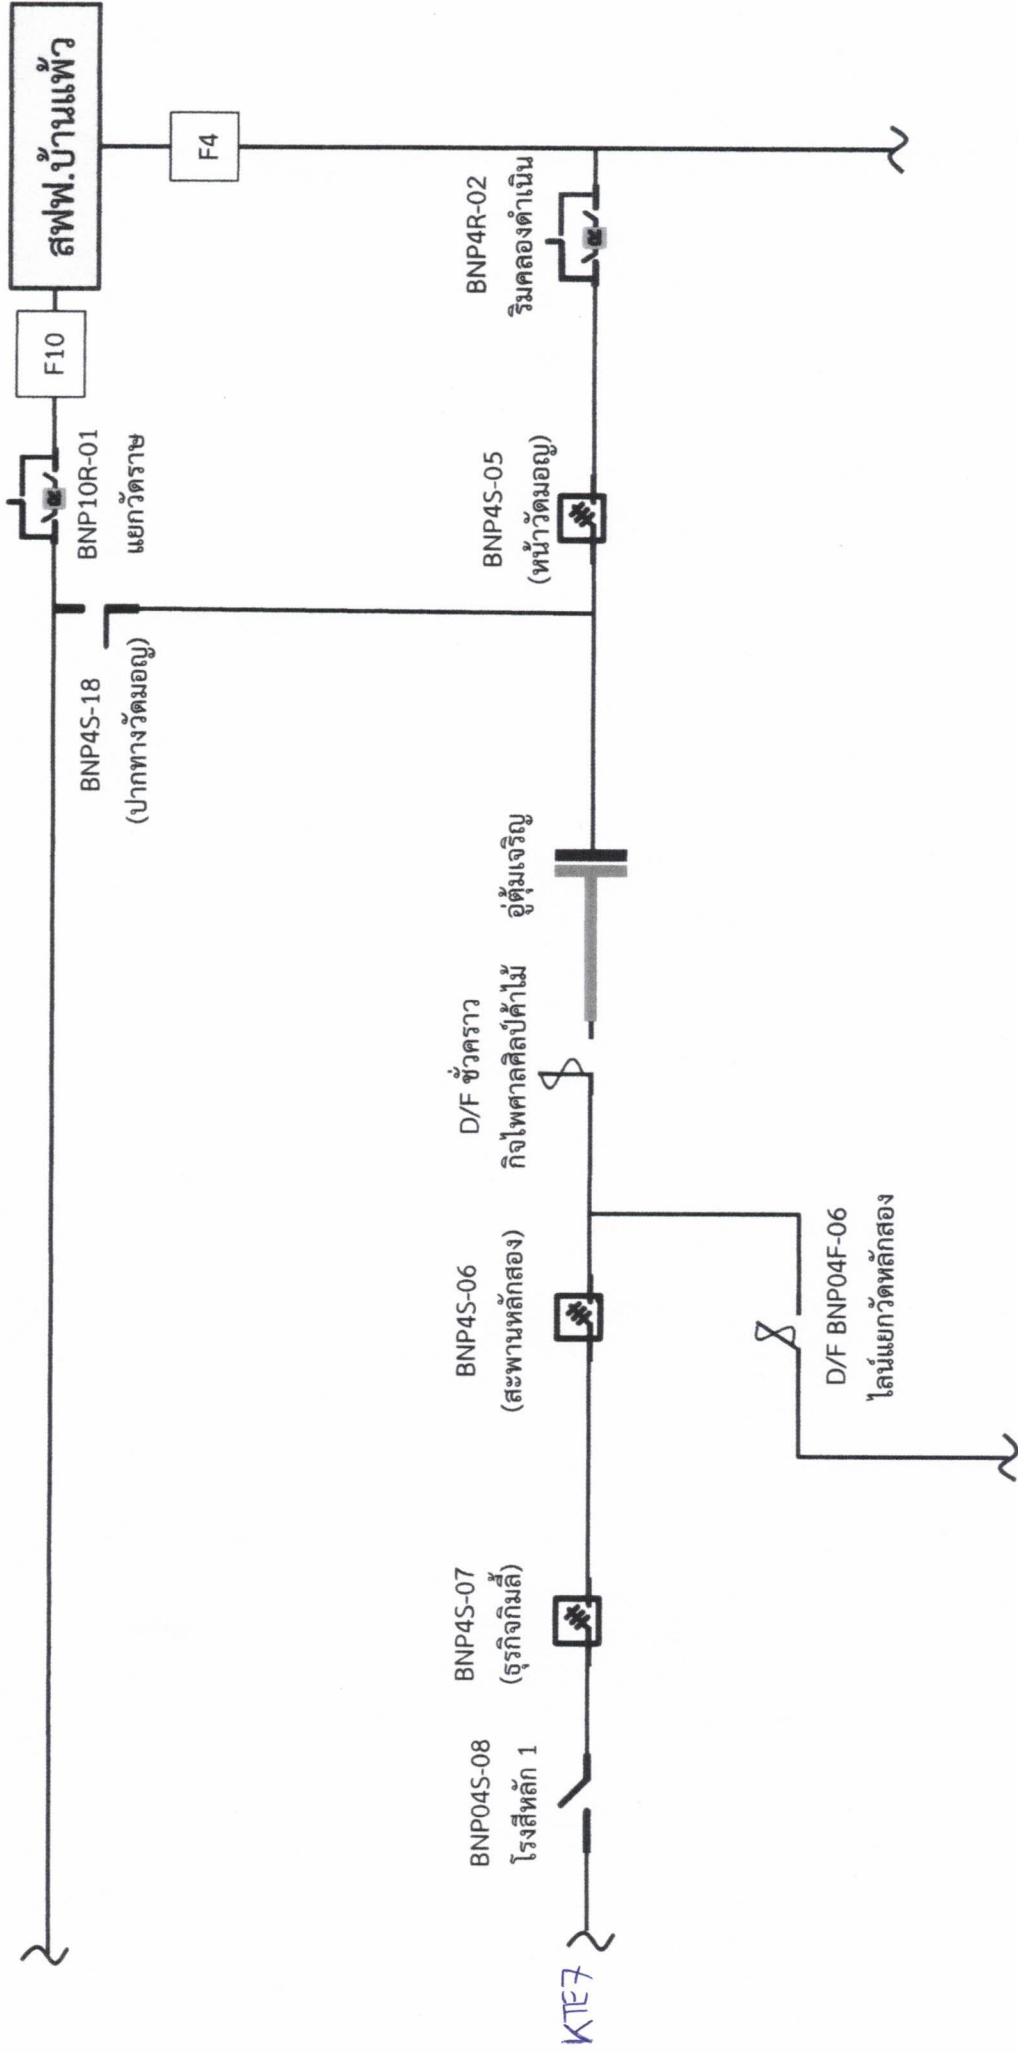

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

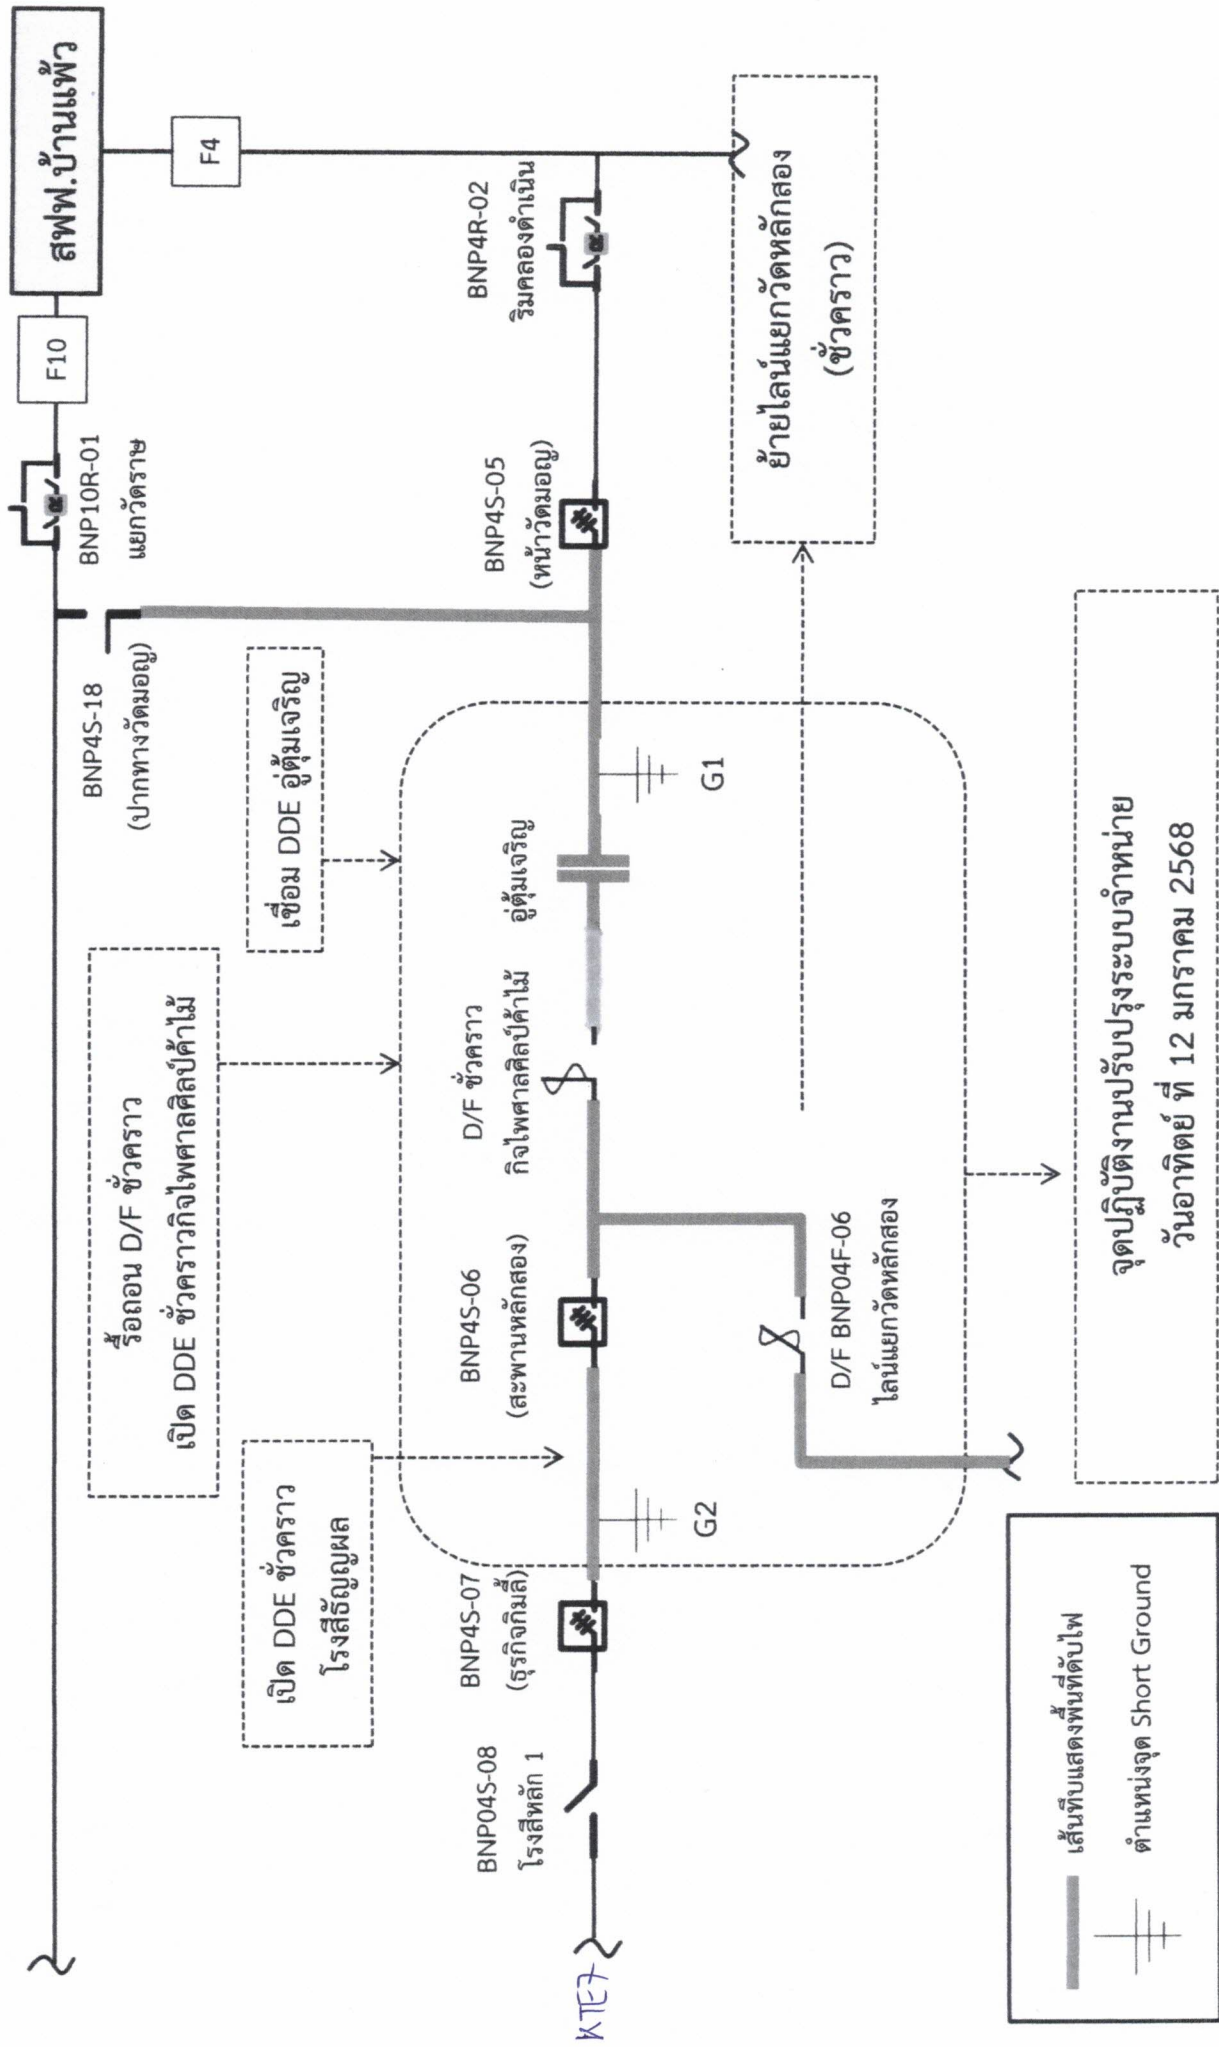

จุดปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2568

แผนผัง Single Line Diagram หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

