



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 002/2568
ชื่อผู้รับ นายพิชญนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายพุดมรงค์ กาหลง

Switching Deadline

4 ม.ค. 68

วันที่ - 2 ม.ค. 2568
ตำแหน่ง อค.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2 XCA06	6 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT	DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ช 085-5583046
๒	XCA2 XCA06	7 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT	DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ช 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 3 เครื่อง 400 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 900 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.921 393, 100.125 478
3.2 สิ้นสุด 14.922 727, 100.132 771

(นายพุดมรงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อค.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA6 จาก DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT ถึง DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก
ในวันที่ 6 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 44/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ XCA6 จาก DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT ถึง DIS ชั่วคราว หน้าตู้เอนก
ในวันที่ 7 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกทกภว

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.สามชุก

(นายสุภกรสิทธิ์ เทียมผจญ)
๒๐๒.๕ แทน ผคฟ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๕

.....อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อค.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชค.หน้าอุเอนก - DIS ชค.สายส่ง EGAT				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6,7 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายติดตั้งอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	44/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายมนเฑ ทอญ้อย	วันที่		3 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่		3 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่		3 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายจิรวัดณ์,นายวิฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
4	ย้ายโหลด XCA06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA01						
5	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านดอนมดดำ
6	DIS ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สายส่ง EGAT
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS หน้าอุเอนก
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
14	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DIS ชค. XCA06	ปลด	สับ		สช.		DIS หน้าอุเอนก
23	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ม.ค.68							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	งานวันที่ 7 ม.ค. 68						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
26	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
27	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
28	DIS ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้โพลบัสเตอร์)		สช.		DIS หน้าอูเอนก
29	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
33	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
39	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	DIS ชค. XCA06	ปลด	สับ		สช.		DIS หน้าอูเอนก
42	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

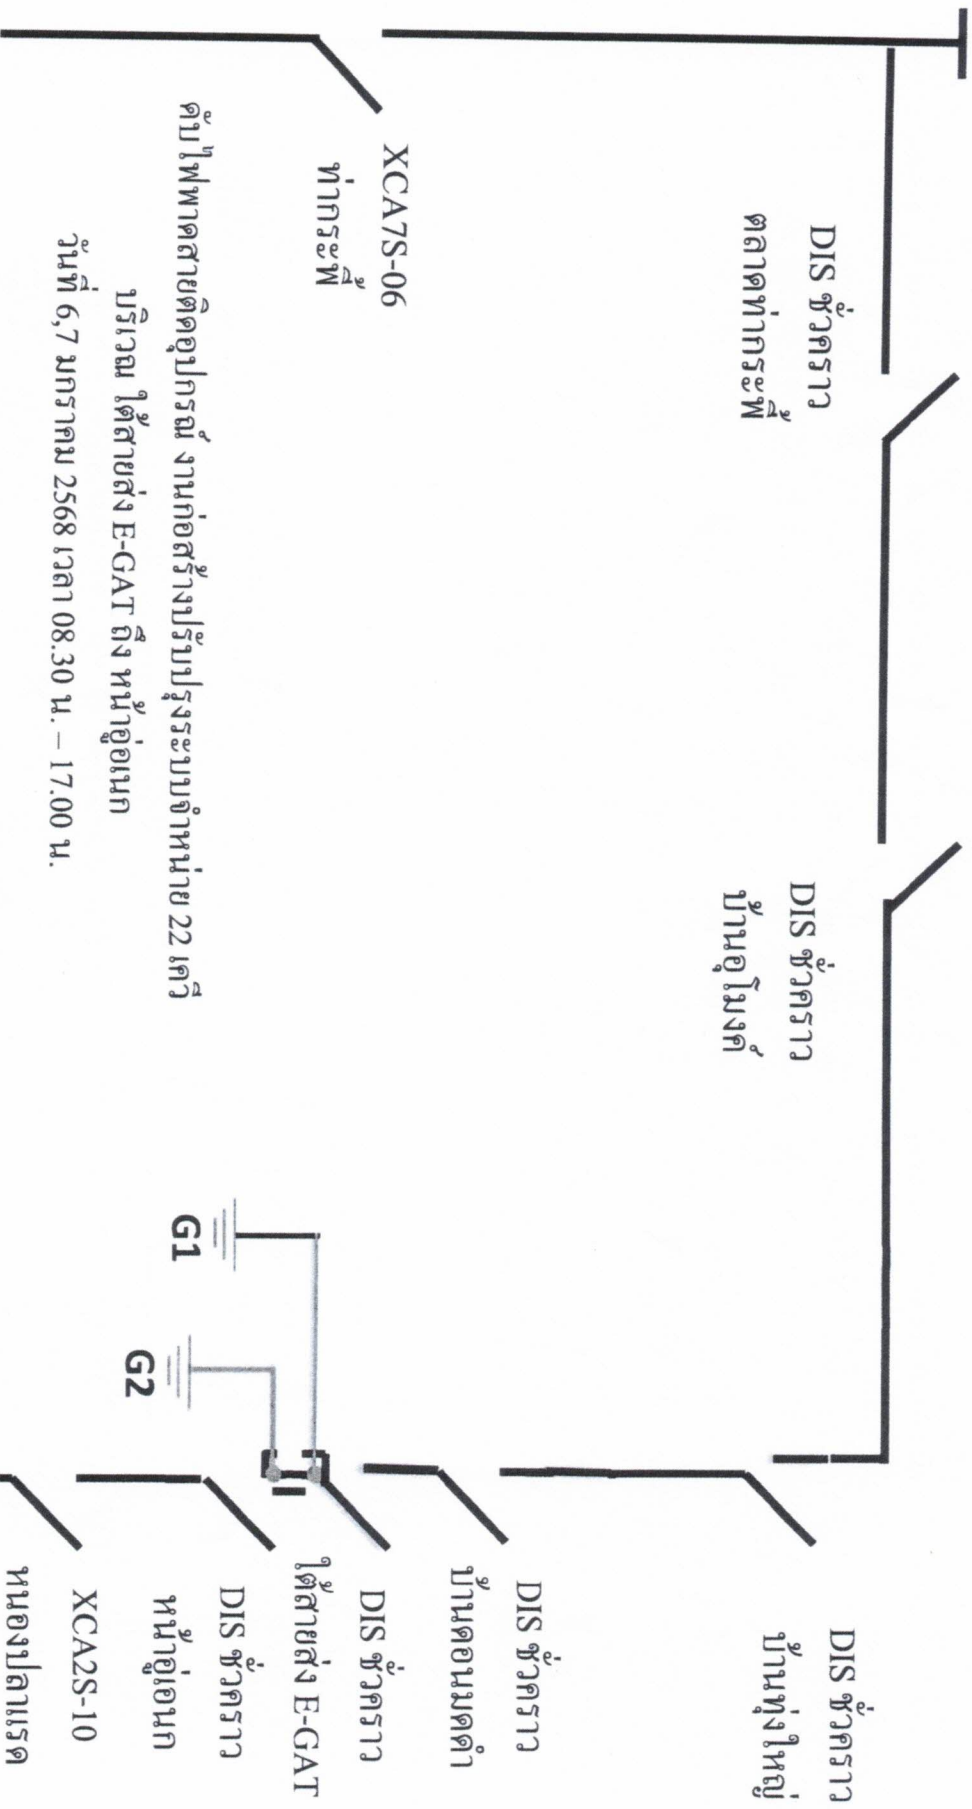

ดับไฟฟ้าตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณ ใต้สายส่ง E-GAT ถึง หน้าอุเออนก

วันที่ 6,7 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ขอตัดการวัดจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พงจ.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ขอตัดการวัดจุด G2
 นาย ปิณตัท เทพบุตร พงจ.5 ผกป.กฟส.สามชุก
