



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๕๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พทุมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า...หลวงวา.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน๒.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|---|---|-------------------------------------|
| ๑. | SLY04 | ๑๙ ม.ค. ๖๘ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | แผนกก่อสร้างระบบสาย ส่ง ๑๑๕KV. กกค.ก.๓ ปฏิบัติงานก่อสร้างฐาน ราก ชนิด F๔ ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณตั้งแต่ ร้าน ก้วยเดี่ยวหมุดจนถึง ตรง ข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์ | - ดิส UG SLY 04S- 09 | - SF6 SLY04S-03 | นายวีรพัฒน์ นาคละมัย ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑ |
| ๒. | SLY10 | ๑๙ ม.ค. ๖๘ | ๐๘.๓๐ | ๑๖.๓๐ | | - ดิสชั่วคราว ตรง ข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์ | - ดิสชั่วคราวหน้า ร้านก้วยเดี่ยวหมุด | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวนอนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ ทางควนมอเตอร์เวย์ ถึง แยกไฟแดงห้วยพลู.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๒๔๔๗ Long ๑๐๐.๒๙๓๑๑๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๖๖๗๒๔ Long ๑๐๐.๒๙๕๓๙๔

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.พทุมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(๐๘ ๐๘๐๓๐๓๐๓๐๓)

(ปี๒๕๖๓) ๘๖๔๕-๐๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พัดเตอร์ ๘๖๐๔ จาก ๘๖๔๕-๐๕ ถึง
ในวันที่ ๑๘.๑๑.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐.๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 100/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พัดเตอร์ ๘๖๑๐ จาก มร.อ.ไพฑูริย์ ๘๖๑๐ ถึง
ในวันที่ ๑๙.๑๑.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไช้ชมวิมล ประสานงานการขอดับไฟกับ อ.อ.กมลทิพย์ นันทประจักษ์
11 ม.ค. 68

สุกษา

(ทงสาวรสกิบง วอติญ/อภ)

๑๗๓.๕๑๓๓ นพ-๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. ๘๖๑๒-๐๘๐๓๐๓

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวหมุดต้น - ตรงข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 ม.ค. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทท. | งานที่ทำ | ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 100/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 14 มกราคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 14 มกราคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 14 มกราคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. พีรภัทร, สุภัสชา, ชุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิด 2. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช 3. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SLY-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SLY | | TP1 - |
| 3 | SLY-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SLY | | TP2 - |
| 4 | SLY04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 5 | SLY08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 6 | SLY09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 7 | SLY10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 8 | BEU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BEU | | TP1 - |
| 9 | - ย้ายโหลด SLY04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SLY08 | | | | | | |
| 10 | SLY04S-05 | ปลด | สับ | | พทท. | SCADA | SF6 คลอง ช.บ.น |
| 11 | SLY04S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | พทท. | SCADA | SF6 วัดมะเกลือ |
| 12 | - ย้ายโหลด SLY10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก BEU03 | | | | | | |
| 13 | BEU03S-05 | ปลด | สับ | | พทท. | SCADA | SF6 ช่างร้านเลม่อนมี |
| 14 | BEU02VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | BEU | | CB - |
| 15 | DIS ชค. SLY10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | พทท. | | DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวหมุดต้น |
| 16 | BEU02VB-01 | สับ | ปลด | | BEU | | CB - |
| 17 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 18 | DIS ชค. SLY10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | พทท. | | DIS ตรงข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์ |
| 19 | SLY04S-09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | พทท. | | DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง) |
| 20 | SLY04S-08 | สับ | ปลด | | พทท. | | DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง) |
| 21 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 22 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 23 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 24 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 25 | SLY-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SLY | | TP1 - |
| 26 | SLY-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SLY | | TP2 - |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 27 | SLY04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 28 | SLY08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 29 | SLY09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 30 | SLY10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 31 | BEU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BEU | | TP1 - |
| 32 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 33 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 34 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 35 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 36 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 37 | SLY-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SLY | | TP1 - |
| 38 | SLY-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SLY | | TP2 - |
| 39 | SLY04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 40 | SLY08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 41 | SLY09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 42 | SLY10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 43 | BEU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BEU | | TP1 - |
| 44 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 45 | DIS ชค. SLY10 | ปลด | สับ | | พทช. | | DIS ตรงข้ามพรชัยฮาร์ดแวร์ |
| 46 | SLY04S-08 | ปลด | สับ | | พทช. | | DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง) |
| 47 | SLY04S-09 | ปลด | สับ | | พทช. | | DIS UG มอเตอร์เวย์ (ล่าง) |
| 48 | - ย้ายโหลด SLY04 บางส่วน กลับจาก SLY08 | | | | | | |
| 49 | SLY04S-03 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | พทช. | SCADA | SF6 วัดมะเกลือ |
| 50 | SLY04S-05 | สับ | ปลด | | พทช. | SCADA | SF6 คลอง ช.บน |
| 51 | - ย้ายโหลด SLY10 บางส่วน กลับจาก BEU03 | | | | | | |
| 52 | BEU02VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | BEU | | CB - |
| 53 | DIS ชค. SLY10 | ปลด | สับ | | พทช. | | DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น |
| 54 | BEU02VB-01 | สับ | ปลด | | BEU | | CB - |
| 55 | BEU03S-05 | สับ | ปลด | | พทช. | SCADA | SF6 ข้างร้านเลม่อนมี |
| 56 | SLY-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SLY | | TP1 - |
| 57 | SLY-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SLY | | TP2 - |
| 58 | SLY04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 59 | SLY08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 60 | SLY09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |
| 61 | SLY10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SLY | | CB - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------|
| 62 | BEU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BEU | | TP1 - |
| <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> | | | | | | | |

แผนผังขอค้ำไป บริเวณ แยกไปแดงทะเล ถึง ทางคำนวณมอเตอร์เวย์บางใหญ่

วัน อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

พื้นที่ปฏิบัติงาน

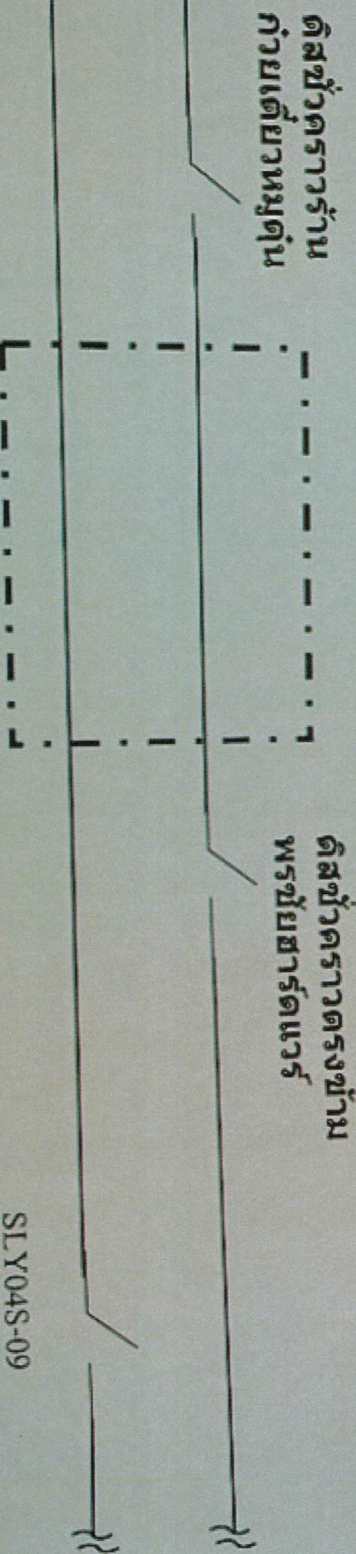

4S-03
แปล



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมณฑล
เลขที่รับ..... 134
วันที่..... - 7 มี.ค. 2568
เวลา..... 14 : 27น.

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล
เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรพ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ชนิด F๔ จำนวน ๒ ฐาน

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ในวันที่..... ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘..... ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่บ้านปรินดา ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายไพรัช ทุมวาทนะ)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พทุมณฑล

| | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท) | <input type="checkbox"/> ทผ.สน. |
| <input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล) | <input type="checkbox"/> ทผ.บร. |
| <input type="checkbox"/> นทน.8/9 | <input type="checkbox"/> ทผ.บส. |
| <input type="checkbox"/> นบท.8/9 | <input type="checkbox"/> ทผ.มต. |
| <input type="checkbox"/> วศก.8/9 | <input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปป. |
| <input type="checkbox"/> วศก. | <input type="checkbox"/> ทผ.กส. |
| <input type="checkbox"/> จป.ว. | |
| <input type="checkbox"/> กรรมการฯ | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | |

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

| | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ | <input type="checkbox"/> รายงาน |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป | |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ | |
| ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | |
