



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 กค 64

เลขที่ ก.๓.สช.(กป.) ๕๕๖ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาทหลง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สวามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ ๓  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ   | จาก   | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|--|----------------------------------|
| ๑.  | DBA๐๓    | ๓๑ ก.ค. ๖๔   | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | ดับไฟปรับปรุงเปลี่ยนสาย<br>แรงสูง บริเวณ สีแยกไฟแดง<br>สามชุกถึง Disชั่วคราว รร.<br>สามชุกรัตน | บริเวณ สี<br>แยกไฟแดง<br>สามชุก<br>DOE.กิตย<br>H.ทพ.ปณ) | Disชั่วคราว<br>รร.สามชุกรัตน<br>Dis.ชั่วคราว<br>อ.ก.บ.บ. | นายนรินทร์ คำภีภา<br>๐๙๒-๒๕๘๕๖๐๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๔ เครื่อง ๔๒๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๕๔ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไทจิตต์ ตำแหน่ง ผ.ก.บ โทร ๐๘๙-๒๑๘๔๔๕๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายพุดชงค์ กาทหลง)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA03 จาก DOE สีแยกไฟแดง ถึง Dis.ชั่วคราว รร.สามชุกรัตน  
ในวันที่ 31 กค 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1001/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนทรักษ์ วรณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.กค.๓ ไทย อ.ท.ร.เพื่อ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส. ๕๖, กฟส. ๑๒๐, กฟส. ๑๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*(Signature)*  
นายนรินทร์ คำภีภา  
อ.ก.บ.บ.ว.อ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                          |                           |                           |    |
|------------------------|---|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ไลน์ DBA03บริเวณ DDE.แยกไฟแดงสามชุก ถึง DIS.ชค.ร.ร.สามชุกรัตน,DIS.ชค.วัดวิมล      |          |                          |                           |                           |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 31 ก.ค. 64  | ระหว่าง  | 08.30 น.                 | ถึง                       | 16.30                     | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.สช.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง |                           | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1001/64 |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์   |          |                          | วันที่                    | 30 กรกฎาคม 2564           |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                          | วันที่                    | 30 กรกฎาคม 2564           |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                          | วันที่                    | 30 กรกฎาคม 2564           |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช   |          |                          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |                           |    |
|                        | 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร  |          |                          | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |                           |    |
|                        | 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต                                       |          |                          | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                           |    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ          |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง |                                      |                      |      |              |            |                   |
| 2   | DBN-KT2A//3A                                    | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            |                   |
| 3   | DBA03VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DBA          |            |                   |
| 4   | DBA04VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DBA          |            |                   |
| 5   | DBA03R-02                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | รถสช-        | RE         | บ้านลาดสิงห์      |
| 6   | SPC-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPC          |            |                   |
| 7   | SPC01VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPC          |            |                   |
| 8   | SPC03VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPC          |            |                   |
| 9   | SPC01R-01                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | รถสปจ-       | RE         | ดงชี้เหล็ก        |
| 10  | DOA-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DOA          |            |                   |
| 11  | DOA01VB-01                                      | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DOA          |            |                   |
| 12  | DOA03R-01                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | รถดจ-        | RE         | สะพานดำ           |
| 13  | - ย้ายโหลด DBA03 ไปจ่ายจาก SPC01                |                                      |                      |      |              |            |                   |
| 14  | DBA03S-11                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถสช-        | SF6        | วังหว่า           |
| 15  | DBA03S-10                                       | สับ                                  | ปลด,ล๊อคคาน          |      | รถสช-        | SF6        | จ.ไทยพาณิชย์      |
| 16  | - ย้ายโหลด DBA03 ไปจ่ายจาก DBA04                |                                      |                      |      |              |            |                   |
| 17  | DBA03S-09                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถสช-        | SF6        | บ้านยายอวน        |
| 18  | DIS ชั่วคราว DBA03                              | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | รถสช-        | DIS        | วัดวิมล           |
| 19  | - ย้ายโหลด DBA03 ไปจ่ายจาก DOA03                |                                      |                      |      |              |            |                   |
| 20  | DOA03S-03                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถสปจ-       | SF6        | สะพานตาแล         |
| 21  | DOA03S-02                                       | สับ                                  | ปลด                  |      | รถดจ-        | SF6        | ก่อนสนง.ไฟฟ้าดอนฯ |
| 22  | DBA03S-14                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถสช-        | SF6        | บ้านลาดสิงห์      |
| 23  | DBA03S-07                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถสปจ-       | SF6        | สะพานจองชัย       |
| 24  | DIS ชั่วคราว DBA03                              | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | รถสช-        | DIS        | ร.ร.สามชุกรัตน    |
| 25  | DBA03S-07                                       | สับ                                  | ปลด                  |      | รถสปจ-       | SF6        | สะพานจองชัย       |
| 26  | DOA03S-02                                       | ปลด                                  | สับ                  |      | รถดจ-        | SF6        | ก่อนสนง.ไฟฟ้าดอนฯ |
| 27  | DOA03S-03                                       | สับ                                  | ปลด                  |      | รถสปจ-       | SF6        | สะพานตาแล         |
| 28  | - ดับไฟ DBA03 เวลา 08.30 น.                     |                                      |                      |      |              |            |                   |




| ที่   | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                             |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|-----------------------------|
| 29  | DBA03S-08   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | รถสข-        |            | SF6      | ร้านเทเลวิซ                 |
| 30  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลดโหลดให้ HL กระเช้าสุพรรณฯ ก่อนทำการปลดจุดจัมออก                                       |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 31  | แจ้ง HL กระเช้าสุพรรณฯ ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า SF6 รหัส DBA03S-08 บริเวณสามแยกไฟแดงสามชุกออกทั้งสามเฟส    |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 32  | หลังจาก HL กระเช้าสุพรรณฯ ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า SF6 รหัส DBA03S-08 บริเวณสามแยกไฟแดงสามชุกออกทั้งสามเฟส |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 33  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรีบทราบ  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 34  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 35  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Short Ground จุด G1   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 36  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Short Ground จุด G2   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 37  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Short Ground จุด G3   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 38  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Short Ground จุด G4   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 39  | แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้ทุกชุด   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 40  | DBN-KT2A//3A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ศูนย์นนา     |            |          |                             |
| 41  | DBA03VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | DBA          |            |          |                             |
| 42  | DBA04VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | DBA          |            |          |                             |
| 43  | DBA03R-02   | Nonreclosing                         | Normal             |      | รถสข-        |            | RE       | บ้านลาดสิงห์*ตั้ง Alter ไว้ |
| 44  | SPC-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SPC          |            |          |                             |
| 45  | SPC01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SPC          |            |          |                             |
| 46  | SPC03VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SPC          |            |          |                             |
| 47  | SPC01R-01   | Nonreclosing                         | Normal             |      | รถสปจ-       |            | RE       | ดงขี้เหล็ก*ตั้ง Alter ไว้   |
| 48  | DOA-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | DOA          |            |          |                             |
| 49  | DOA01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | DOA          |            |          |                             |
| 50  | DOA03R-01   | Nonreclosing                         | Normal             |      | รถดจ-        |            | RE       | สะพานดำ*ตั้ง Alter ไว้      |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% |   |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 51  | หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 52  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 53  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 54  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 55  | แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 56  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์  |                                      |                    |      |              |            |          |                             |
| 57  | DBN-KT2A//3A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | ศูนย์นนา     |            |          |                             |
| 58  | DBA03VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                             |
| 59  | DBA04VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                             |
| 60  | DBA03R-02   | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | รถสข-        |            | RE       | บ้านลาดสิงห์                |
| 61  | SPC-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SPC          |            |          |                             |
| 62  | SPC01VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                             |
| 63  | SPC03VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                             |
| 64  | SPC01R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | รถสปจ-       |            | RE       | ดงขี้เหล็ก                  |
| 65  | DOA-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | DOA          |            |          |                             |
| 66  | DOA01VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                             |



| ที่                                     | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 67                                      | DOA03R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | รตดจ-        |            | RE       | สะพานดำ           |
| 68                                      | - จ่ายไฟ DBA03  |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 69                                      | แจ้ง HL กระเช้าสุพรรณฯทำการจุ่มจุดจุ่มช่วงดึงเข้าSF6รหัส DBA03S-08 บริเวณสามแยกไฟแดงสามชุกเข้าทั้งสามเฟส    |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 70                                      | หลังจาก HL กระเช้าสุพรรณฯทำการจุ่มจุดจุ่มช่วงดึงเข้าSF6รหัส DBA03S-08 บริเวณสามแยกไฟแดงสามชุกเข้าทั้งสามเฟส |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 71                                      | DBA03S-08   | ปลด                                  | สับ               |      | รตสช-        |            | SF6      | ร้านเทเลวิซ       |
| 72                                      | - ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก SPC01   |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 73                                      | DBA03S-10   | ปลด                                  | สับ               |      | รตสช-        |            | SF6      | จ.ไทยพาณิชย์      |
| 74                                      | DBA03S-11   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน      |      | รตสช-        |            | SF6      | วังหว่า           |
| 75                                      | - ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DBA04   |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 76                                      | DIS ชั่วคราว DBA03  | ปลด                                  | สับ               |      | รตสช-        |            | DIS      | วัดวิมล           |
| 77                                      | DBA03S-09   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน      |      | รตสช-        |            | SF6      | บ้านยายอวน        |
| 78                                      | - ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DOA03   |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 79                                      | DOA03S-03   | ปลด                                  | สับ               |      | รตคปจ-       | SCADA      | SF6      | สะพานตาแล         |
| 80                                      | DOA03S-02   | สับ                                  | ปลด               |      | รตดจ-        |            | SF6      | ก่อนสนง.ไฟฟ้าดอนฯ |
| 81                                      | DBA03S-07   | ปลด                                  | สับ               |      | รตคปจ-       | SCADA      | SF6      | สะพานจองชัย       |
| 82                                      | DIS ชั่วคราว DBA03  | ปลด                                  | สับ               |      | รตสช-        |            | DIS      | ร.ร.สามชุกรัตน    |
| 83                                      | DBA03S-07   | สับ                                  | ปลด               |      | รตคปจ-       | SCADA      | SF6      | สะพานจองชัย       |
| 84                                      | DBA03S-14   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน      |      | รตสช-        |            | SF6      | บ้านลาดสิงห์      |
| 85                                      | DOA03S-02   | ปลด                                  | สับ               |      | รตดจ-        |            | SF6      | ก่อนสนง.ไฟฟ้าดอนฯ |
| 86                                      | DOA03S-03   | สับ                                  | ปลด               |      | รตคปจ-       | SCADA      | SF6      | สะพานตาแล         |
| 87                                      | DBN-KT2A//3A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | ศูนย์นนฯ     |            |          |                   |
| 88                                      | DBA03VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                   |
| 89                                      | DBA04VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                   |
| 90                                      | DBA03R-02   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | รตสช-        |            | RE       | บ้านลาดสิงห์      |
| 91                                      | SPC-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | SPC          |            |          |                   |
| 92                                      | SPC01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                   |
| 93                                      | SPC03VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                   |
| 94                                      | SPC01R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | รตคปจ-       |            | RE       | ดงขี้เหล็ก        |
| 95                                      | DOA-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | DOA          |            |          |                   |
| 96                                      | DOA01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                   |
| 97                                      | DOA03R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | รตดจ-        |            | RE       | สะพานดำ           |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% |   |                                      |                   |      |              |            |          |                   |



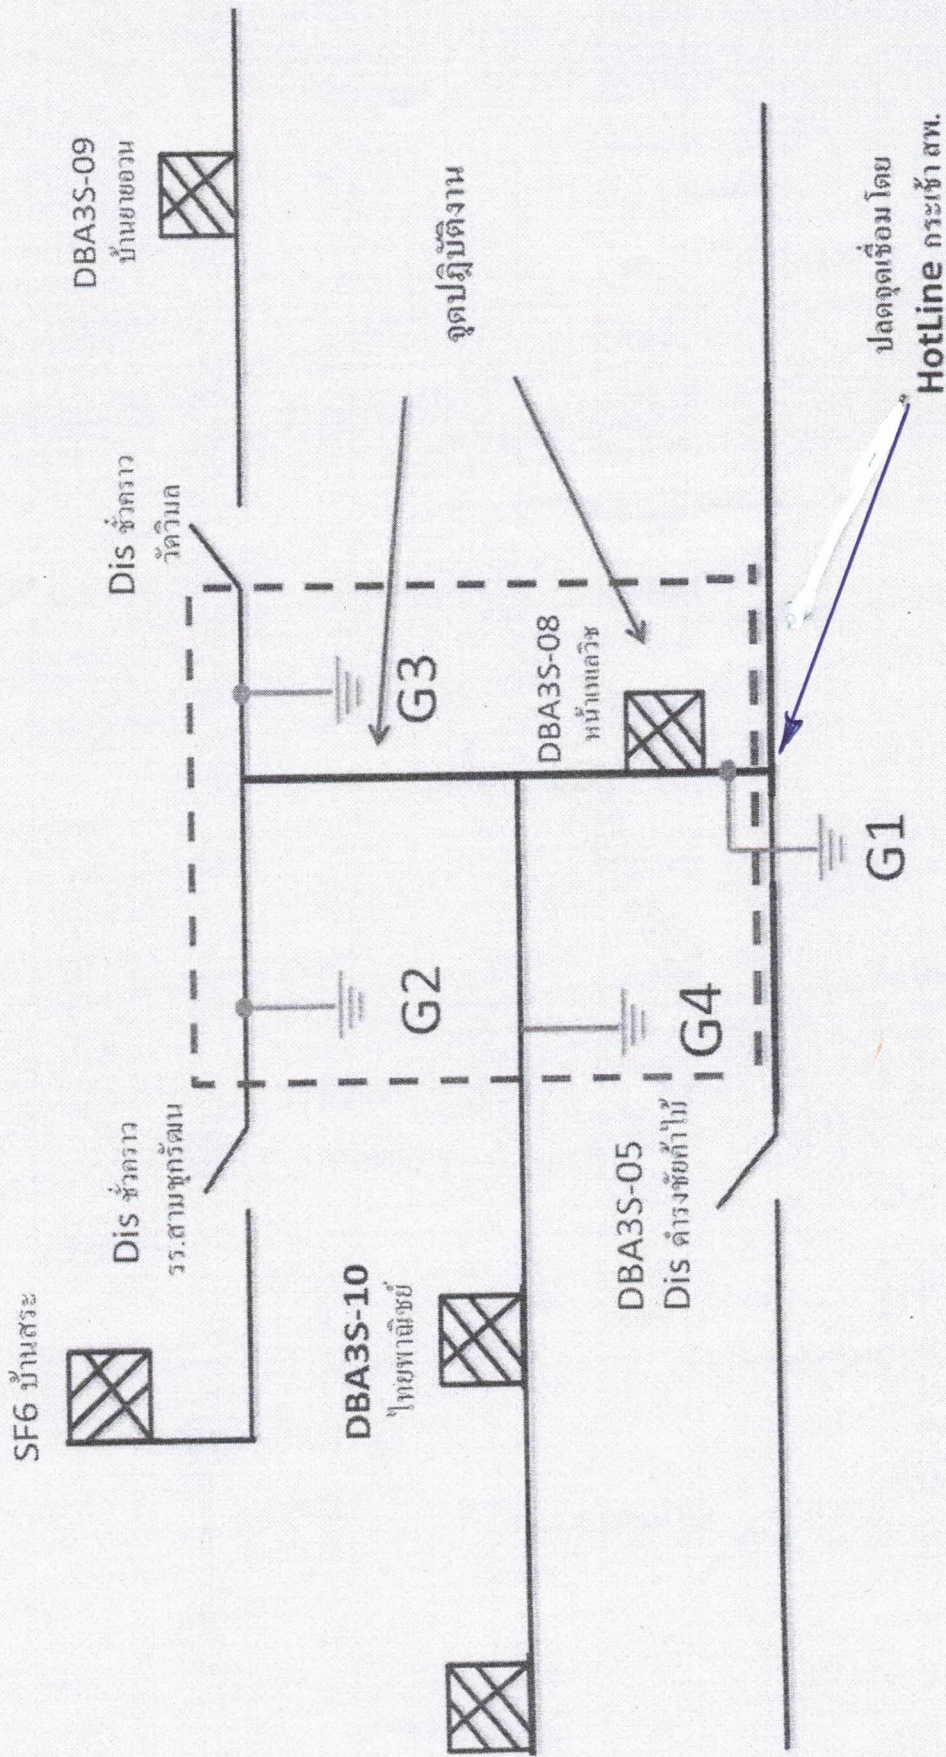

**G1, G4** จุดช็อคกาวด์ โดยชุดแม่ไฟ นาย วาณิช ไพจิตต์ ควบคุมงาน  
**G2, G3** จุดช็อคกาวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร ควบคุมงาน
