



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 32/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณพิศล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 9 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณแยกนางบวช-สพฟ.ดบ.	DBA1S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	นายอานวย กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
	DBA 05	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาชั้น	
	DBA 06	26 ม.ค. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	DBA6S-03 หน้าขนส่งเดิมบางนางบวช	
2.	DBA 01	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง DBA5S-02แยกนางบวช	
	DBA 06	2 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพฟ.ดบ.	DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ป.น.....โทร. 080-847-6904.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.810169... Long: ...100.118359.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.831561... Long: ... 100.113688.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DBA1,5,6 จาก DBA1,5,6S-C1 ถึง DBA1S-16, DBA5S-02 DSธด.ทมิ/เขต
ในวันที่ 2 ก.พ. 6๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 102/2568 DBA6S-02 กว.น๖๖.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย. พนิต ราชครูนิชม ประธานงานการขอดับไฟกับ มยรรวิทย์ ศรีสัตกต.

(นาย สุรศักดิ์ โทธิ์พันธุ์)
วศก.5 11 กน นพ.๑พ,

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.จน, นพ.ศบ.


อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1. แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA.)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกนางบวช-หน้า สฟฟ.เดิมบางฯ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	2 ก.พ. 68	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 102/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	31 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	31 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	31 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี	-	-
5	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
6	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
7	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
8	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
9	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
10	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
11	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี	-	-
12	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA02						
13	DBA03S-09	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
14	DBA04S-05	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 สะพานขาว
15	ย้ายโหลด DBA05,06 บางส่วนไปจ่ายจาก HKA06						
16	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
17	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
18	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
19	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ช้างขนส่ง
20	DBA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 สามแยกนางบวช
21	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
22	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
23	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
24	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	สามแยกนางบวช
25	DIS ชั่วคราว(DBA05)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	สามแยกนางบวช(ข้ามถนน)
26	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
27	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA05						
28	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
29	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
30	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.1
31	แจ้ง กฟส.ดบ. โหลดโหลด บริเวณสามแยกนางบวช (หม้อแปลง 2 เครื่อง)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	เมื่อ กฟส.ตบ. โลงน้โหลต บริเวณสามแยกนางบวช (หม้อแปลง 2 เครื่อง) แล้วเสร็จ						
33	แจ้ง ชุดขอทโลงน้กระเข้าตัด DDE บริเวณสามแยกนางบวช (ตามผังแนบ)						
34	เมื่อ ชุดขอทโลงน้กระเข้าตัด DDE บริเวณสามแยกนางบวช (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
35	เมื่อพร้อมดับไฟ						
36	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
37	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
38	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
39	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6
40	แจ้ง กฟส.ตบ. ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 รัานตัดผมนางบวช อยู่สถานะ OFF ให้ล็อกคาน						
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
48	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
49	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
50	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
51	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
52	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี	-	-
53	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA	-	-
54	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
55	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลตกลับ						
57	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
58	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
59	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี	-	-
60	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
61	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
62	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี	-	-
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
64	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
65	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
66	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
67	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
68	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
69	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
70	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
71	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 วงจร DBA01 บริเวณ DBA1S-01หน้าสฟฟ.คบ. ถึง DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช
 วงจร DBA05 บริเวณ DBA5S-01หน้าสฟฟ.คบ. ถึง Dis ชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช ถึง DBA5S-02แยกนางบวช
 วงจร DBA06 บริเวณDBA6S-01หน้าสฟฟ.คบ.ถึง DBA6S-02 โรงเรียนนางบวช

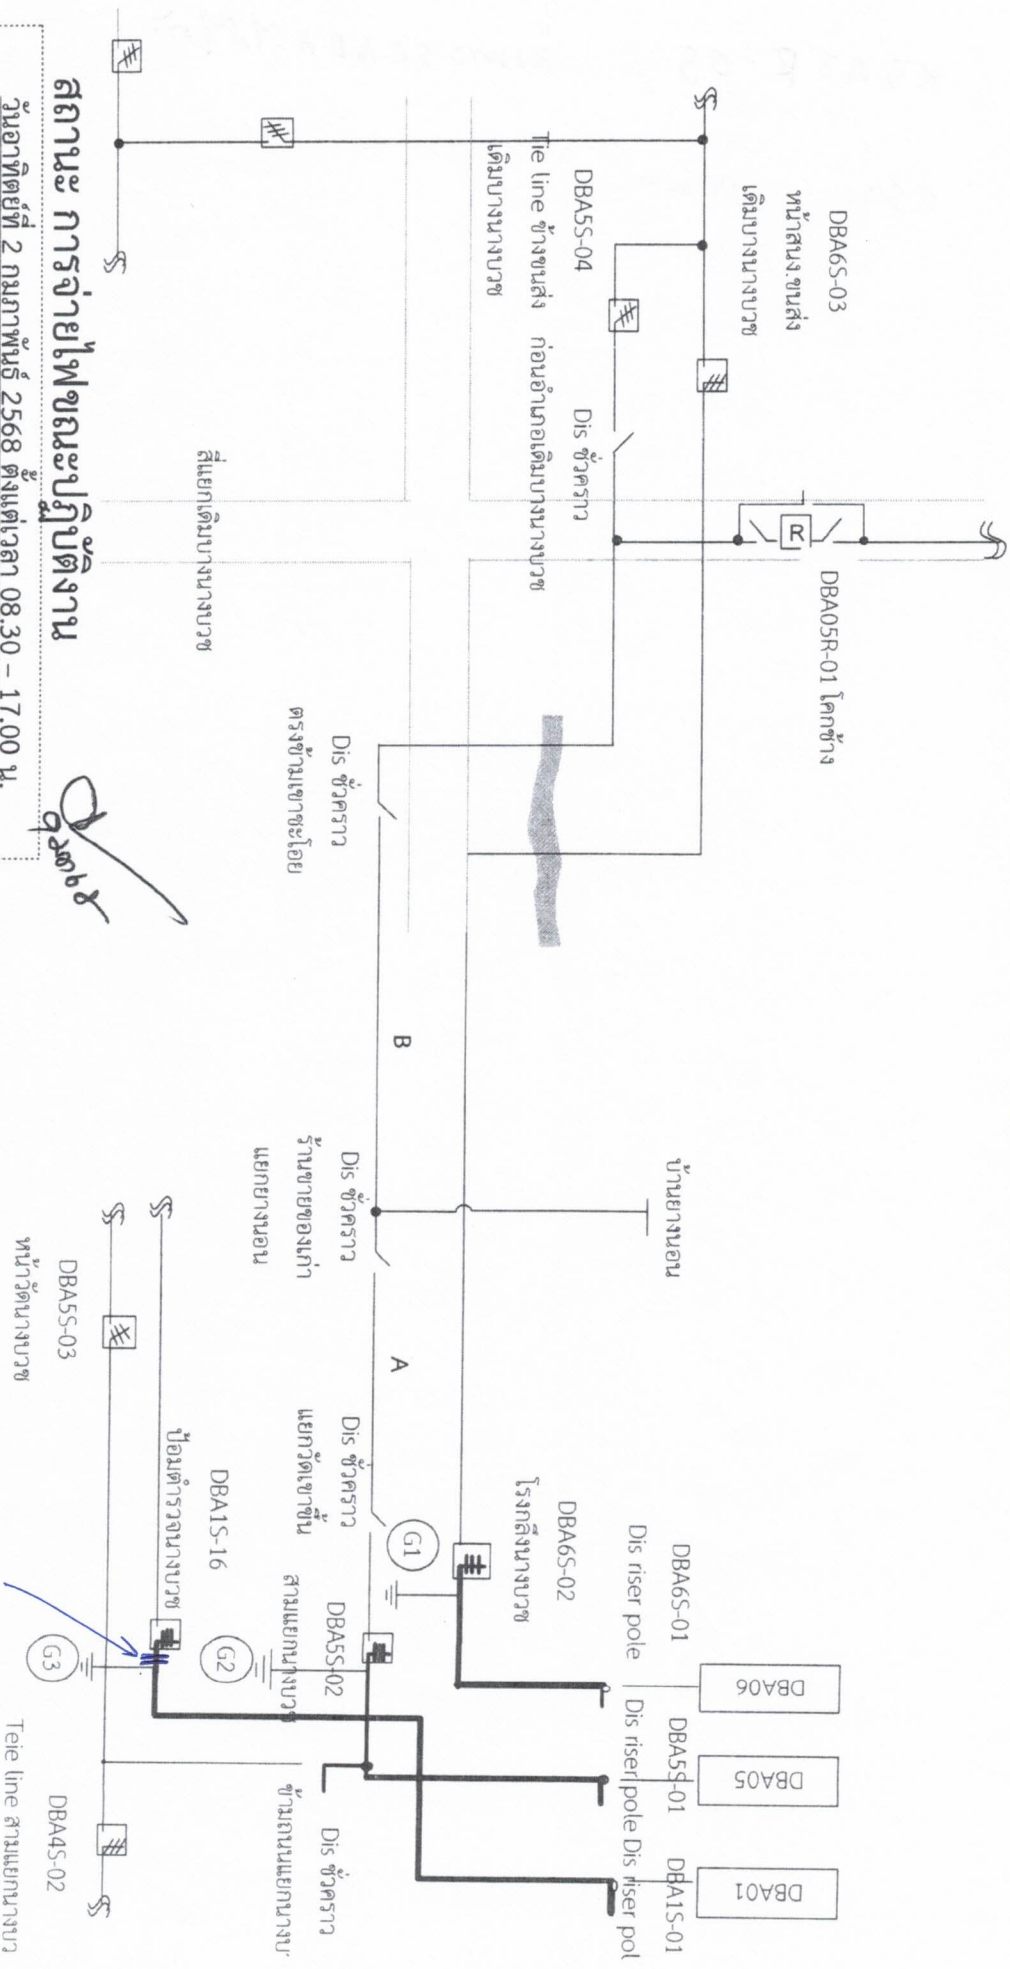

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ดับไฟเพื่อ ให้ บริษัทแอนตี้ไซ พาวเวอร์ จำกัด ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 หมายถึง — บริเวณที่ขอตดับไฟปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)

DDE เที่ยงคงมอด

Hotline กรณีเข้า คัด DDE

เบอร์ DBA15-16.
