



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๐๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ผ.บ.ร.ษ. ผ.จก.ก.ฟ.ส.พ.นมท.น

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมท.น.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU01	๒๗ ก.ค. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๑.๐๐ น.	เชื่อม DDE บ้านหนองระหงษ์	PTU2R-01	PTU2s-16	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๔๒๐.....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอนุชา ชำนาญเรือ.....ตำแหน่ง.....ท.ผ.บ.บ.....โทร.....๐๘๕-๓๑๖๒๑๑๙.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี.....)
ตำแหน่ง.....ท.ผ.บ.บ.ร.ษ. ผ.จก.ก.ฟ.ส.พ.นมท.น

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๗ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1032/2567

ในวันที่..... อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ในวันที่..... อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นกเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ
21 ก.ค. 67

(นาย อรรถพงษ์ นกเทศ บก.ก.๓.๓)

๐๘๓.๕ ๒๒๓๓ ๖๕๖.๓๗

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1.....แผ่น
แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เชื่อม DDE ฟาร์มทานตะวัน หลังPTU02R-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.ค. 67 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทน. งานที่ทำ เชื่อม DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน 1032/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพรภักดิ์,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
3	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.	R	ตอนตาเพชร
4	- ดับไฟเวลา 09.30น.						
5	PTU02R-01	สับ	ปลด		พทน.	R	ตอนตาเพชร
6	SW.LOAD	สับ	ปลด		พทท.	R	ตอนตาเพชร
7	PTU02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	หน้าวัดบ่อหว่า
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทท.รับทราบ						
9	แจ้งกฟส.พทท.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งกฟส.พทท.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G2						
11	แจ้งกฟส.พทท.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งกฟส.พทท.ปฏิบัติงานได้						
13	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
14	หลังจากกฟส.พทท.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	ตรวจสอบกฟส.พทท.ทำการเชื่อม DDE.ไลน์ PTU01 ฟาร์มทานตะวัน เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
16	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลดช็อคกราวด์ จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟส.พทท.ทำการปลดช็อคกราวด์ จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	- จ่ายไฟ						
20	SW.LOAD	ปลด	สับ		พทท.	R	ตอนตาเพชร
21	PTU02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.	R	ตอนตาเพชร
22	PTU02R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.	R	ตอนตาเพชร
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

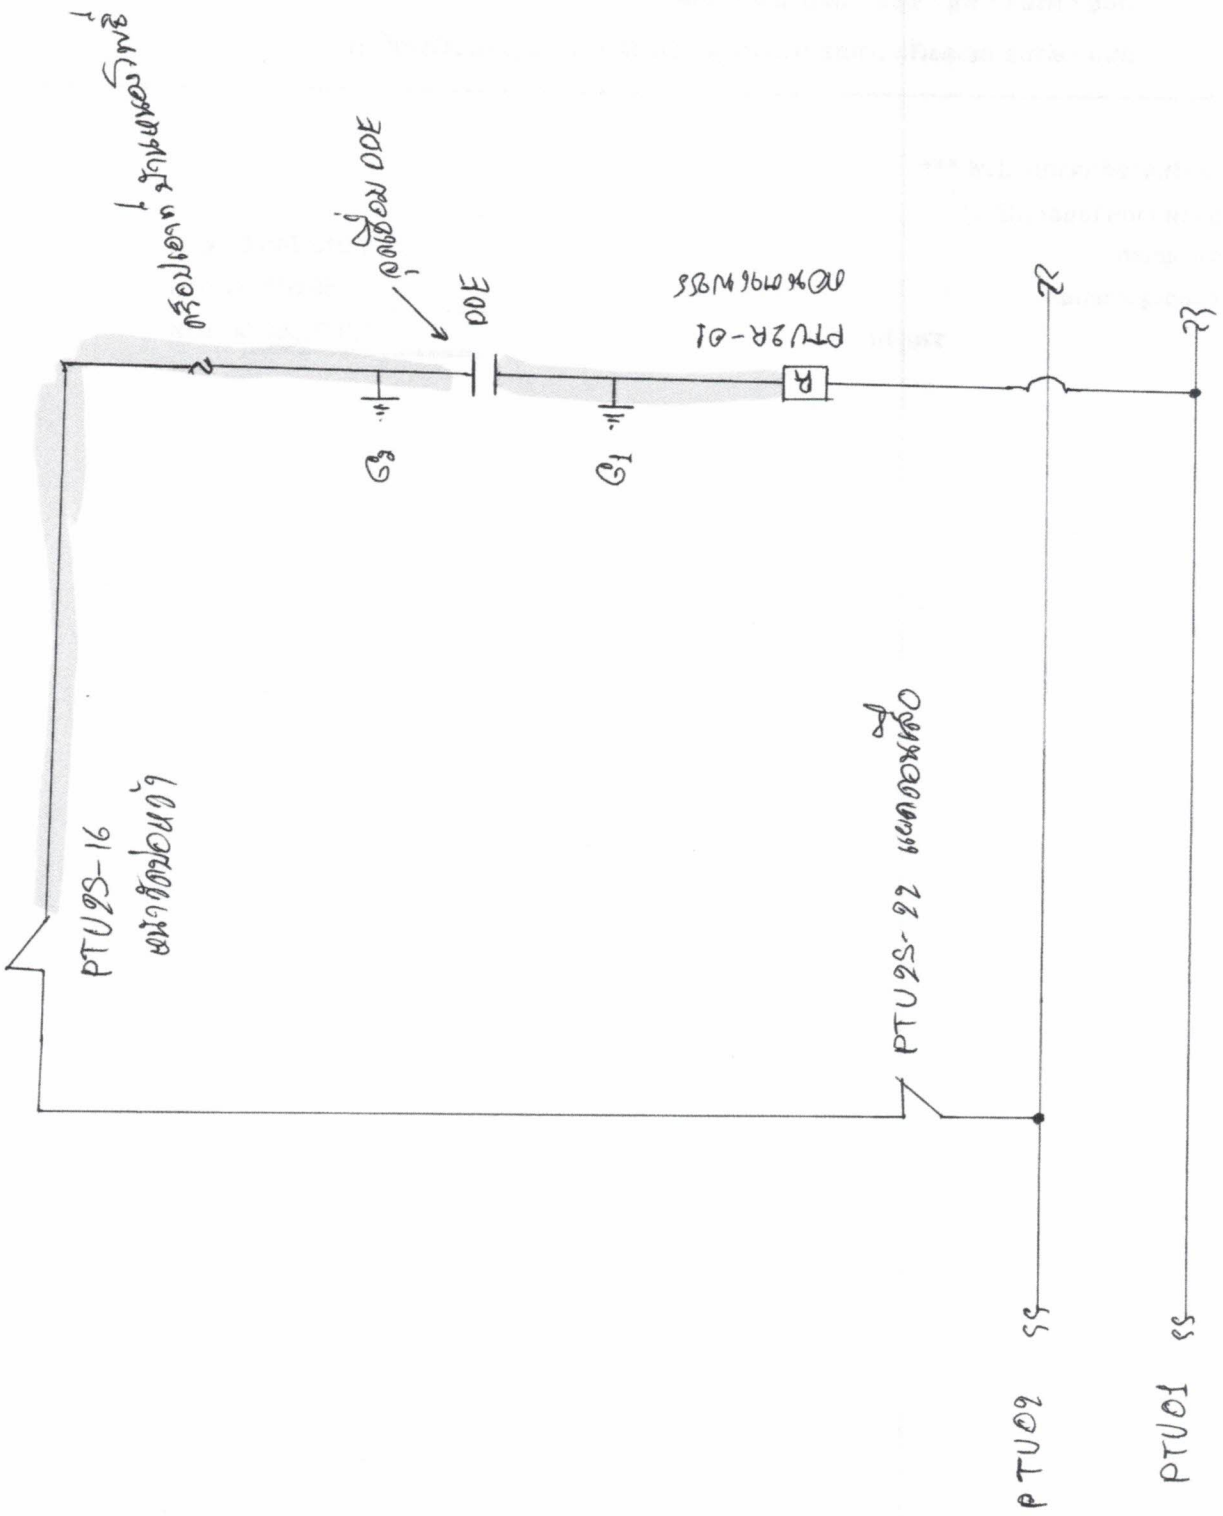

Q164

สายเคเบิล 1
สายเคเบิล 2

สายเคเบิล 1
สายเคเบิล 2
