



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ. (ป.น) ค.๓๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายเนห์ธี เซวาร์พงษ์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟล.นครปฐม

Switching Deadline
วันที่ 11 สค ๖4

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT07	12 สิงหาคม 2564	11.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน NPT07S-01			นายชัยยศ โพธิ์รัตน์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ.กฟล.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.การส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเนห์ธี เซวาร์พงษ์)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟล.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT7 จาก MPT 7S-01 ถึง หมัด NPT 7VB-C1 OUTSERVICE
 ในวันที่ 12 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1032/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์

(นายเนห์ธี เซวาร์พงษ์)
ร.จ.ก.(ท.) กฟล.นครปฐม.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟล. นฐ.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี NPT)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การตรวจสอบระบบจำหน่ายด้วยกล้องส่องจู้ร้อน

แผ่นรายงานที่ 27
กฟพ. กฟจ. นฐ
สพพ.
ผู้ตรวจสอบ
วิทวัส พรหมรักษา 504313
เกียรติคุณ สมกุล 504307

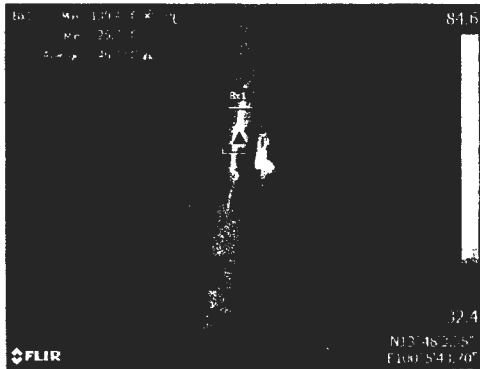

Position	หับสเตรส หน้าสถานี	Pole number	NPT75-01
Date	29/7/2021	Humidity	
Circuit	22 kV	Emissivity	0.60
Feeder	7	Distance	10 เมตร
Equipment	Terminal Lug Dis หับสเตรส	Ambient	25 °C
Phase		Atmospheric	65 เปอร์เซ็นต์

Finding	Terminal Lug Dis หับสเตรส Side Load Phase B hot				
Actual Temp ØA(S)	-	Actual Temp ØB	-	Actual Temp ØC	-
Actual Temp ØA(L)	-	Actual Temp ØB	>130.4 °C	Actual Temp ØC	-

ข้อเสนอแนะในการบำรุงรักษา

ตำแหน่งจุด	อุณหภูมิที่แตกต่าง	การแก้ไข	การดำเนินการ
Phase A	-		
Phase B	>105.4 °C	ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน	ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยน Terminal Lug
Phase C			

เครื่องมือ กล้องอินฟราเรด ยี่ห้อ FLIR รุ่น Ex หมายเลขพัสดุ
