



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) 635 / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพจน์นันทน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเจริญ ศรีบางแพรก

Switching Deadline

7 ก.ค. 66

แผนงานด่วน

โทรสารขอตัดไฟ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ดมข.มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด้านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟพ.ดมข. DMA10	๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐	DMA10S-01 หน้า สฟพ.ดมข.	DMA10S-03 บ้าน ผญ.อืด	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้า สฟพ.ด้านมะขามเตี้ย ถึง บ้านท่ากระบือ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ.กฟส.อ.ดมข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  ๓ ก.ค. ๖๖

( นายเจริญ ศรีบางแพรก )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA10 จาก DMA10S-01 ถึง DMA10S-03  
ในวันที่ 12-13 ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1034/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ประสพผล.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ดมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
( นายจันทร์ ไชยพันธ์ )  
ว.ก.๔ แทน ผ.จ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

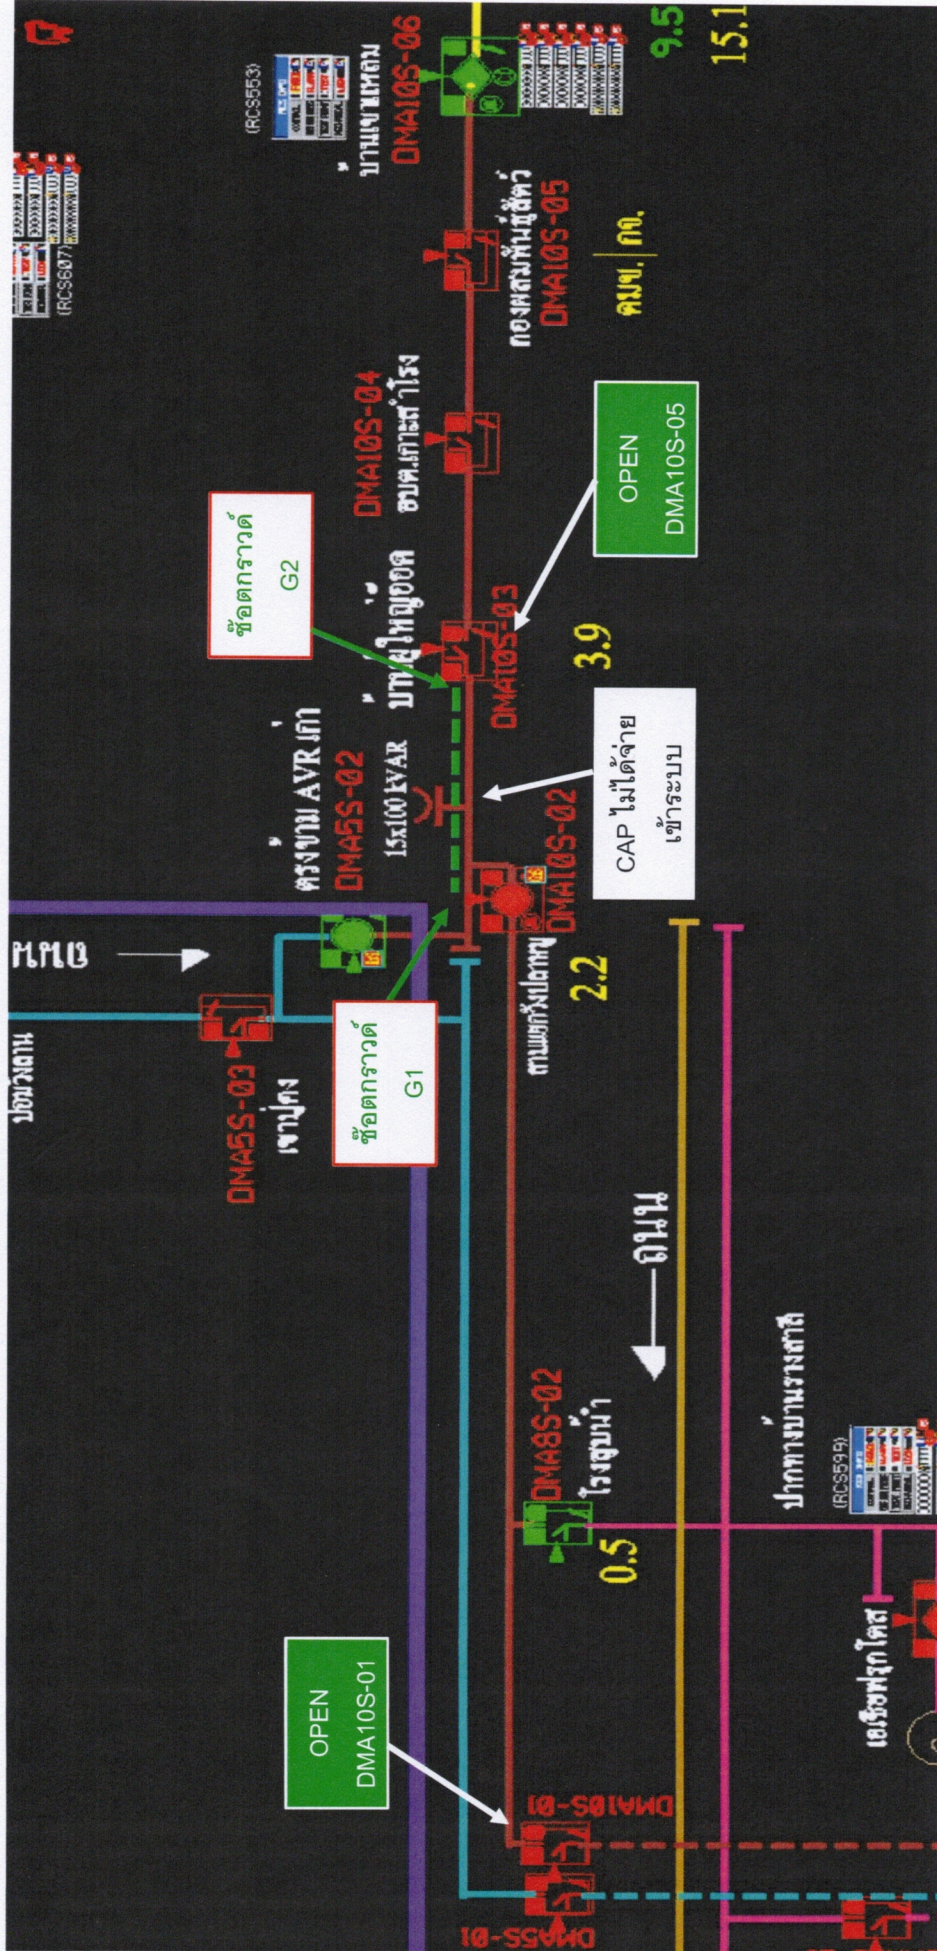
## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณ DMA10S-01- DMA10S-03 ผู้ใหญ่ออด   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 12 - 13 ก.ค. 66  | เวลา     | 08.30 น. ถึง 17.00 น.                           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ดมข.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1034/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน   |          | วันที่ 5 กรกฎาคม 2566                           |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 5 กรกฎาคม 2566                           |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 5 กรกฎาคม 2566                           |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
6	ย้ายโหลด DMA 10 ไปจ่ายจาก TMA 2						
7	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
8	DMA10VB-01	สับ	ปลด		DMA		-
9	DMA10S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.10
10	ให้ตรวจสอบ SF6 DMA5S-02 ตรงข้าม AVR เก่า อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DMA10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS บ้านผู้ใหญ่ออด
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
18	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
19	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (จุดปฏิบัติงานไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 13 ก.ค.66						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
25	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
26	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						



ผังดับไฟทำงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย  
DMA๑๐ วันที่ ๑๒,๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖



พื้นที่ปฏิบัติงาน
