



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๐๕๙/๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU๐๑	๒๑ ก.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูง บ้านดอนตาเพชร	PTU๐๑S-๑๒ ตลาดนัด ๓๑	ตริอปชั่วคราว คลองชลประทาน	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๔๒๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ข.ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ PTU1 จาก PTU 1S-12 ถึง D/E ๒๑.๑๐๐๖๖๖๖๖๖๖
 ในวันที่ 21 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1045/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.บ. (นายอนุชา ชำนาญเรือ) ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
 ๐๑๑, 5 หมู่ ๕ ม.๑๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.พทท.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านคอนตาเพชร (PTU01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1045/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง				วันที่	9 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
3	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
4	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.	R	R.คอนตาเพชร
5	ดับไฟย้ายโหลดวงจร PTU01 บางส่วน(หลัง D/F ชค.คลองชลประทาน) ไปรับไฟวงจร PTU02						
6	PTU02R-01	สับ	ปลด		พทน.	R	R.คอนตาเพชร
7	Dis.ด้าน Load	สับ	ปลด		พทน.	DIS	Load R.คอนตาเพชร
8	D/F โล้น PTU01	สับ	ปลด		พทน.	D/F	คลองชลประทาน
9	D/F โล้น PTU01	ปลด	สับ		พทน.	D/F	บ้านหนองระหงษ์
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	PTU01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	DIS	ตลาดนัด กม.31
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
17	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
23	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
24	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	PTU01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	DIS	ตลาดนัด กม.31

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ดับไฟย้ายโหลดวงจร PTU01 บางส่วน(หลัง D/F ชค.คลองชลประทาน) กลับจากวงจร PTU02						
28	Dis.ด้าน Load	ปลด	สับ		พทน.		DIS Load R.ดอนตาเพชร
29	PTU02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		พทน.		R.ดอนตาเพชร
30	D/F ไลน์ PTU01	สับ	ปลด		พทน.		D/F บ้านหนองระหงษ์
31	D/F ไลน์ PTU01	ปลด	สับ		พทน.		D/F คลองชลประทาน
32	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
33	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
34	PTU02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R.ดอนตาเพชร
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

110kV 700MVA

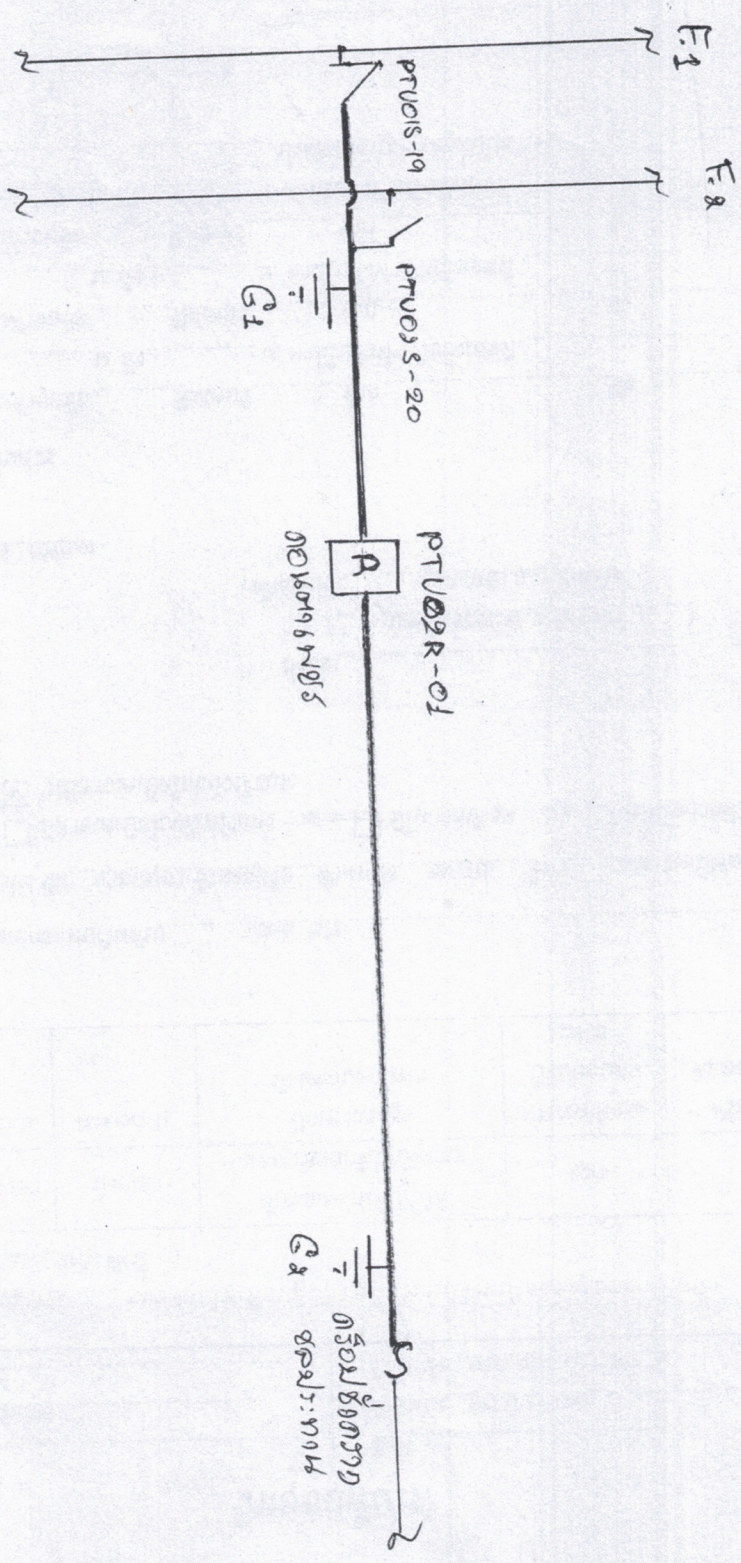

— 00160196MB5
