



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๑๖๗๕ ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์

ชื่อผู้ส่ง นายนพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แม่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB1	๓๒ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายปาก ทางเข้าสำโรง(มอเตอร์เวย์)	-NCB1R-02	- Dis ชั่วคราว โรงสีข้าว	ธรรมาวัจน์ เศรษฐวรรณ์ ๐๘๖๘๔๔๖๖๖๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ชุมชนบริเวณปากทางวัดสำโรง (๒ราย)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนพรัตน์ เคารพไทย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NCB01 จาก NCB1R-02 ถึง Dis ชั่วคราวโรงสีข้าว
ในวันที่ 12 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1051

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศกพร ตันติกะธรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพชลิต สีขาวซ่า
10 ส.ค. 64

ศกพร ตันติกะธรรณ
(วอ.ก. 7 11ทพ นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. นช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แม่น

แผนผังแนบ 3 แม่น

ผจฟ. (สถานี) _____

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางเข้าวัดสำโรง (มอเตอร์เวย์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-ส.ค.-64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1051/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	10 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing		นช.		R วัดกลางคูเวียง
2	NCB01R-02	Normal	Nonreclosing		นช.		R วัดสำโรง
3	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วน เปลี่ยนการจ่ายไฟ						
4	NCB01S-09	ปลด	สับ		นช.		DIS บ้านก้านน้ช้าง
5	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีข้าว
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
7	NCB01R-02	สับ	ปลด		นช.		R วัดสำโรง
8	ปลดใบมิตด้าน load ของ Recloser วัดสำโรง รหัส NCB01R-02						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.นช.ทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งกฟอ.นช. ปฏิบัติงานได้						
13	NCB01R-01	Nonreclosing	Normal		นช.		R วัดกลางคูเวียง
สิ้นสุด Switching							
14	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing		นช.		R วัดกลางคูเวียง
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
17	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีข้าว
18	สับใบมิตด้าน load ของ Recloser วัดสำโรง รหัส NCB01R-02						
19	ย้ายโหลด NCB01 บางส่วน กลับคืน						
20	NCB01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นช.		R วัดสำโรง
21	NCB01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS บ้านก้านน้ช้าง
22	NCB01R-01	Nonreclosing	Normal		นช.		R วัดกลางคูเวียง
23	NCB01R-02	Nonreclosing	Normal		นช.		R วัดสำโรง
สิ้นสุด Switching							


Check List	ถ้วน
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน	
ชื่องาน..... ปรับปรุงระบบจำหน่ายปากทางวัดสำโรง(มอเตอร์เวย์)	
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ปรับปรุงระบบจำหน่ายปากทางวัดสำโรง(มอเตอร์เวย์)	
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๒ ส.ค. ๖๔ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี	
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดแปลงแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	
ชื่อ..... นายนพรัตน์ เคารพไทย ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี	
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๔๑๑๑๔๓๒ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒	
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เศวรธรรม์	
ตำแหน่ง..... พชง.๔ ผจก.กฟอ.นช เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๖๘๔๔๖๖๖๒ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.	
.....	
.....	
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวขำ ผ.บ.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)	
๒.ผู้รับขอสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ปากทางวัดสำโรง ผู้รับผิดชอบ..... แก่ไฟ นช.๐๒	
จุดที่ ๒ หน้าโรงสีข้าว..... ผู้รับผิดชอบ..... แก่ไฟ นช.๐๒ จุดที่ ๓)..... ผู้รับผิดชอบ.....	
จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....	
จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....	
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๔ พร้อมแผนผัง Switching	
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมา หงษ์สินี	
.....	
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....	
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....	
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรมีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๐ ส.ค. ๖๔ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑	
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผ.บ.บ., ผจก.จ.บ. กฟอ.นช.	
.....	
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๐ ส.ค. ๖๔	
.....	


C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

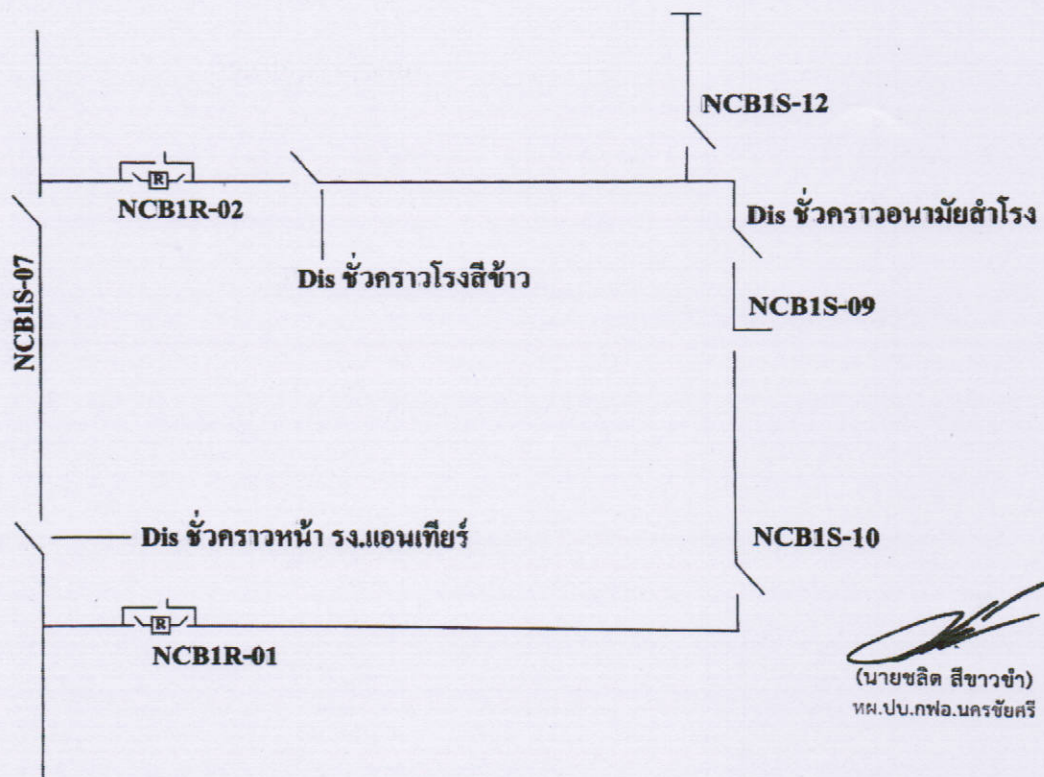




(นายชลิต สีขาวขำ)
ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

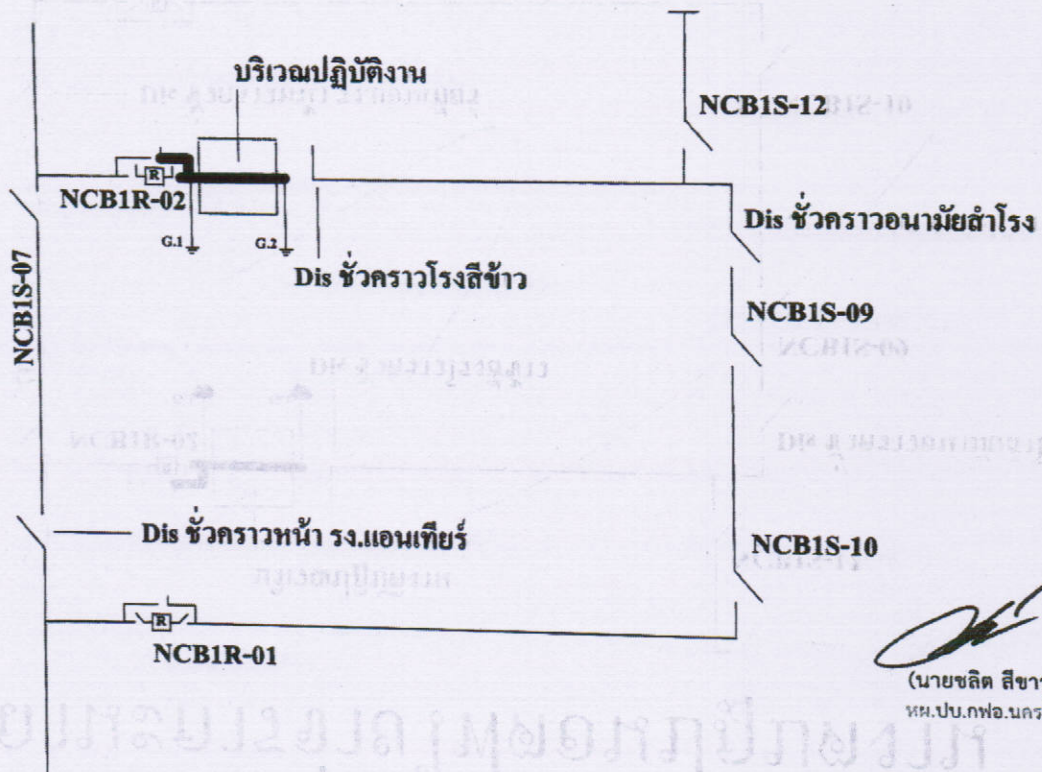สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

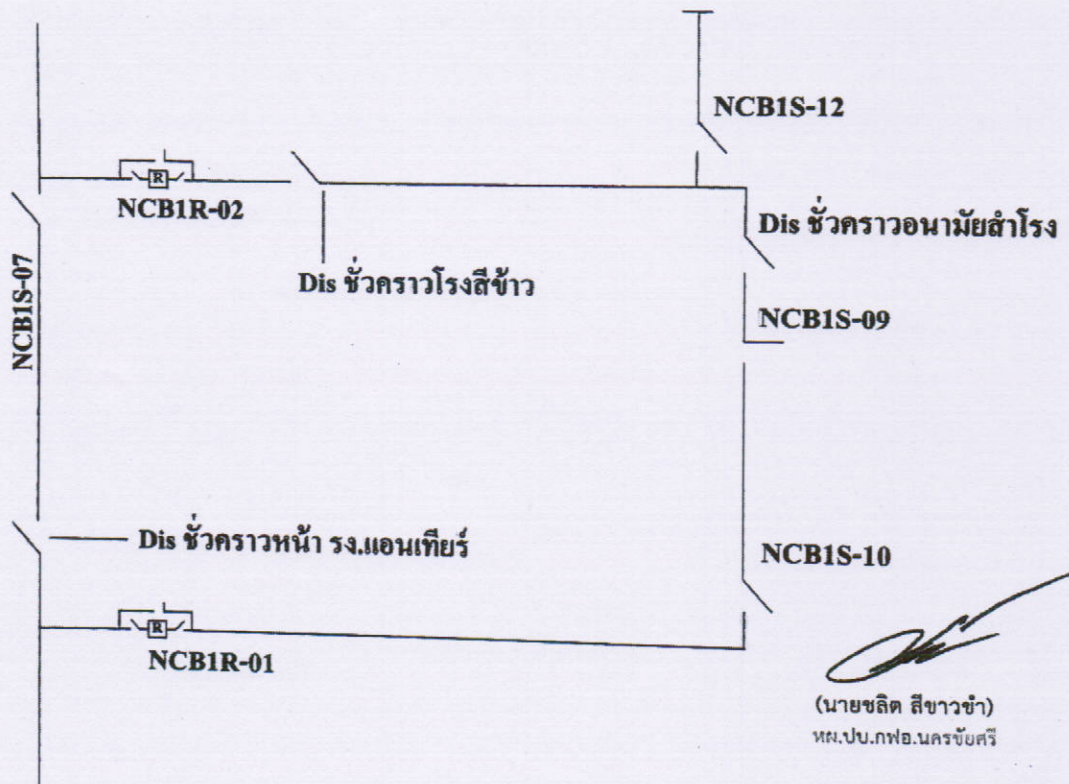

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน




(นายชลิต สีขาวขำ)
หม.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี
