

Switching Deadline.

25 5.9.69



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กบ.) ๕๐๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพุมขงค์ กาทหลง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๘ ส.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟปรับปรุงเปลี่ยนสาย แรงสูง บริเวณ รีโคสเซอร์ บ้านลาดสิงห์ ถึง SF6บ้าน ลาดสิงห์	รีโคสเซอร์ บ้านลาดสิงห์	SF6บ้าน ลาดสิงห์	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๒๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๙ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไพจิตร ตำแหน่ง ช.กบ โทร ๐๘๙-๒๑๘๕๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพุมขงค์

(นายพุมขงค์ กาทหลง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA03 จาก บ้านลาดสิงห์ ถึง SF6 DBA35-14. 2 ฟีดเดอร์
ในวันที่ 28 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 7069

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรรพ ชัยมงคล ประธานงานการขอตัดไฟกับ นาย อานันท์ ไพจิตร

16 5.9.69

นายพุมขงค์ กาทหลง
(นายพุมขงค์ กาทหลง)
๐๘๙.๒๑๘๕๔๔๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.อ.สามชุก

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รีโคลเซอร์ DBA3R-02 (บ้านลาดสิงห์) - SF6 DBA3S-14 (บ้านลาดสิงห์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1064/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	16 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านลาดสิงห์
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DBA03R-02	ลับ	ปลด		สข.		R บ้านลาดสิงห์
5	แจ้ง กฟส.สข.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟส						
6	เมื่อ กฟส.สข.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
7	แจ้ง กฟส.สข.ทำการตรวจสอบ SF6 DBA3S-14 (บ้านลาดสิงห์) ให้อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
16	แจ้ง กฟส.สข.ทำการลับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อ กฟส.สข.ทำการลับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	DBA03R-02	ปลด	ลับ คง Nonreclosing,ALT		สข.		R บ้านลาดสิงห์
19	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.		R บ้านลาดสิงห์
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2564

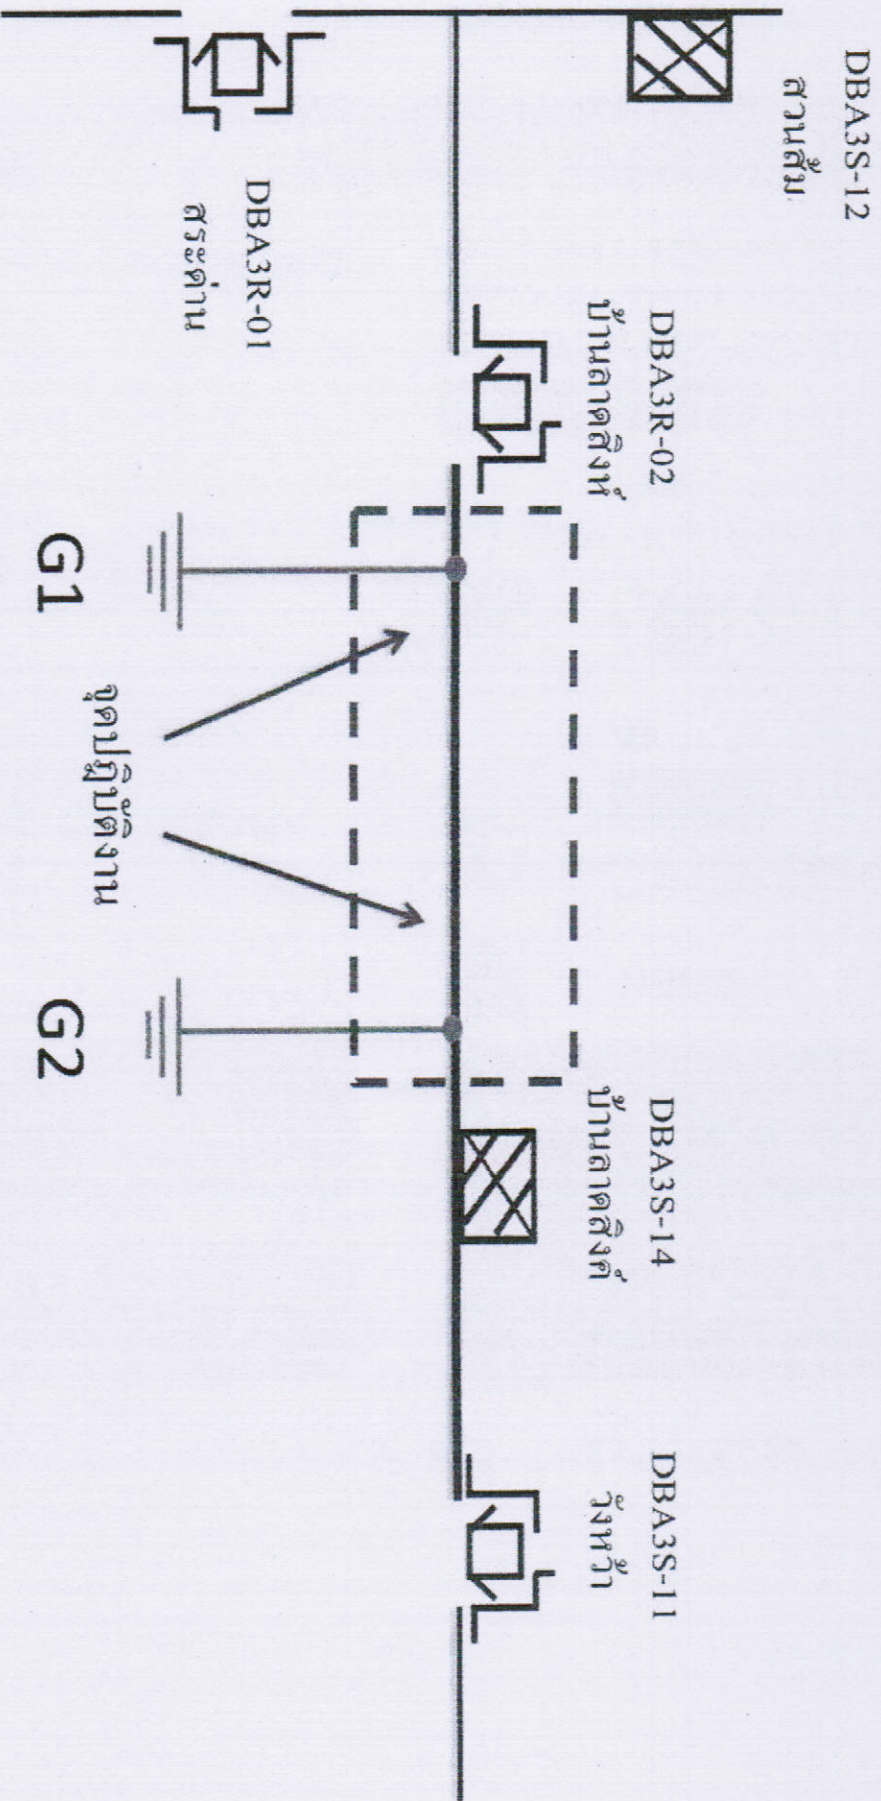

G1 ซ้อคกราวต์ โดยชุดแก้ไข นาย ธีรพงษ์ เข็มเพชร ความคุมงาน
G2 ซ้อคกราวต์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย อรรถพล เข็มเนตร ความคุมงาน
