



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ).- ๑๕๘๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน... เปลี่ยนจุดเชื่อมสายเข้าวงจรใหม่รองรับการจ่ายไฟ สค.๑๐
จำนวน = ๒ = แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๕	๗ ก.ค. ๖๖	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ชุดงานฮอตไลน์กระเช้า กฟอ.กทบ. เปลี่ยนจุดเชื่อม สายเข้าวงจรใหม่ รองรับ การจ่ายไฟสถานีฯ สค.๑๐ ถาวร	จุดเชื่อมสาย วงจรถบ (เคเบิลติดบ้าน) F.๕ KTE	จุดเชื่อมสาย วงจรถบ (เคเบิลติดถนน) F.๘ SMJ	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ. ๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการย้ายโหนด**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรดล)

ตำแหน่งรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ SMJ08 ฟีดเดอร์ KTE05 จาก จุดเชื่อมสาย KTE05 ถึง จุดเชื่อมสาย SMJ08
ในวันที่ 9 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1067/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ บ่อกลิ่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิ์ มาบัณฑิตย์
8 ก.ค. 66

(นาย จิรวรรณ บ่อกลิ่น)

๐๙๓.5 ๖๖กท ๒ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ผจฟ.....(สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านคอนไก่ดี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 66	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนจุดเชื่อมสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1067/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	8 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2566
7. สิ่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		- Load = 14.2 MW
3	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R Load = 2.0 MW
4	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R Load = 5.1 MW
5	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- Load = 20.8 MW
6	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- Load = 6.9 MW
7	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- Load = 6.6 MW
8	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- Load = 26.2 MW
9	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- Load = 6.7 MW
10	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- Load = 8.5 MW
11	ย้ายโหลด KTE05 บางส่วนไปรับไฟจาก SMV05						
12	SMU09S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กทบ		SF6 โคว้ชะวิตเป็นไลน์ข้ามถนน
13	KTA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กทบ.		SF6 หน้า บ.แคลคอม(โรงใหม่)
14	KTE05S-10	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS ตลาคันคั่นรวงทอง
15	KTE05S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอย รร.บ้านคอน
16	KTA04S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้า บ.แคลคอม(โรงใหม่)
17	SMU09S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ		SF6 โคว้ชะวิตเป็นไลน์ข้ามถนน
18	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
19	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
20	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
21	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
22	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
23	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
24	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
25	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 10.00 น.						
26	แจ้งหน้างานลง Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
27	แจ้งให้ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเปลี่ยนจุดจัมจาก KTE05 ไปจัม SMU08 โดยวิธี HOTLINE (๑๗๖๖๖๖๖)						
28	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose KTE05 และ KTE10 ไว้ตลอด						
29	เมื่อ Hot Line เข้าปฏิบัติงานเปลี่ยนจุดจัมจาก KTE05 ไปจัม SMU08 โดยวิธี HOTLINE แล้วเสร็จ (๑๗๖๖๖๖๖)						
30	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
31	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

แผนผัง ก่อนย้ายโหนด บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านดอนใต้
 เพื่อให้ชุดงานสอทได้แก่กระเช้า กทบ. เปลี่ยนย้ายจุดเชื่อมต่อสาย
 ขอย้ายโหนดวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

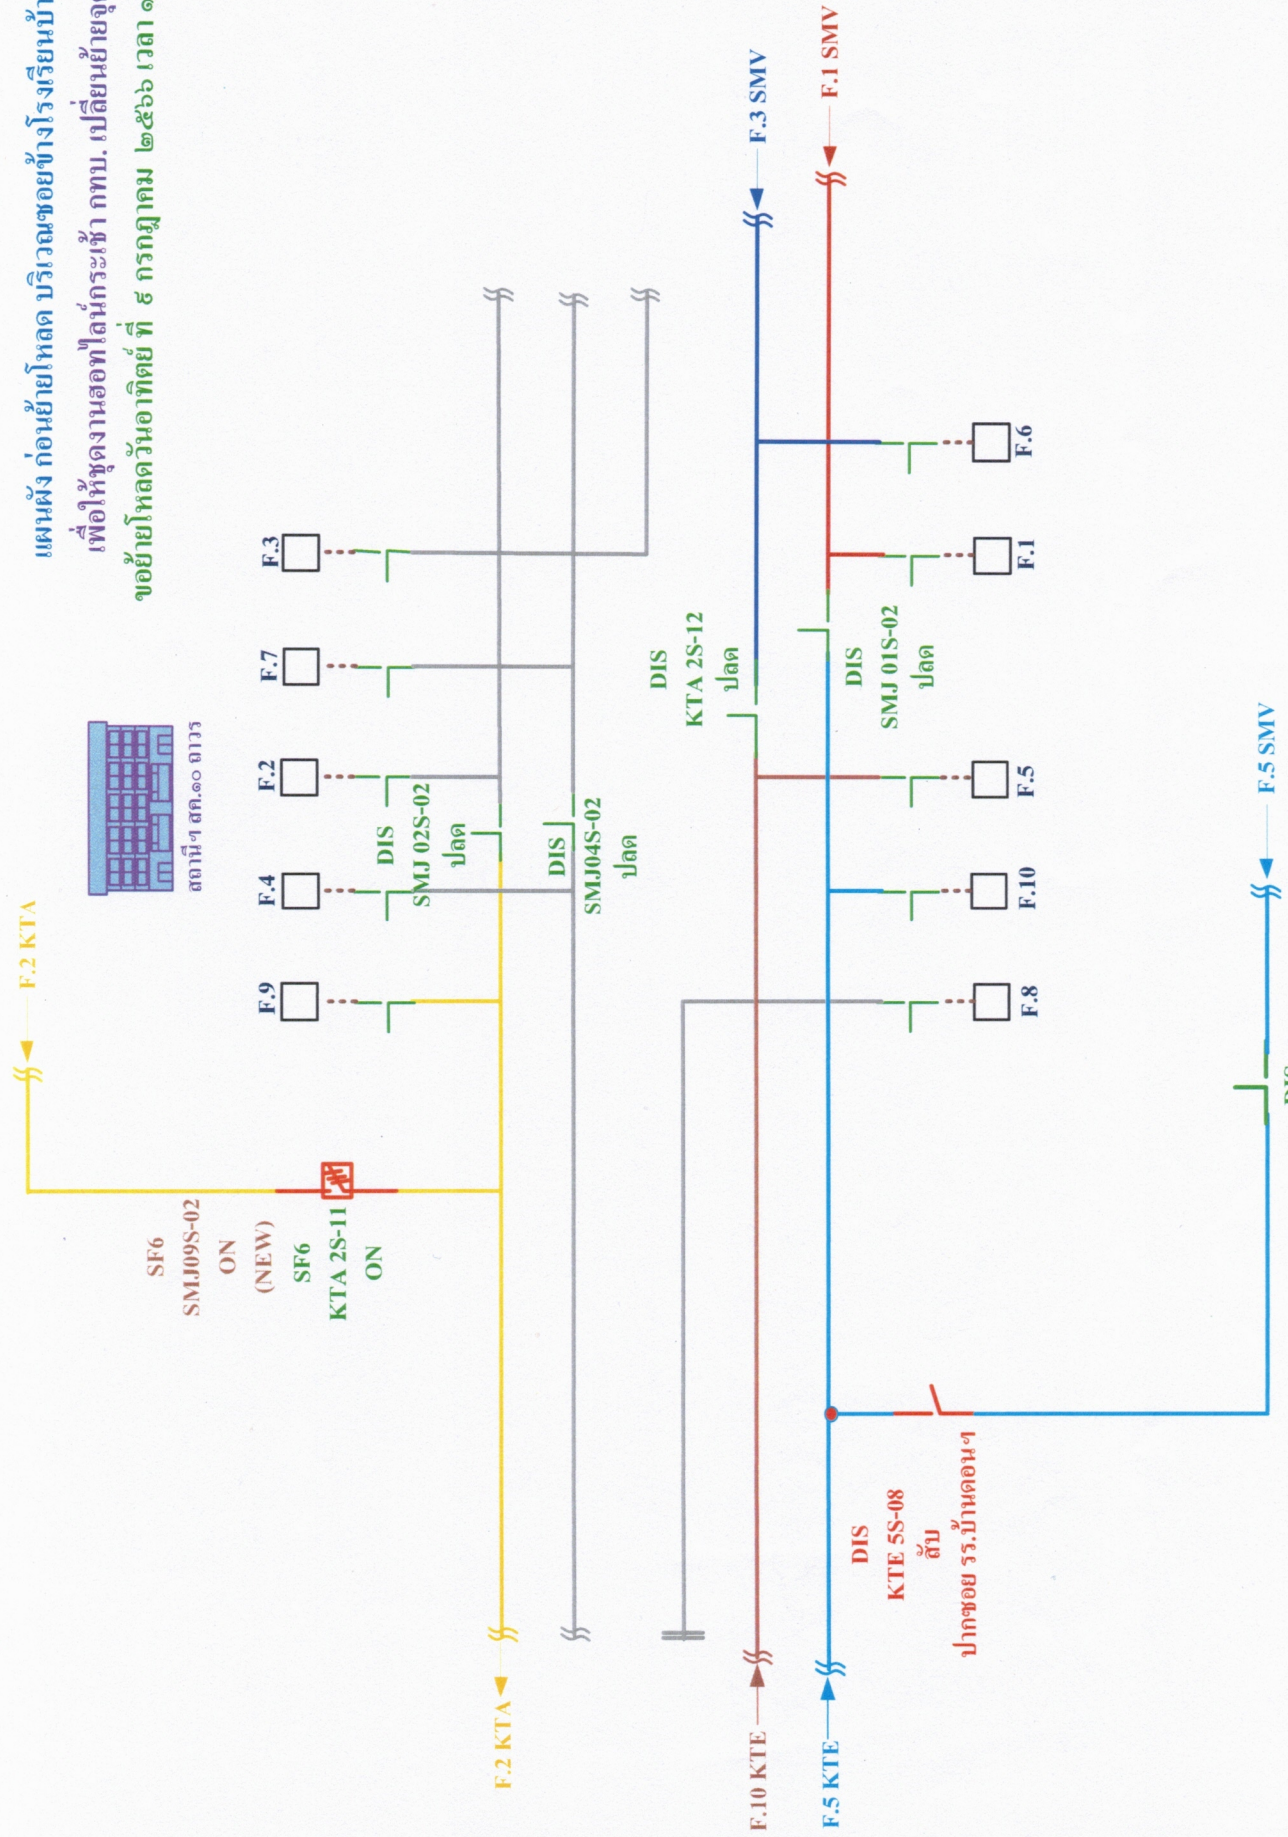


หมายเหตุ ไม่ผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการย้ายโหนดปฏิบัติงาน


ตลาดนัดต้นรวงทอง

สถานีฯ สค.๑๐ อ.11

แผนผัง หลังย้ายโหนด บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านคอนไก่ดี
 เพื่อให้ชุดงานสอทได้กระแสเข้า กทบ. เปลี่ยนย้ายจุดเชื่อมสาย
 ขอย้ายโหนดวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.



สถานีฯ สด.๑๐ ตาราง

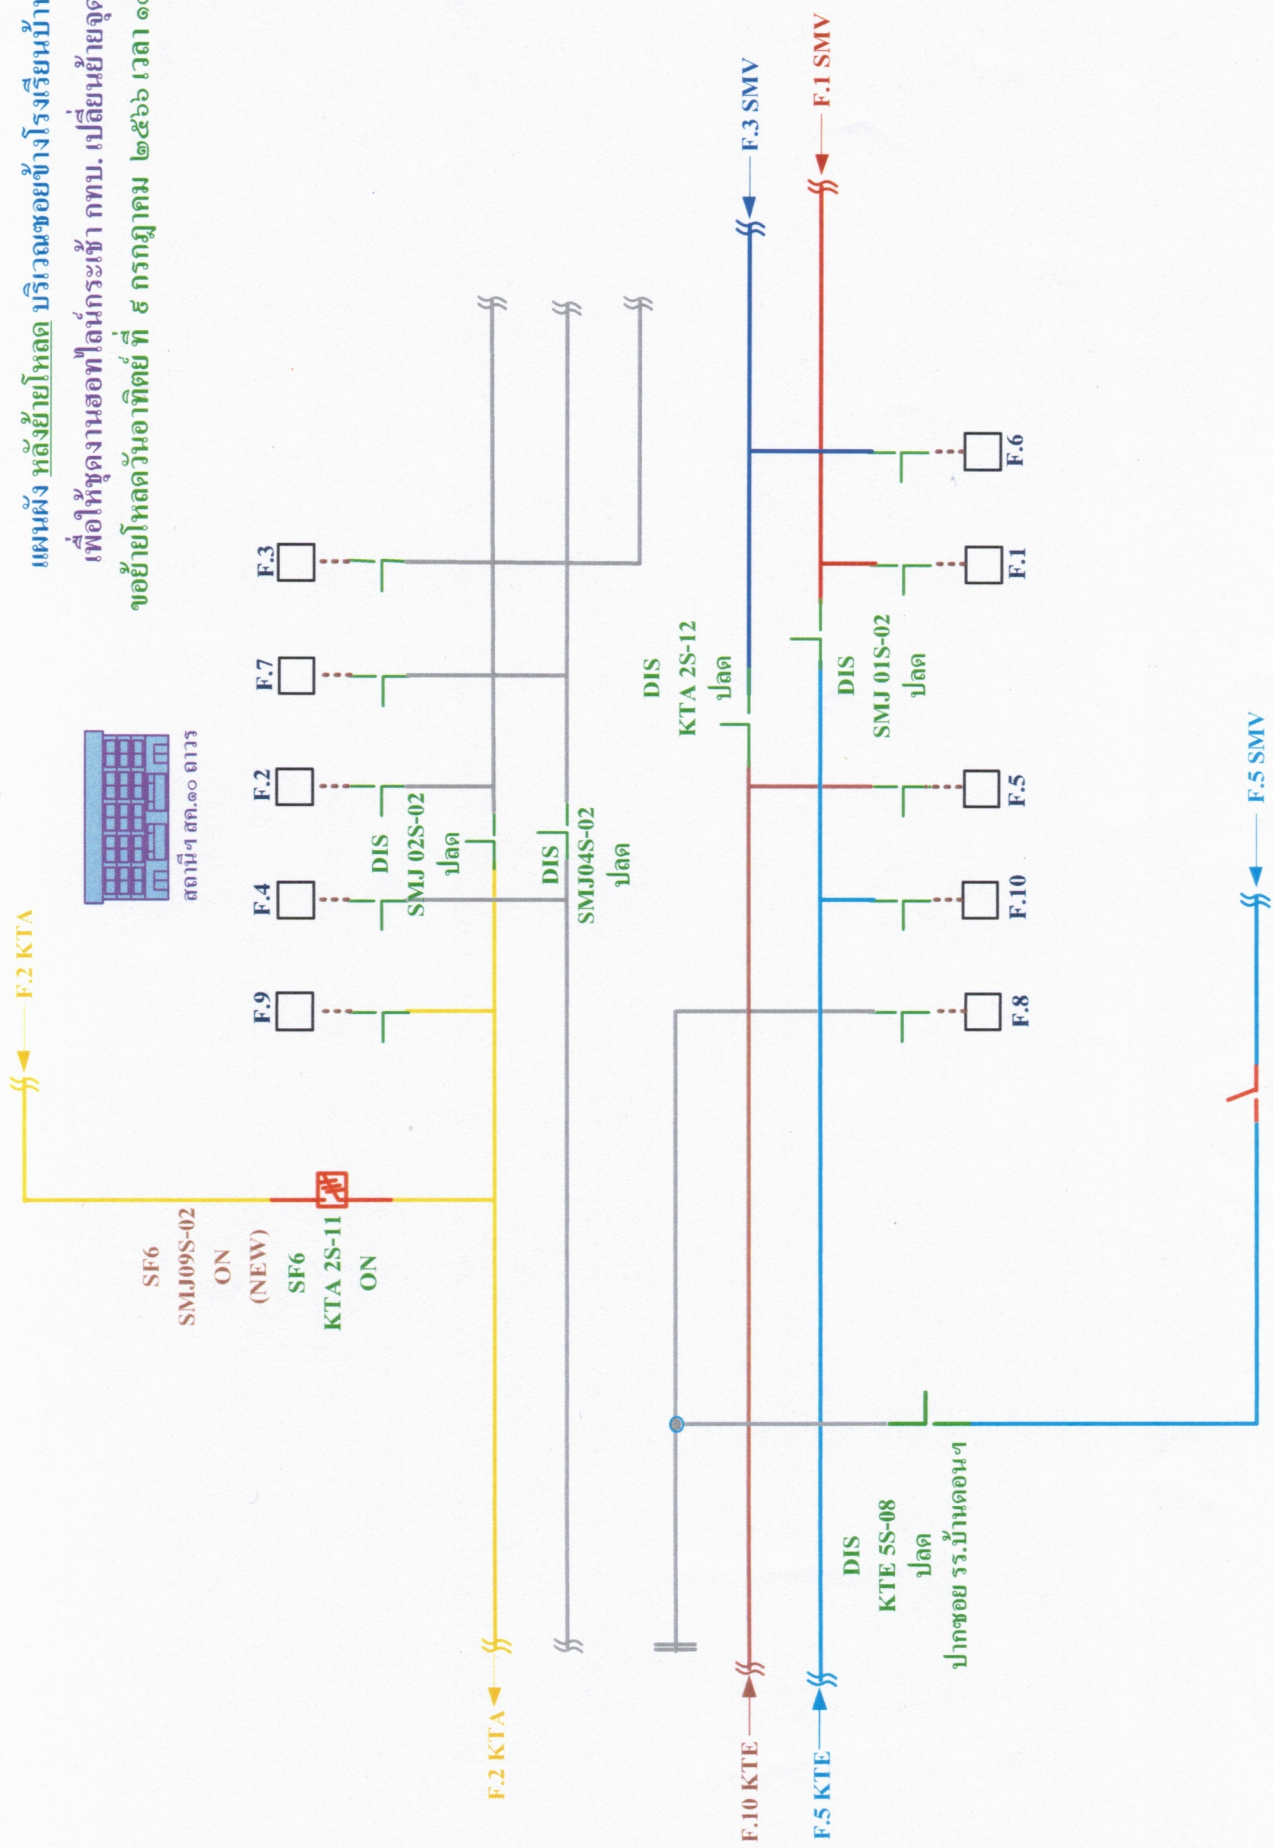

หมายเหตุ ไม่ผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการย้ายโหนดปฏิบัติงาน

————— เส้นสีเทาไม่ไฟฟ้า

ตลัดต้นตัมรวงทอง
