



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓..... /๒๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว.....
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง.....

วันที่..... ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔.....
ตำแหน่ง ..จก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

Switching Deadline
18 ส.ค. 64

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนหม้อแปลงนั้งร้านเปลี่ยนเป็นหม้อแปลงแบบแขวน และทำการรื้อถอนเสาแรงสูงที่ขวางหน้าร้านออก สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6 สพ.	23/08/64	09.00	16.00	รื้อถอนหม้อแปลงนั้งร้านเปลี่ยนเป็นแบบแขวนและทำการรื้อถอนเสาแรงสูงออก	SPA06R-03	DDE สะพานข้ามคลองไม้ขวาง	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายทิบูล ป่าน้ำ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนากร สุวรรณประทีป...ตำแหน่ง พชง.๒ (สช.)...โทร...๐๙๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายฉลอง โพธิ์ทอง...)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑. ฟีดเดอร์ SPA06R-03 จาก SPA06R-03 ถึง DDE สะพานข้ามคลองไม้ขวาง

ในวันที่ 23.8.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1095

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....

18 ส.ค. 64

นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
(นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว)
จก.ปบ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟภ.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA06R-03 - DDE สะพานข้ามคลองไผ่ขวาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอนหม้อแปลงนั่งร้านเปลี่ยนเป็นแบบแขวน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1075/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD 4.36 MW.
5	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โรงเรียนสหวิทย์
6	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA02						
7	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
8	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.	DIS	เลี้ยงเมืองสถานพินิจ
9	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
10	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.	R	โรงเรียนสหวิทย์
11	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการปลดใบมีดด้านนอกไลน์ออกทั้ง 3 เฟส						
12	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการปลดใบมีดด้านนอกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
13	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
14	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดทำงานออก						
15	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดทำงานออกแล้วเสร็จ						
16	แจ้ง HL ทำการตัด DDE บริเวณสะพานข้ามคลองไผ่ขวางออกทั้ง 3 เฟสได้						
17	เมื่อ HL ทำการตัด DDE บริเวณสะพานข้ามคลองไผ่ขวางออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
22	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
25	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
28	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
30	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรวดี จุด G1						
31	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรวดี จุด G2						
32	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานข้ามคลองไผ่ขวางเข้าทั้ง 3 เฟสได้						
33	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานข้ามคลองไผ่ขวางเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
34	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส						
35	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
36	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก SPA02						
37	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย์
38	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนนานบัส
39	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
40	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนนานบัส
41	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
44	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสทวิทย์
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หม.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หลังรีโกลสเซอร์สวิตช์SPA๐๖R-๐๓...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์..๖..สถานี...สุพรรณบุรี...ตั้งแต่บริเวณ.. หลังรีโกลสเซอร์สวิตช์-สะพานข้ามคลองไม้ขวาง กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายณฤพนธ์ สาตถรร..ตำแหน่ง ..พชง.๖ ผบ.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

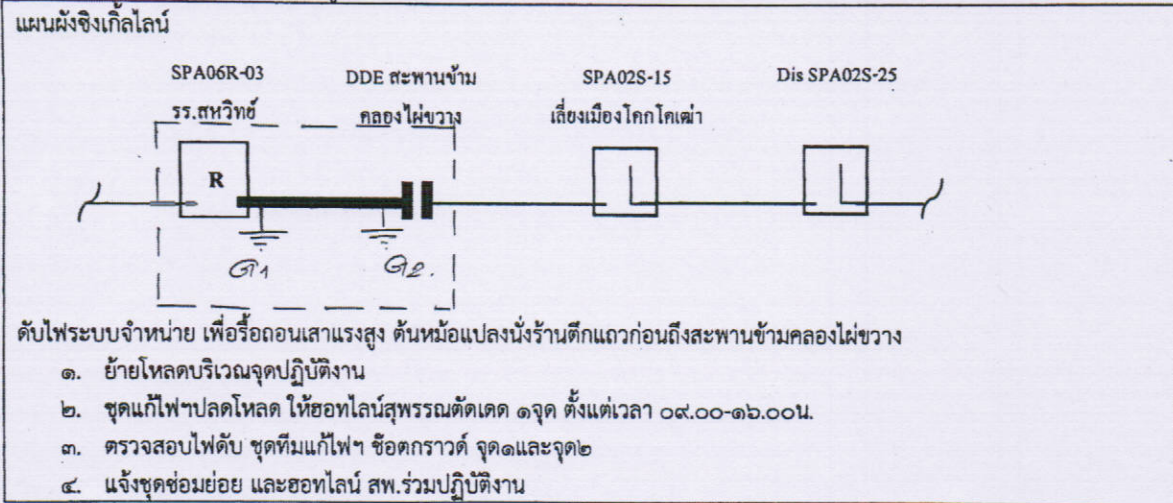

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ทพพ ล

(นายทศพล สังข์ทอง)
พชง.๕(ปฟ.)ผบ.กฟจ.สพ.

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
