

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๓.....  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์ทอง.....  
 ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....

วันที่.....๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕.....  
 ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....  
 ตำแหน่ง.....จก.ท.(ท.) กฟจ.สท.....

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒... แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สท.	29/06/65	08.00	17.00	ทาดสายแรงสูง 185ค.ม. 2 วงจร	ข้างคูเวียร์	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ2	โทร.๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสมบุญ สุวรรณประทีป..... ตำแหน่งทจ.จ.(สข.)..... โทร.....๐๘๕๒๓๒๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....จก.ท.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สท.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA9 จาก Dist. กฟ. 2 ถึง DEEจุด A ม.ท.ม.บุรี, DEEจุด B.

ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1077/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อนิต บุญชู..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....

  
 (.....นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....)  
 ๖๐๑.๔ ททท. น.ท.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก..... ทฟ. สุพรรณบุรี.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DDEจุดA หมู่บ้านจามจรี - DEE จุด B อู่วิเชียร - ดิสค์ตรวจหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 มิ.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ พาดสายแรงสูง 185 มม 2 วงจร. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1077/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 22 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 22 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 22 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายธนิต,นายอนุสรณ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
3	SPA09R-01	Auto	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
4	DIS ชค.SPA09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		SPA		DIS ชค.สถานีสุพรรณ 2
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
8	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการตัดเดดไลน์ข้ามถนน จุดA บริเวณหมู่บ้านจามจรี ออกได้						
9	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการตัดเดด จุดA แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟไปชนที่ DDE จุด A						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 ออก						
11	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟจ.สพ ทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้ง กฟจ.สพ ปฏิบัติงานได้						
14	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
15	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงาน Wesafe						
17	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
18	SPA09R-01	Auto	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
19	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ.ทราบพร้อมทำการจัมเดด จุดA บริเวณหมู่บ้านจามจรี เข้าได้						
22	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการจัมจุด A แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
26	DIS ชค.SPA09	ปลด	สับ		SPA		DIS ชค.สถานีสุพรรณ 2
27	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
28	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
	สิ้นสุด Switching						





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDEตั้งข้ามถนนจุดA, ...เพื่อ...ปักเสาและทาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดพีคเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
พีคเตอร์ ...๔... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒-DDEจุดA, กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานข้า ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกล็ดโลบ

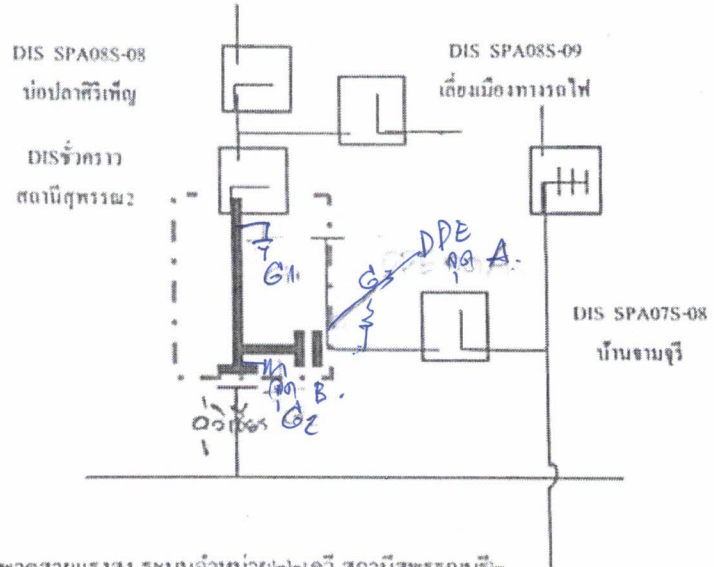

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อปักเสาแรงสูงและทาดสายแรงสูง ระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลดจุด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเตด ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทิมแก่ไฟช็อคกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

Oh.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๗(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
