



ด่วนมาก

Switching Deadline

วันที่ 19 ส.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นข.(ปบ.) /๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า..... NCB.....

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....๔..... แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                | จาก      | ถึง                            | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| ๑.  | NCB2     | ๒๑ ส.ค. ๖๔   | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>วัดเสถียร(มอเคอร์เวย์) | NCB2S-21 | - SF6<br>ชั่วคราว<br>วัดเสถียร | ธรรมรัตน์ เสด็จธรรม<br>๐๘๒๘๔๔๖๖๒ |
| ๒   | NCB3Y    | ๒๑ ส.ค. ๖๔   | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   |   | NCB3YB   | DDE จุด B<br>DDE จุด A         |                                  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนบริเวณวัดเสถียร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวท่า ตำแหน่ง ทล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายวรชัย แก้ววิจิตร )

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ NCB2 จาก NCB2S-21 ถึง SF6 วัดเสถียร

ในวันที่ 21 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1086164

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเดอร์ NCB3Y จาก NCB3YB-01 ถึง DDE ปทุมรัตนเสถียร

ในวันที่ 20-22 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุชิต คุ้มทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ชลิต สีขาวท่า

( นายอนุชิต คุ้มทรัพย์ )  
๖๐๓ 4 ทล.ปบ.กฟอ.

สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. นข., กฟอ. นข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผน  
แผนผังแนบ 3 แผน

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ แก้วจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |   |     |                           |                 |
|------------------------|--|----------|---|-----|---------------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ชุมชนบริเวณหน้าวัดเสถียร (115 เควี NCB03YB-01 - NCA04YS-06 - NCB03YS-04 , NCB02) |          |   |     |                           |                 |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 20,21,22 ส.ค. 64   | ระหว่าง  | 08.00 น.  | ถึง | 17.00                     | น.              |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.นช.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย(มอเตอร์เวย์)  |     | ตามใบขอปฏิบัติงาน         | 1086/64         |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |  |          | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง   |     | วันที่                    | 19 สิงหาคม 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |  |     | วันที่                    | 19 สิงหาคม 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |  |     | วันที่                    | 19 สิงหาคม 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |  |          | 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี                         |     | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |                 |
|                        |  |          | 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายมโนช   |     | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |                 |
|                        |  |          | 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์  |     | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                 |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ   | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ  |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|------|----------------|------------|---|
| 1   | Switching วันที่ 20 ส.ค. 64 Hot Line 115 เควี ปลดจุดจัมป์สายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน และ จุด B บริเวณปากทางวัดเสถียร (ตามแผนผัง) |                                      |                    |      |                |            |   |
| 2   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง   |                                      |                    |      |                |            |   |
| 3   | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCB03YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"   |                                      |                    |      |                |            |   |
| 4   | NPT04YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NPT            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 5   | NPU04YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NPU            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 6   | NCB03YS-01   | สับ                                  | ปลด                |      | NCB            |            | ใบมีด 115 เควี  |
| 7   | NCB03YS-03   | สับ                                  | ปลด                |      | NCB            |            | ใบมีด 115 เควี  |
| 8   | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ Hot Line 115 เควี ทำการปลดจุดจัมป์สายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน (แบบมีไฟ) ออกทั้ง 3 เฟส ได้                 |                                      |                    |      |                |            |   |
| 9   | หลังจาก Hot Line 115 เควี ทำการปลดจุดจัมป์สายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน (แบบมีไฟ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ                          |                                      |                    |      |                |            |   |
| 10  | NCB03YS-04   | สับ                                  | ปลด ล็อคกุญแจ      |      | นช.            |            | ABS ศูนย์ฮอนด้า   |
| 11  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ Hot Line 115 เควี ทำการปลดจุดจัมป์สายส่ง 115 เควี จุด B บริเวณปากทางวัดเสถียร (แบบไม่มีไฟ) ออกทั้ง 3 เฟส ได้                    |                                      |                    |      |                |            |   |
| 12  | หลังจาก Hot Line 115 เควี ทำการปลดจุดจัมป์สายส่ง 115 เควี จุด B บริเวณปากทางวัดเสถียร (แบบไม่มีไฟ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ                             |                                      |                    |      |                |            |   |
| <del>13</del>                                   | <del>NCB03YS-01</del>  | <del>ปลด</del>                       | <del>สับ</del>     |      | <del>NCB</del> |            | <del>ใบมีด 115 เควี</del>  |
| <del>14</del>                                   | <del>NCB03YS-03</del>  | <del>ปลด</del>                       | <del>สับ</del>     |      | <del>NCB</del> |            | <del>ใบมีด 115 เควี</del>  |
| 15  | NCB03YS-04   | ปลด ล็อคกุญแจ                        | สับ                |      | นช.            |            | ABS ศูนย์ฮอนด้า   |
| 16  | NPT04YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NPT            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| 17  | NPU04YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NPU            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี  |
| ***** สิ้นสุด Switching วันที่ 20 ส.ค. 64 ***** |  |                                      |                    |      |                |            |   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                   |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 18  | Switching วันที่ 21 ส.ค. 64                                  |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 19  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง           |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 20  | NCB-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | NCB          |            |                            |
| 21  | NCB02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NCB          |            | โหลด 6.6 MW                |
| 22  | NPT-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | NPT          |            | โหลด 34.66 MW              |
| 23  | NPT02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NPT          |            | โหลด 7.6 MW                |
| 24  | NPT02R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | นธ.          |            |                            |
| 25  | ย้ายโหลด NCB02 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT02                      |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 26  | NCB02S-18  | ปลด                                  | สับ                |      | นช.          | SCADA      | SF6 ทำแฉลบ(บน)             |
| 27  | NCB04S-06  | ปลด                                  | สับ                |      | นช.          |            | DIS สระน้ำหวาน             |
| 28  | NCB02S-21  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | นช.          |            | SF6 สะพานวัดทองไทร         |
| 29  | NCB02S-18  | สับ                                  | ปลด                |      | นช.          | SCADA      | SF6 ทำแฉลบ(บน)             |
| 30  | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.                                 |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 31  | SF6 ชค. NCB02  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | NCB          |            | SF6 ชั่วคราว หน้าวัดเสถียร |
| 32  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                       |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 33  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 34  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 35  | NCB-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | NCB          |            |                            |
| 36  | NCB02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NCB          |            |                            |
| 37  | NPT-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | NPT          |            |                            |
| 38  | NPT02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NPT          |            |                            |
| 39  | NPT02R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal             |      | นธ.          |            |                            |
| 40  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ปฏิบัติงานได้                             |                                      |                    |      |              |            |                            |
|     | ***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****                       |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 41  | หลังจาก กพอ.นครชัยศรี ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                    |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 42  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก          |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 43  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก          |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 44  | NCB-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | NCB          |            |                            |
| 45  | NCB02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NCB          |            |                            |
| 46  | NPT-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | NPT          |            |                            |
| 47  | NPT02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | NPT          |            |                            |
| 48  | NPT02R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | นธ.          |            |                            |
| 49  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 50  | SF6 ชค. NCB02  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                |      | NCB          |            | SF6 ชั่วคราว หน้าวัดเสถียร |
| 51  | ย้ายโหลด NCB02 บางส่วน กลับจาก NPT02                         |                                      |                    |      |              |            |                            |
| 52  | NCB02S-18  | ปลด                                  | สับ                |      | นช.          | SCADA      | SF6 ทำแฉลบ(บน)             |
| 53  | NCB02S-21  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                |      | นช.          |            | SF6 สะพานวัดทองไทร         |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ   | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                  |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|------|----------------|------------|---------------------------|
| 54  | NCB04S-06   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นช.            |            | DIS สระน้ำหวาน            |
| 55  | NCB02S-18   | สับ                                  | ปลด                  |      | นช.            | SCADA      | SF6 ทำแฉลบ(บน)            |
| 56  | NCB-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NCB            |            |                           |
| 57  | NCB02VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCB            |            |                           |
| 58  | NPT-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPT            |            |                           |
| 59  | NPT02VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPT            |            |                           |
| 60  | NPT02R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | นจ.            |            |                           |
| ***** สิ้นสุด Switching วันที่ 21 ส.ค. 64 ***** |   |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 61  | Switching วันที่ 22 ส.ค. 64 Hot Hot Line 115 เควี เชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน และ จุด B บริเวณปากทางวัดเสถียร |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 62  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง  |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 63  | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCB03YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"  |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 64  | NPT04YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPT            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 65  | NPU04YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPU            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| <del>66</del>                                   | <del>NCB03YS-01</del>   | <del>สับ</del>                       | <del>ปลด</del>       |      | <del>NCB</del> |            | <del>ใบมีด 115 เควี</del> |
| <del>67</del>                                   | <del>NCB03YS-03</del>   | <del>สับ</del>                       | <del>ปลด</del>       |      | <del>NCB</del> |            | <del>ใบมีด 115 เควี</del> |
| 68  | NCB03YS-04  | สับ                                  | ปลด ล็อคกุญแจ        |      | นช.            |            | ABS ศูนย์ฮอนด้า           |
| 69  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ Hot Line 115 เควี ทำการเชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด B บริเวณปากทางวัดเสถียร (แบบไม่มีไฟ) เข้าทั้ง 3 เฟส ได้           |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 70  | หลังจาก Hot Line 115 เควี ทำการเชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี บริเวณปากทางวัดเสถียร (แบบไม่มีไฟ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ                          |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 71  | NCB03YS-04  | ปลด ล็อคกุญแจ                        | สับ                  |      | นช.            |            | ABS ศูนย์ฮอนด้า           |
| 72  | แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้ Hot Line 115 เควี ทำการเชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน (แบบมีไฟ) เข้าทั้ง 3 เฟส ได้        |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 73  | หลังจาก Hot Line 115 เควี ทำการเชื่อมจุดจัมสายส่ง 115 เควี จุด A บริเวณตรงข้ามตลาดนัดสัมปทวน (แบบมีไฟ) เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ                  |                                      |                      |      |                |            |                           |
| 74  | NCB03YS-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | NCB            |            | ใบมีด 115 เควี            |
| 75  | NCB03YS-03  | ปลด                                  | สับ                  |      | NCB            |            | ใบมีด 115 เควี            |
| 76  | NPT04YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPT            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| 77  | NPU04YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPU            |            | เบรกเกอร์ 115 เควี        |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****           |   |                                      |                      |      |                |            |                           |

Check List

ถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดเสถียร(มอเตอร์เวย์)  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดเสถียร(มอเตอร์เวย์)  
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๑ ส.ค. ๖๔ ..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. ..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี  
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดลีนใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)  
 ชื่อ..... นายนพรัตน์ เคารพไทย ..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี  
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๔๑๑๑๔๓๒ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ  
 ตำแหน่ง..... พชง.๔ ผกส.กฟอ.นช ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๖๔๔๔๖๖๖๒ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวชา ห.ป.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่..... สะพานทองหล่อ ..... ผู้รับผิดชอบ..... แก๊ไฟ นช.๐๒  
 จุดที่ ๒ หน้าวัดเสถียร..... ผู้รับผิดชอบ..... แก๊ไฟ นช.๐๒ ..... จุดที่ ๓ ..... ผู้รับผิดชอบ.....  
 จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... ..... จุดที่ ๕ ..... ผู้รับผิดชอบ.....  
 จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... ..... จุดที่ ๗ ..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๔ ..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวพิชญา หงษ์สิน

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....  
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน  
 วันระดมหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๖ ส.ค. ๖๔ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผ.บ.บ., ผกส.จป. กฟอ.นช.

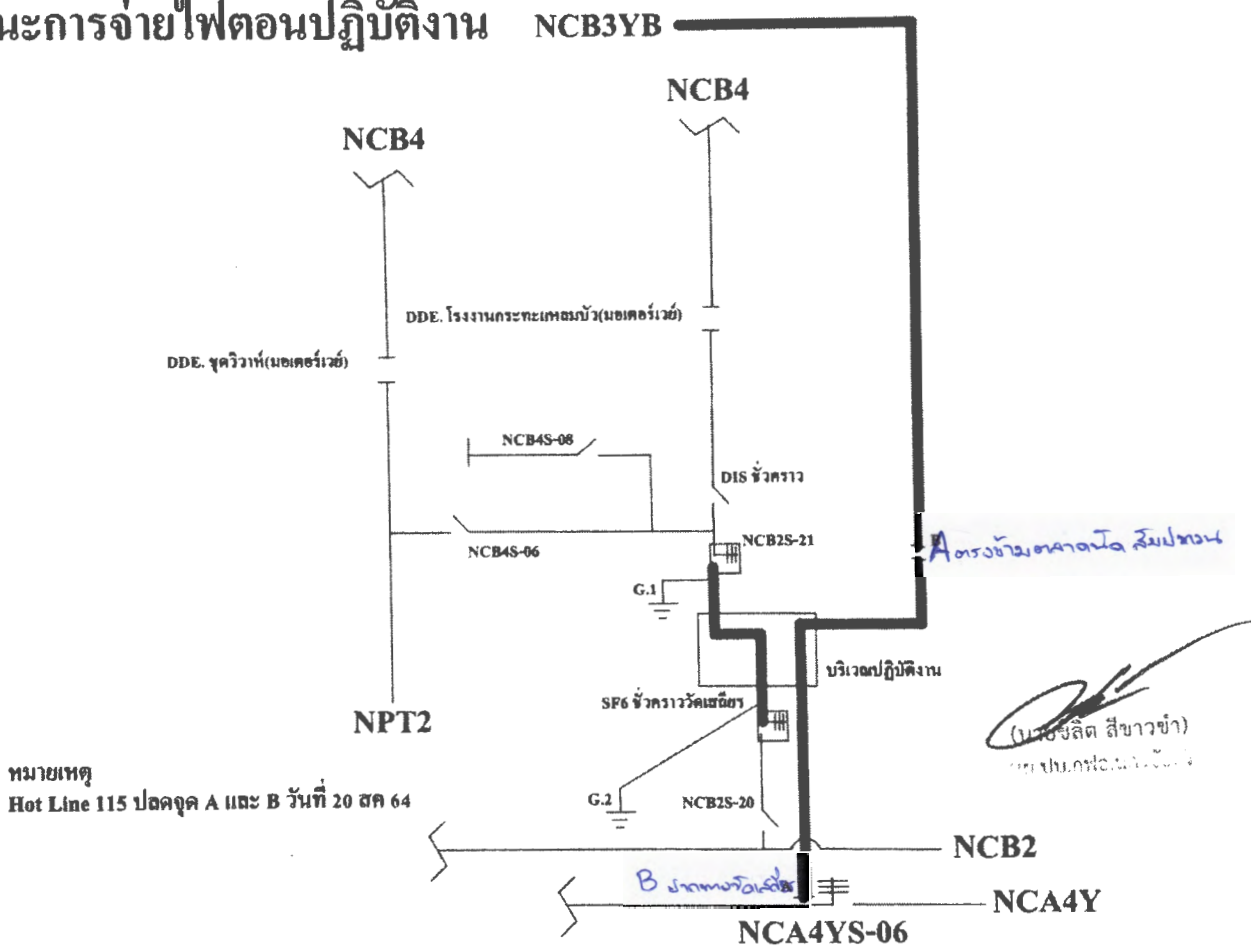
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....  
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๖ ส.ค. ๖๔

C๓ Safety CAP ๐๑

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้  
 ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน  
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้  
 ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง  
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้  
 จ่ายไฟฟ้า



# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน NCB3YB



หมายเหตุ  
Hot Line 115 ปลอดภัย A และ B วันที่ 20 สค 64

(นายชิลิต สีขาวขำ)  
นายช่างเทคนิค

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน NCB3YB

