



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๑๐๖๖ ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA๕YB	๓ กค ๖๕	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	ตัดไฟระบบ๑๑๕เควี ตัดต้นไม้ใกล้แนว สายส่ง(ศาลเจ้าแม่ ไทรทอง)	- DDE (ตรงข้าม บ.อิน โด)	- NCA๕YS-๐๔ - NCA๕YS-๐๔	นายชิต สีขาว ๐๘๑๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชิต สีขาว ตำแหน่ง พล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA5YB จาก DDE ตรงท่าขมิ้นดง

NCA5YS-04
NCA4YS-04

ในวันที่ 3 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1086/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์กร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชิต สีขาว

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
๐๖๑.๖๓๓ ม.อ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

SCAN ส่ง
20 มิ.ย. 2565

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณศาลเจ้าแม่ไทรทอง (NCA5YB) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ก.ค. 65 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 14.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.นช. | งานที่ทำ | ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1086/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์ | วันที่ 27 มิถุนายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ 27 มิถุนายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 27 มิถุนายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช
2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต
3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย 3 ไปรับไฟจากสถานีฯ สามพราน 1						
8	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ อ้อมน้อย 3 รหัส ONC01YS-01, ONC01YS-03 ให้สับอยู่						
9	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ควบคุมแรงดันที่สถานีฯ นครชัยศรี 1 (กฟผ.) ที่ 119 เควี						
12	ตรวจสอบ NCA01YB-01, NCA05YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop						
13	NCA05YS-04	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		นช.	Z	ที่ดินนครชัยศรี
14	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
15	แจ้ง Hotline 115 เควี ตัดเขตบริเวณตรงข้าม บ.อินโดรามา						
16	เมื่อ Hotline 115 เควี ตัดเขตบริเวณตรงข้าม บ.อินโดรามา แล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบ LBS หน้าหมู่บ้านเอกราช NCA04YS-04 อยู่ตำแหน่ง "OPEN" พร้อมล็อกกุญแจ						
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้ง กฟอ.นช. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มี Short Ground เนื่องจากดับกัน Induce)						
20	หลังจาก กฟอ.นช. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้ง กฟอ.นช. ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
27	เมื่อ กฟอ.นช. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
28	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้ง Hotline 115 เควี เชื่อมจุดจัมบริเวณตรงข้าม บ.อินโดรามา						
35	เมื่อ Hotline 115 เควี เชื่อมจุดจัมบริเวณตรงข้าม บ.อินโดรามา แล้วเสร็จ						
36	NCA05YS-04	ปลด	สับ, ล้อคกุญแจ		นช.		Z ที่ดินนครชัยศรี
37	ย้ายโหลดสถานีฯ อ้อมน้อย 3 ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
38	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ อ้อมน้อย 3 รหัส ONC04YS-01, ONC04YS-03 ให้สับอยู่						
39	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน... ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕เควี(ศาลเจ้าแม่ไทรทอง)

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน... ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕เควี(ศาลเจ้าแม่ไทรทอง)

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน... ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เริ่มเวลา... ๐๙.๐๐ จ่ายไฟคืนเวลา... ๑๔.๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก... กฟอ.นครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ... นายวนภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก... นายชลิต สีขาวขำ

ตำแหน่ง... ทผ.ปบ. เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ... -

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว... -

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า... นายชลิต สีขาวขำ ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๒)

๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๕ ...พร้อมแผนผัง Switching

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ... นางสาวปัทมา หงษ์สินี

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่... ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานที่ประชุม... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... รจก.(ท) , ผปบ., จป. กฟอ.นช. Hot Line ๑๑๕

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจ้งจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจ้งที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจ้งที่หน้างาน เมื่อวันที่... ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟครั้งนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

บ.น้ำมันพืชไทย

บ.ไทโทเร

NCA5YS-04

ที่ดิน

NCA5Y

บ.อินโดโพลี


#L
NCA4YS-04



(ช.ร. 1)

ผ.ค.บ.บ.ก.พ.อ.นครชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

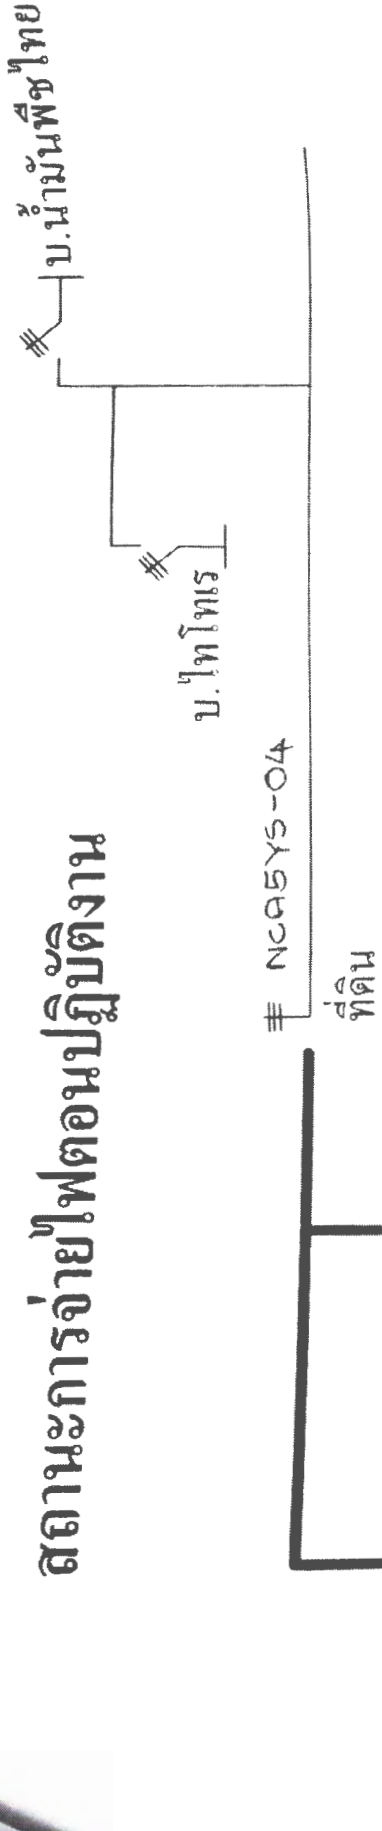

Hot Line 115 เปิดจุดเชื่อมต่อข้าม บ.อินโดโพลี
วันที่ 3 กค. 65 เวลา 09.00น. และเชื่อมเป็นเวลา 14.00น.

≡ L
NCA4YS-04

NCA5Y

จุดปฏิบัติงาน

บ.อินโดโพลี

(Signature)
พ.บ.บ.กฟอ.นครชัยศรี

