



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๖๕๒ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรย์พจน์

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอ ดับไฟ ไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสั่งเซป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA07	20 กรกฎาคม 2566	8.30 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรง สูงบริเวณแยกโรงซักไถ่	DDE แยกโรงซักไถ่	DE	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกโรงซักไถ่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรย์พจน์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA07 จาก DDE แยกโรงซักไถ่ ถึง DE บ่อซักไถ่
ในวันที่ 20 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1096/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วฉมณี ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชัยยศ โพธิ์ริชต์
15 ก.ค. 66

(นาย จีรวรรณ แก้วฉมณี)

๐๙๓.5 ๒๖๓๓ ๒๕.๐๙๙.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. (คฟ.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณแยกโรงซีโก้
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นธ. งานที่ทำ เปลี่ยนสายแรงสูง ติดตั้ง DIS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1096/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กฟพจ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธีมนางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโนช, วรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing		นธ.		R ว่างเย็น
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
4	D/O แยกโรงซีโก้	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		แยกโรงซีโก้
5	แจ้ง Hot Line ทำการตัด DDE แยกโรงซีโก้ (ไม่มีโหลด)						
6	เมื่อ Hot Line ทำการตัด DDE แยกโรงซีโก้แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	ขณะทำการติดตั้ง DIS บ่อซีโก้ ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose NPV04 ไว้ตลอด						
12	BPA07R-01	Nonreclosing	Normal		นธ.		R ว่างเย็น
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
14	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing		นธ.		R ว่างเย็น
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
16	ตรวจสอบหน้างานติดตั้ง DIS แทน D/O แยกโรงซีโก้ สถานะ Open และติดตั้ง DIS บ่อซีโก้ สถานะ Open						
17	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE แยกโรงซีโก้ (ไม่มีโหลด)						
18	เมื่อ Hot Line ทำการเชื่อม DDE แยกโรงซีโก้แล้วเสร็จ						
19	DIS แยกโรงซีโก้	ปลด	สับ		นธ.		DIS
20	BPA07R-01	Nonreclosing	Normal		นธ.		R ว่างเย็น
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

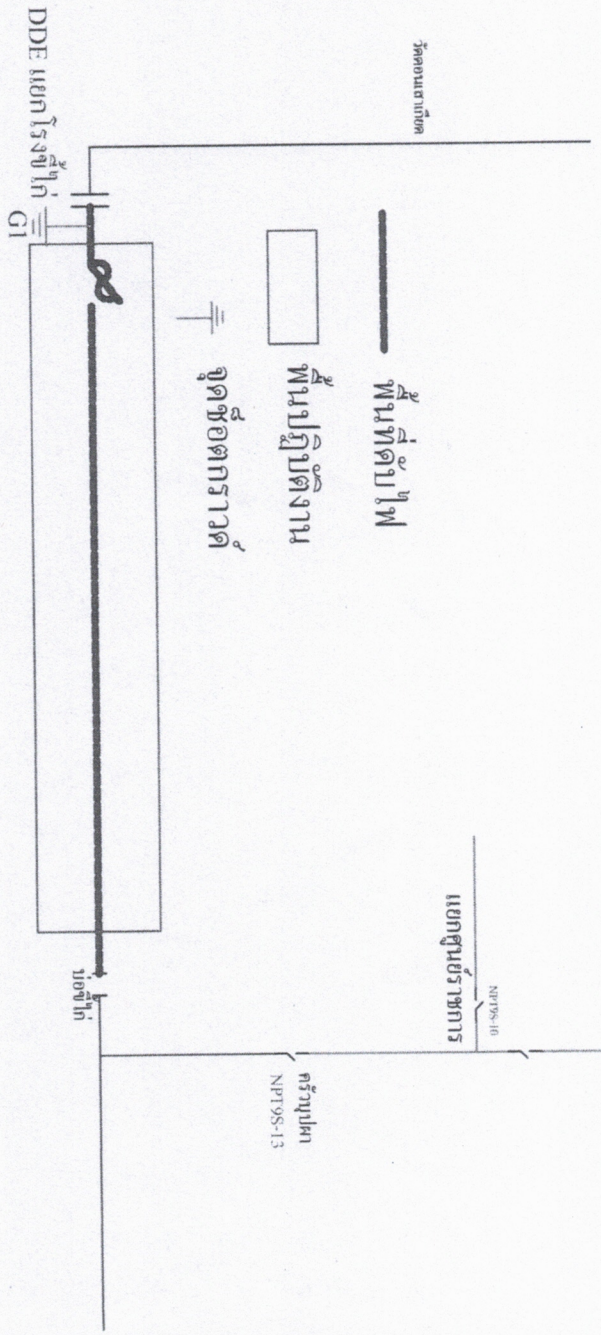

แผนผังหลังจ่ายไฟ

