



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗ วันที่.....๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พทิวราสุวรรณชด ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าหมู่บ้านการเคหะอยู่ฯ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สท.๒	๐๘/๐๘/๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าการเคหะอยู่ฯ	DEEจุดA การเคหะอยู่ฯ	SF๖ชั่วคราว หนองหม้อแกง	โทร.๐๘๑-๕๘๑ ๕๕๑๓ นายธนกฤต พวงคอกไม้
๒	๔ ตจ.	๐๘/๐๘/๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หน้าการเคหะอยู่ฯ	Disสะพานเลี้ยวเมือง DOA๐๔S-๐๒	SF๖ نیمบางจาก DOA๐๔S-๐๓	โทร.๐๘๑-๕๘๑ ๕๕๑๓ นายธนกฤต พวงคอกไม้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง ๑ เครื่อง...หม้อแปลงในระแนงจำหน่ายขนาด ๓๐kVA ๑ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พทช.๕ (สข.) โทร. ๐๙ ๕๕๘๔ ๙๗๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ SPBA จาก DOE A ทบ.ท.เค.อยู่ฯ SP6 ซก. น.แอม.๒๐๒๖
ในวันที่ 18/8/67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1096/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ DOA9 จาก DOA๑๕-๐๒ ถึง DOA๑๕-๐๓
ในวันที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒ น. ถึง ๒ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ รัตกมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอิสรา 100% กฟจ.สพ.

2 ส.ค. 67

(นายพัทธรินทร์ พทิวราสุวรรณชด)

จตค-5 แทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. - กฟ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE เคหะอู่ยา(SPB04) ถึง SF6 ชค.หนองหม้อแกง และ DOA09S-02 ถึง DOA09S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอน ปีกเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1096/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	2 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์ นายวีรวัชร, นายพิชชา, นายวัฒนา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช, วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นายพีรภัทร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
3	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
4	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
5	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
6	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
7	- ย้ายโหลด SPB04 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA04						
8	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
9	SF6ชค.SP04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพ.		SF6 หนองหม้อแกง
10	ตรวจสอบ DOA09S-03 SF6 หน้าบิมน้ำมันบางจากอู่ยาให้อยู่สถานะ"OPEN ล็อกคาน"						
11	- ดับไฟ 08.30น.						
12	DOA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สะพานเลี้ยงเมือง
13	แจ้งกฟจ.สพ.ปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE จุดA SPB04 การเคหะอู่ยา						
14	แจ้งกฟจ.สพ.ตัด DDE จุดA SPB04 การเคหะอู่ยา ออกจากกันทั้งสามเฟส						
15	หลังจากกฟจ.สพ.ตัด DDE จุดA SPB04 การเคหะอู่ยาออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
17	แจ้งให้ กฟจ.สพ. ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด						
18	ทำการ Short ground จุด G1						
19	ทำการ Short ground จุด G2						
20	ทำการ Short ground จุด G3						
21	ทำการ Short ground จุด G4						
22	แจ้ง กฟจ.สพ. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
23	SPB-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
24	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
25	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
26	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
27	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
28	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อ กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
30	ทำการปลด Short ground จุด G1						
31	ทำการปลด Short ground จุด G2						
32	ทำการปลด Short ground จุด G3						
33	ทำการปลด Short ground จุด G4						
34	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
35	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
36	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
37	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
38	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
39	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
40	- จ่ายไฟ						
41	แจ้ง กฟจ.สพ. เชื่อม DDE จุด A SPB04 การเคหะอยู่ยา เข้าทั้งสามเฟส						
42	หลังจาก กฟจ.สพ. เชื่อม DDE จุด A SPB04 การเคหะอยู่ยา เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
43	แจ้ง กฟจ.สพ. จ่ายโหลดกลับคืน						
44	DOA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS สะพานเลียงเมือง
45	- ย้ายโหลด SPB04 บางส่วนกลับจาก DOA04						
46	SF6ชค.SP04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หนองหม้อแกง
47	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
48	SPB-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
49	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
50	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
51	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
52	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
53	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่... ๘ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้าหมู่บ้านการเคหะสุพรรณบุรี (อยู่ยา) เพื่อรื้อถอนและปักเสาแรงสูง โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๔ สถานี สุพรรณบุรี ๒ ตั้งแต่บริเวณ DEE จุดA การเคหะอยู่ยา ถึง SF๖ชั่วคราวหนองหม้อแกง
ฟีดเดอร์ ๔ สถานี ดอนเจดีย์ ตั้งแต่บริเวณ Disสะพานเลี้ยวเมืองDOA๐๔-๐๒ ถึง SF๖บ้มนางจาก(DOA๐๔S-๐๓)

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนกฤต พวงคอกไม้ ชม.ผกส.กฟจ.สพ โทร ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๑๓ เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายวรพล สุทธิโร ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ โทร ๐๔ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

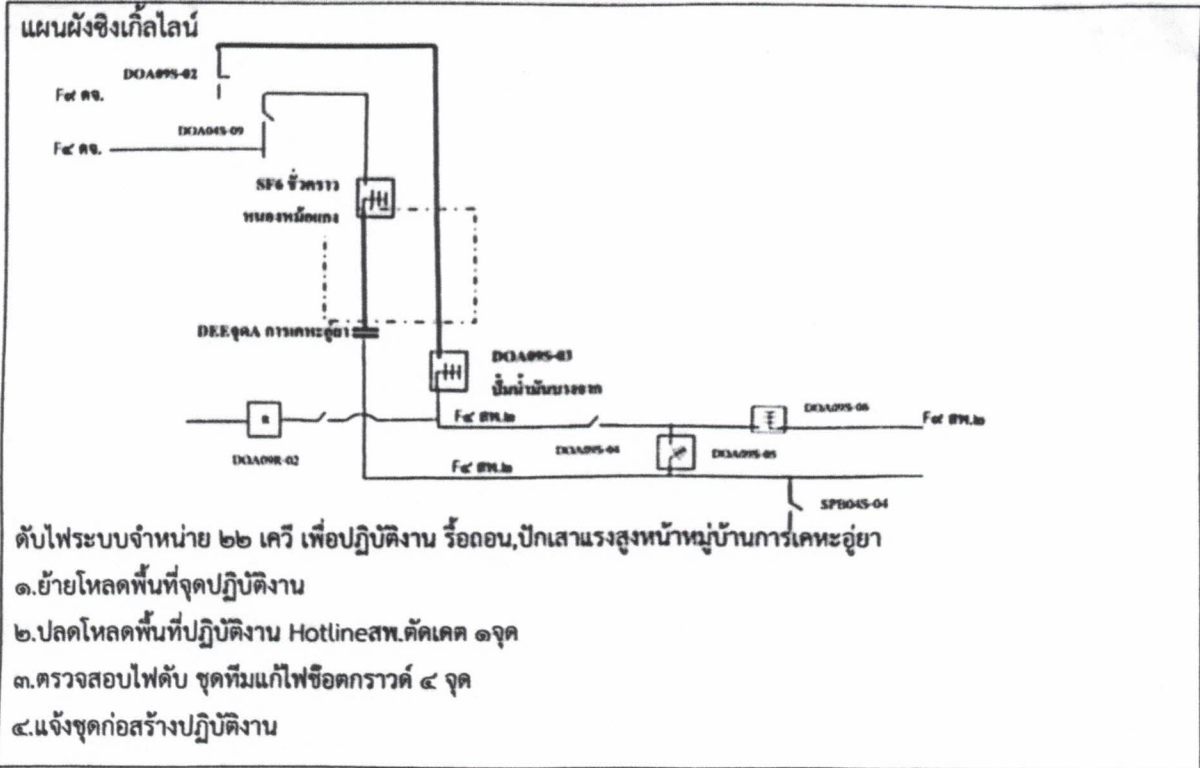

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พชง.๕(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
