



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ก.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๑.พทท. - ๕๐๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวิสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๑ สค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ UG ๑๑๕ และ พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟลี	UTG09S-04	จุดเปิด DDE	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๙๕-๓๑๖๒๐๑๙

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UTG09 จาก UTG09S-04 ถึง จุดเปิด DDE
ในวันที่ 1 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1097/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ


(นายศิริชัย วัฒนวิภา)
อสค.5 โทร ๒๕-คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.ฉก., กฟล.นคจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกไฟสี (UTG-09)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ส.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ UG115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1097/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	31 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภักษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ลช.	scoda	R ตะลึงเหนือ
7	ตรวจสอบ SF6 UTG05S-08 ดึงข้ามถนนแยกไฟสี สถานะ Open+Lock						
8	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG05						
9	SW Bypass	ปลด	สับ		ลช.		R ตะลึงเหนือ
10	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลช.		R ตะลึงเหนือ
11	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลช.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรืองคว้าวีสต
13	UTG09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี
14	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก SF6 UTG09S-04 แยกไฟสี ถึง จุดตัด DDE						
17	เมื่อหน่วยงานไลน์โหลดจาก SF6 UTG09S-04 แยกไฟสี ถึง จุดตัด DDE แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง Hotline ตัด DDE ได้ (ใช้ Hotline 622511)						
19	เมื่อ Hotline ตัด DDE แล้วเสร็จ						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
25	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
26	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
28	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		หกจ.		R สระลงเรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
29	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
31	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
32	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
33	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		หกจ.		R สระลงเรือ
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
36	แจ้ง Hotline เชื่อม DDE ตามผังได้						
37	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE ตามผังแล้วเสร็จ						
38	ย้ายโหลด UTG0๙ บางส่วนกลับจาก UTG0 ๕						
39	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
40	UTG09S-04	ปลด	สับ		หกจ.		SF6 แยกไฟสี่
41	UTG05S-13	สับ	ปลด		ลข.		DIS หน้าร้านจรงรุ่งเรื่องค้ำวัสดุ
42	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
43	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลข.		R ตะลุงเหนือ
44	SW Bypass	สับ	ปลด		ลข.		R ตะลุงเหนือ
45	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
46	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
47	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
48	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		หกจ.		R สระลงเรือ
49	UTG09R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ลข.	๕๐๐๑๓	R ตะลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

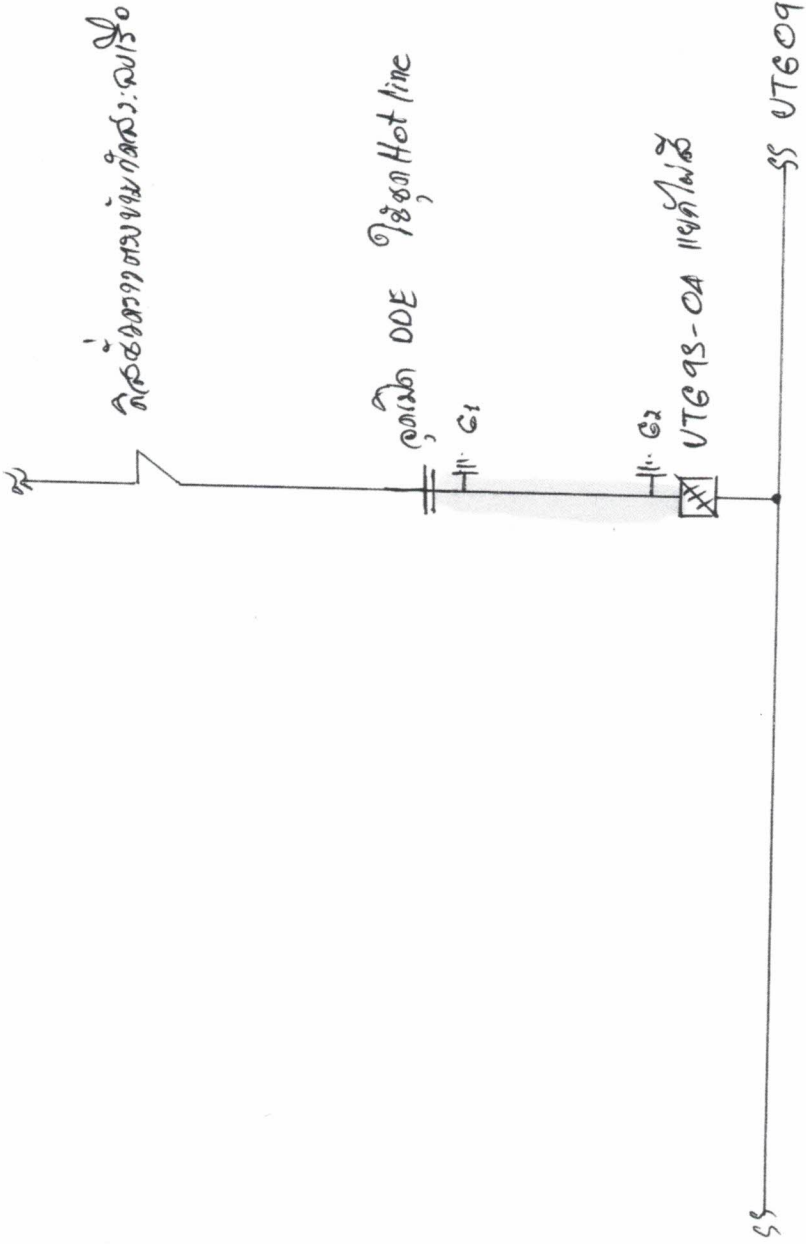

114 ตัวใหม่
 114 ตัวใหม่

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
 ชน.ก.ป.พ.ส.อ.พ.ท.น.
