



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๐๕ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒ ส.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ UG ๑๑๕ และ พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟสี่	SF6 แยกไฟสี่	UTG05R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(..... นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก SF6 ๑๑.๕/๑๑.๕ ถึง UTG05 R-01
ในวันที่ 2 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1098/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ไพฑูริย์ ศรีเมือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

.....
(..... นาย ไพฑูริย์ ศรีเมือง)
จ.ต.ท. 5 บกท. ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สง., กฟส.ทกจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น


ผจพ. — (สถานี.....—)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....— น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไผ่สี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ 115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1098/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรุวัชร เสมามิ่ง			วันที่	31 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรุวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS ฐานจรั้งเรื่องค้ำวัสดุ
9	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
10	UTG05R-01	สับ	ปลด		หจก.		R สระลงเรือ
11	SW.load UTG05R-01	สับ	ปลด		UTG		DIS สระลงเรือ
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	SF6 ชุด UTG05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หจก.		SF6 แยกไผ่สี
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching แรก							
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
24	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
25	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 ออก						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 ออก						
28	จ่ายไฟ						
29	SF6 ชุด UTG05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจก.		SF6 แยกไฟสี่
30	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09						
31	SW.load UTG05R-01	ปลด	สับ		UTG		DIS สระลงเร็ว
32	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		หจก.		R สระลงเร็ว
33	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนนานบัส
34	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS ฐานจรุงเรื่องค้ำวัสดุ
35	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนนานบัส
36	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเร็ว
สิ้นสุด Switching							

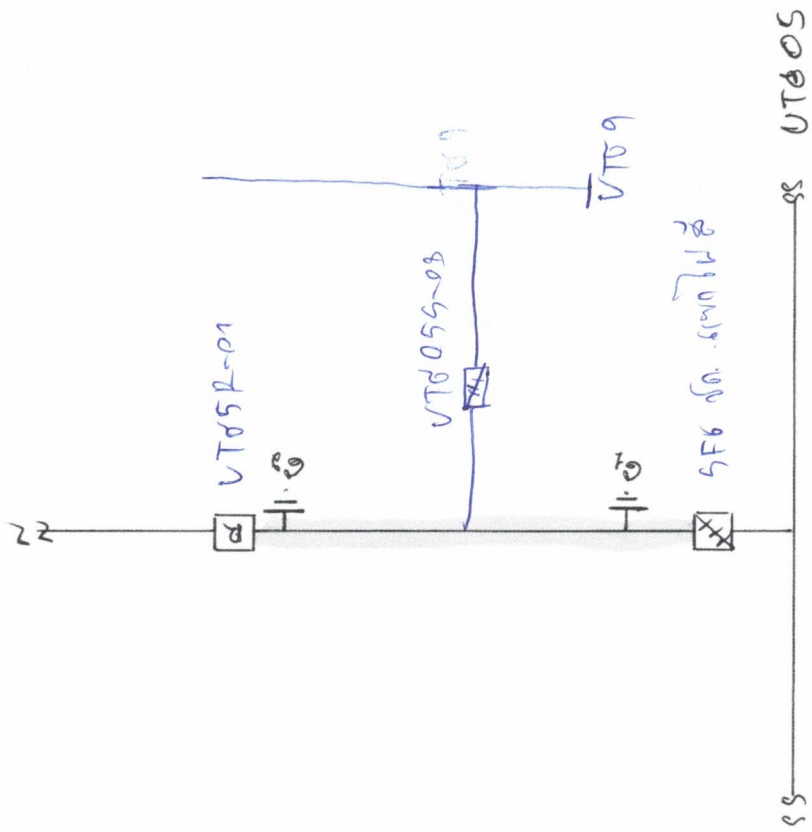

සිසුවාගේ

Signature
