



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

07/08/67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๐๖๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิรัฐวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานโซ นนบเนื่อ

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.น.ม.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓ (ถาวร)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง ๑๑๕ เควี	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้าบึง ปท. ปากซอยกวิวิทีย์	- SAC04YB-01	- OYM01YB-01 - PMB05YB-01	นายมานพ สารณูจิตร ๐๖๓-๙๔๕๕๕๕๑๑
๒	SAC๐๒	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว โดยตัดสคัส เวอร์รี่	- SAC2S-05 - SAC2S-04	
๓	SAC๐๗	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SAC7S-04	- SAC7S-02 - SAC7S-02 - SAC7S-03 - PMB1S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เเบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานโซ นนบเนื่อ...)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.น.ม.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 เที จาก SAC4YB-01 ถึง OYM1YB-01, PMB5YB-01
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1103/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAC2 จาก NS.๓.๓.๓.๓.๓ ถึง SAC2S-05, SAC2S-04
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAC7 จาก SAC7S-04 ถึง SAC7S-02, SAC7S-03, PMB1S-04
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทอจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟส.ปทุมธานี และ กฟส.ปทุมธานี

(นายมานโซ นนบเนื่อ...)
๑๙.๕ พทท. นนบเนื่อ

ผ่านรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟลพ.พท.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสริขซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าป้อม ปตท.ปากซอยกวินทิพย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1103/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 7 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายฉัตรินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
6	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
7	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน และ SAC07 บางส่วนไปรับไฟจาก PMB10						
10	PMB10S-16	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามศักดิ์ศรีเจม่อน
11	PMB10S-13	ปลด	สับ		พทท.		DIS หน้าโรงแรมอินเลิฟ
12	SAC02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ปากทางกวินทิพย์
13	SAC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
14	ให้ตรวจสอบสถานะ CLOSE LOOP NCA1YB-01 และ NCA5YB-01 ให้อยู่สถานะ CLOSE LOOP อยู่						
15	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
17	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
18	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ใบมีด 115 เควี
20	OYM01YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ใบมีด 115 เควี
21	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
22	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
23	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 SAC2S-04(ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา) , PMB1S-04(ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา) ให้อยู่สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
24	ให้ตรวจสอบสถานะ DIS SAC7S-03(หน้าถนนระเคน) ปลดทั้งสามเฟส						
25	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน 08.00 น.						
26	SAC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ก่อนยูเทิร์นหอมเกร็ด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ชั่วคราวโดยตัดาดีสคัพเวอร์
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
29	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
30	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
31	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
32	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
33	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
34	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
35	แจ้ง กฟส.พทท. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7						
36	แจ้งให้ กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
37	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
38	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
39	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
40	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
41	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลในWeSafe เรียบร้อยแล้วทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
42	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
43	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
44	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
45	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
46	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
47	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
48	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G1						
49	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G2						
50	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G3						
51	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G4						
52	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G5						
53	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G6						
54	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลด Short ground จุด G7						
55	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลWeSafeหลังปฏิบัติงาน						
56	SAC07S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS ก่อนยูเทิร์นหอมเกร็ด
57	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC2	ปลด	สับ		พทท.		DIS ชั่วคราวโดยตัดาดีสคัพเวอร์
58	ย้ายโหด SAC02 บางส่วน และ SAC07 บางส่วนกลับคืนจาก PMB10						
59	SAC07S-02	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
60	SAC02S-05	ปลด	สับ		พทท.		DIS ปากทางกวินทิพย์
61	PMB10S-13	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พทท.		DIS หน้าโรงแรมอินเลิฟ
62	PMB10S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรีเจม่อน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	ทำการ CLOSE LOOP NCA1YB-01 และ NCA5YB-01 กลับสภาพปกติ						
64	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
65	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
66	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
67	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
68	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
70	OYM01YS-03	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
71	OYM01YB-01	ปลด	สับ		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
73	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
74	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
75	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
76	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
77	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


แผนผัง หลังดับไฟ บป.ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ ปากซอยกวินทิพย์
 ** วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. **

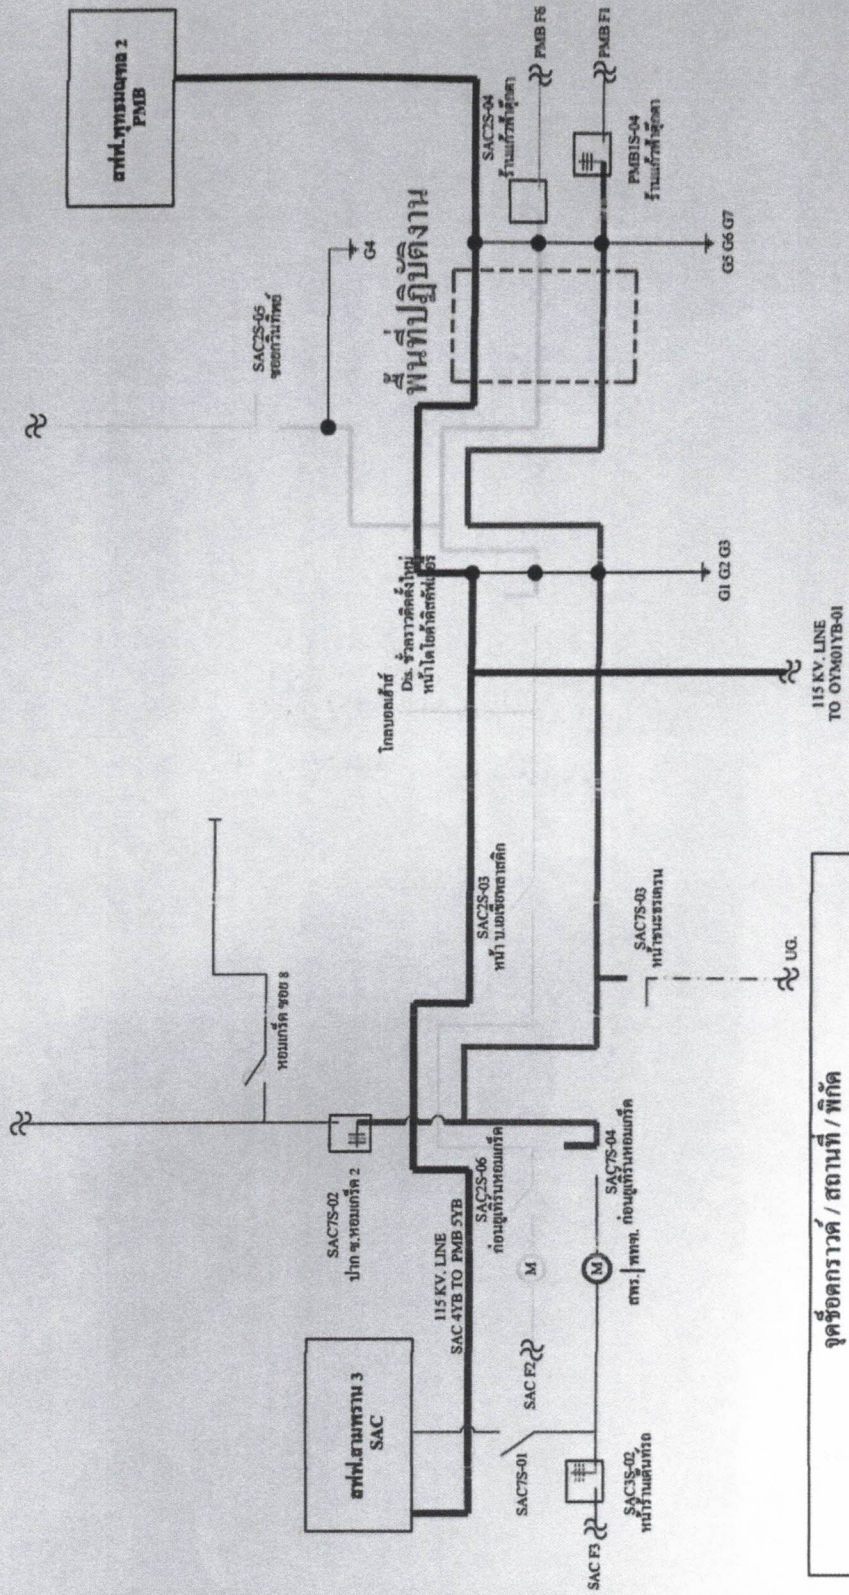

** สายส่ง 115 เควี ชีตกราวด์ เฟส C **

จุดช็อดกราวด์ / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2 G3	หน้า บ. โด โคได้ลิตส์ฟาว์รี 13.7856078,100.2661055
G4	ปากซอยกวินทิพย์ 13.7866463,100.269138
G4 G5 G6	หน้าบ้มีม ปตท. 13.7857552,100.2700852

แผนผัง ก่อนดับไฟ ป.ป.ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ ปากซอยกวินทิพย์
 ** วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. **

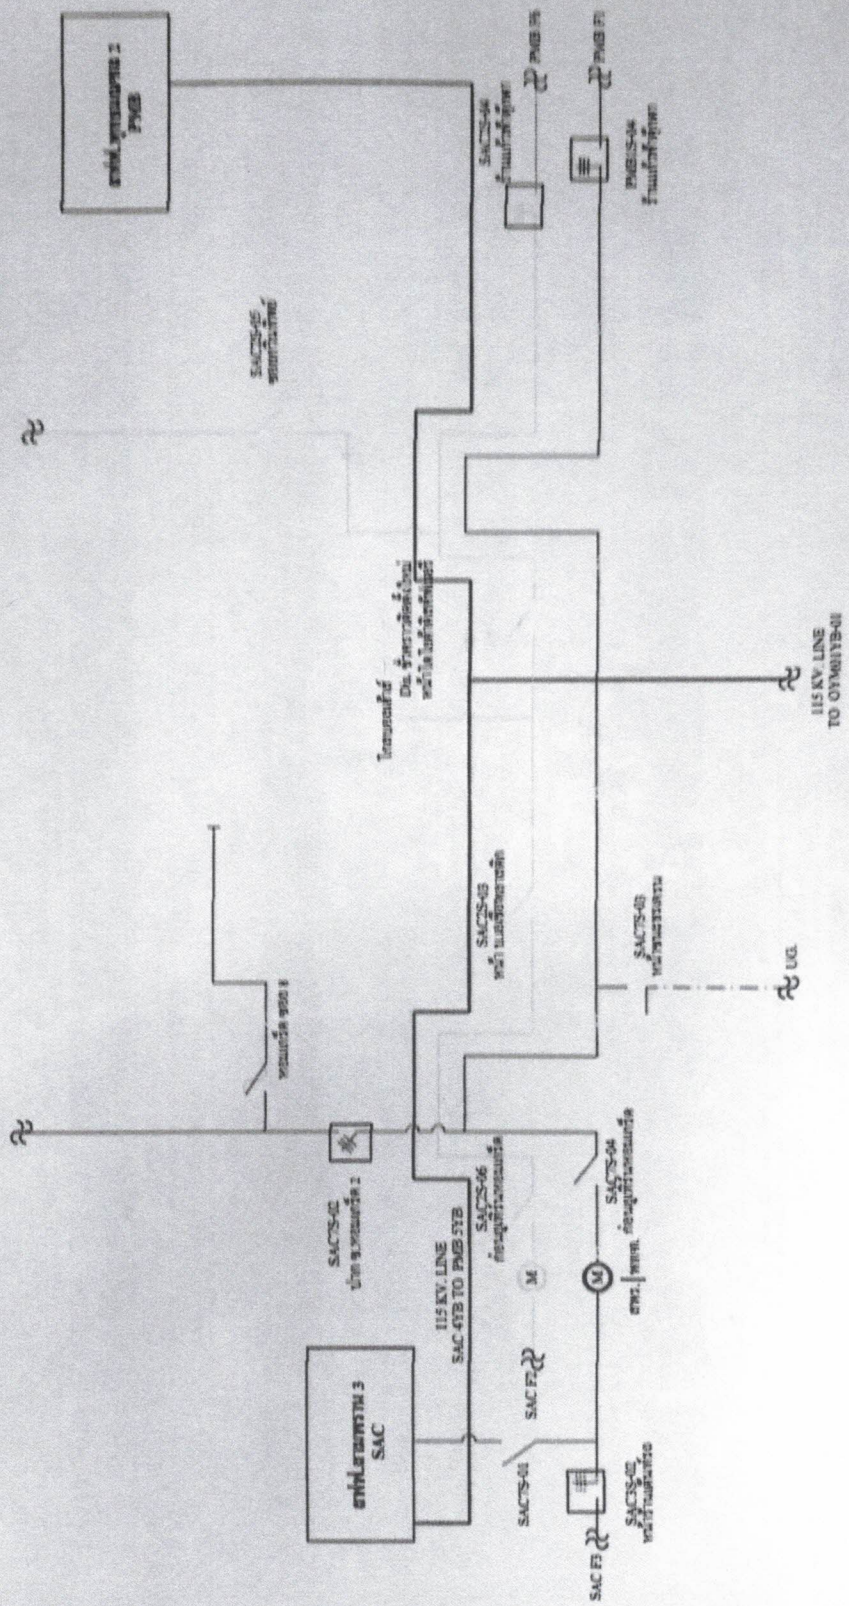



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล


วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า งานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณทางกลับรถใต้ถนนบรมราชชนนี (กม.ที่๒๒+๐๕๙) ช่วงปากทางลอด ถึง หน้าป้อม ปตท. ตำบลทรงคนอง งานที่ปฏิบัติคือ เปลี่ยนสายเคเบิลอากาศ ๒๒kv ขนาด ๑๘๕ Sq.mm. พร้อมปรับปรุงหัวเสา(ทั้ง ๒ วงจร) ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยจะต้อง ดำเนินการ ดับ/จ่าย กระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผกส. ได้มอบหมายให้ นายมานพ สำราญจิตร พงษ.๗ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๔๕ ๕๕๑๑ เป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย มังคิลป์)

ผ.ก.ส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป



(นายจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

ปฏิบัติงานแทน ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้าง ๑๕๙๕๐

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ทางลวดกลับรถใต้ถนนบรมราชชนนี.....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...หน้าบีม ปตท. ปากทางกวิทียี่ ริมนถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า)
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา...๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา...๑๗.๐๐ น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสันใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ... นายจรเดช นิยมศิริ
 ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟส.พุทธมณฑล เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายมานพ..สำราญจิตร.....
 ตำแหน่ง..... พงจ.๗. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๓-๔๔๕๕๕๑๑.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
 ชุดก่อสร้าง , ชุดซ่อมย่อย กฟส.พุทธมณฑล

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ ..นายปราโมทย์ เญญจทรัพย์.....ตำแหน่ง..... ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๔๐-๔๖๒๔๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7ผู้รับผิดชอบ..... ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.
 จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๒๙/๒๕๖๗ , ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จตุวรรณ ตูนาโป่ง (จป.๖) ๖ กฟส.พุทธมณฑล


๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน.....๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ผ.กส. , ผ.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.๖ , พงจ.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
 จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

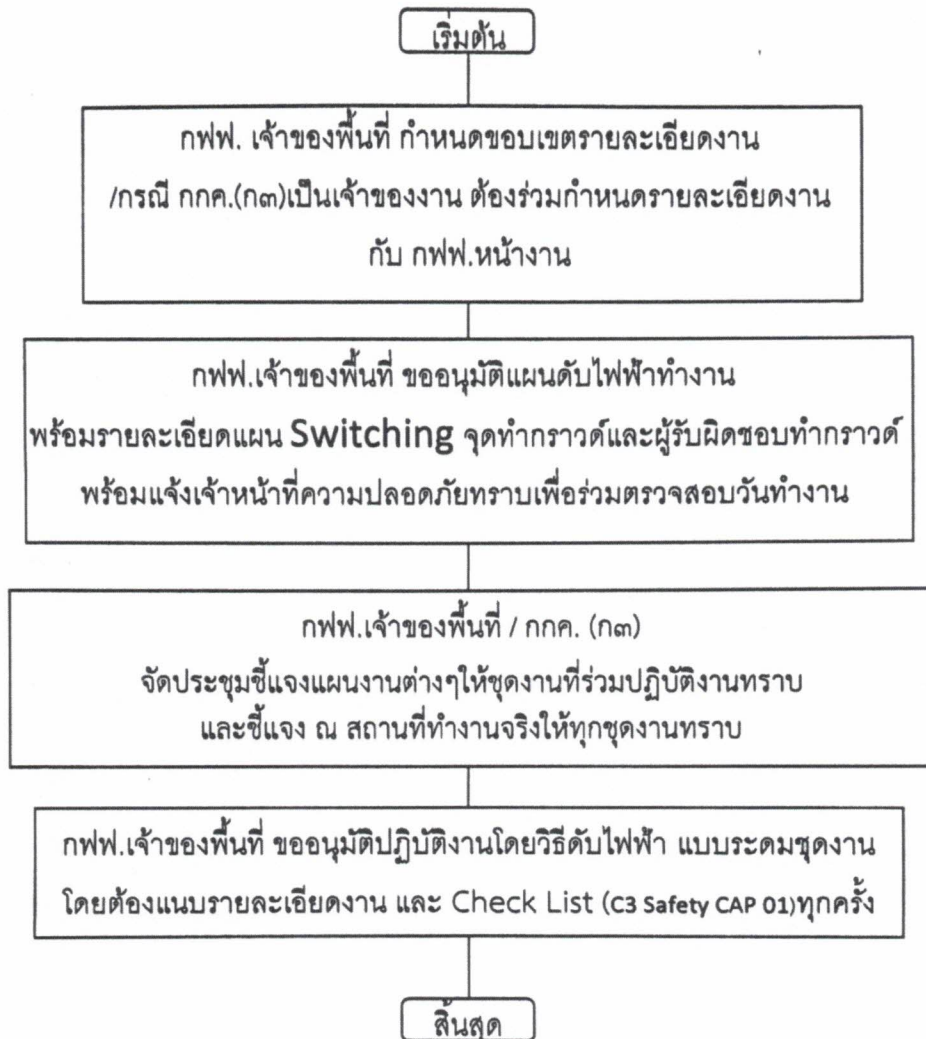



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๒๙/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ริมถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) หน้าบีม ปตท. ปากซอยกวิวิทีย์ ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนสายเคเบิลอากาศและอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระยะทางรวมประมาณ ๓๐๐ เมตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบนญถร์พย์)

ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช แนนเนื่อง)

ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๙๕๕
