



Switching Deadline
07/08/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๐๔๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายเทอดนันท์ พิชิตราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเมือง

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓ (ถาวร)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAC๐๗	๑๓ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี บริเวณ วงเวียนหอมเกร็ด - สดโคน - หอมเกร็ดซอย ๘ , ๑๒	- SAC07S-04	- SAC07S-0๕	นายกคศิริพงษ์ แก้วเรือง ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... หอมเกร็ดซอย ๘ , ๙ , ๑๒ , วัดมณเฑียรวิสัย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลญจทรัพย์ ตำแหน่ง ข.ผ.บ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนนเมือง...)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAC๐๗ จาก ถึง
ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1104/67
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวุฒ ๒ แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เบลญจทรัพย์
2 ส.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. พทท.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นาย จิรวุฒ ๒ แก้วสมนึก)
พิด. 5 ๖ แทน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วงเวียนหอมเกร็ด - ปากซอยหอมเกร็ด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส. พิชยา 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 4.3 MW
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
5	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
6	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
7	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	LOAD = 4.5 MW
8	- ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB10						
9	PMBBV-01	ปลด	สับ		PMB		ขนานบัส
10	PMB01S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6
11	PMB10S-16	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6
12	SAC07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS
13	PMB01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.	SCADA	SF6
14	PMBBV-01	สับ	ปลด		PMB		ขนานบัส
15	พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
16	SAC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS
17	ปลด D/O หม้อแปลงผู้ใช้ไฟในหอมเกร็ด ซอย 8 จำนวน 2 ราย						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้ง Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ทำการ Short Ground จุด G1,G2,G3						
20	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
21	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
22	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
23	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	
24	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
25	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
26	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
27	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
28	เมื่อหน้างานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
30	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
31	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
32	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
33	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
34	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
35	หน้างานปลด Short Ground จุด G1,G2,G3						
36	SAC07S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS ก่อนยูเทิร์นหอมเกล็ด
37	- ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนกลับจาก PMB10						
38	PMBBV-01	ปลด	สับ		PMB		ขนานบัส
39	PMB01S-04	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 รั้นแก้วฟ้าตุ๊กตา (ล่าง)
40	SAC07S-06	ปลด	สับ		พทท.		DIS ปากขอยมหาสวัสดิ์
41	PMB10S-16	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 คักดีศรีเจมอน
42	PMB01S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 รั้นแก้วฟ้าตุ๊กตา (ล่าง)
43	PMBBV-01	สับ	ปลด		PMB		ขนานบัส
44	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
45	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
46	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
47	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
48	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
49	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง หลังดับไฟ ป.ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ วงเวียนหอมเกร็ด - ปากซอยหอมเกร็ด 12
 ** วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. **

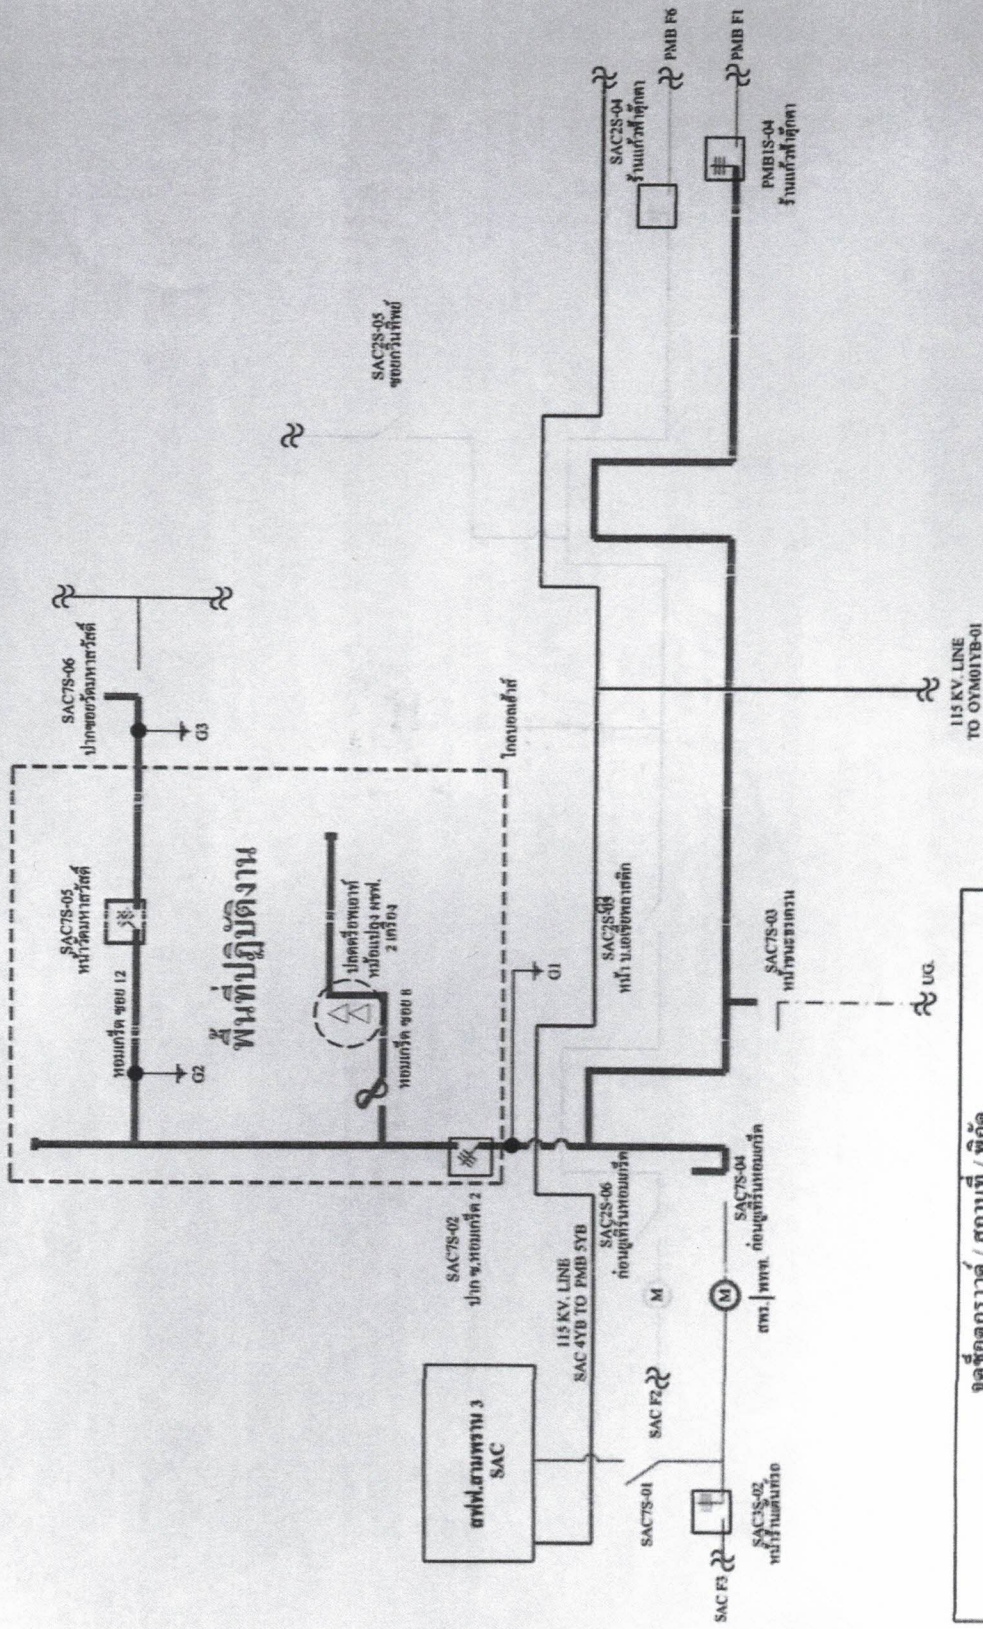

จุดเชื่อมต่อกราวด์ / สถานี / พิกัด	
G1	เบดเคสหม้อแปลง VT SF6 SAC07S-02 13.7845931,100.2470933
G2	เบดเคสหม้อแปลง TR PEA.63-005206 13.7924705,100.2401199
G3	เบดเคสหม้อแปลงบ้านแก้วผู้ดง 13.8050167,100.2492448

แผนผัง ก่อนดับไฟ ป.ป.ระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณ วงเวียนหนองเมGRID - ปากซอยหนองเมGRID 12
 ** วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. **

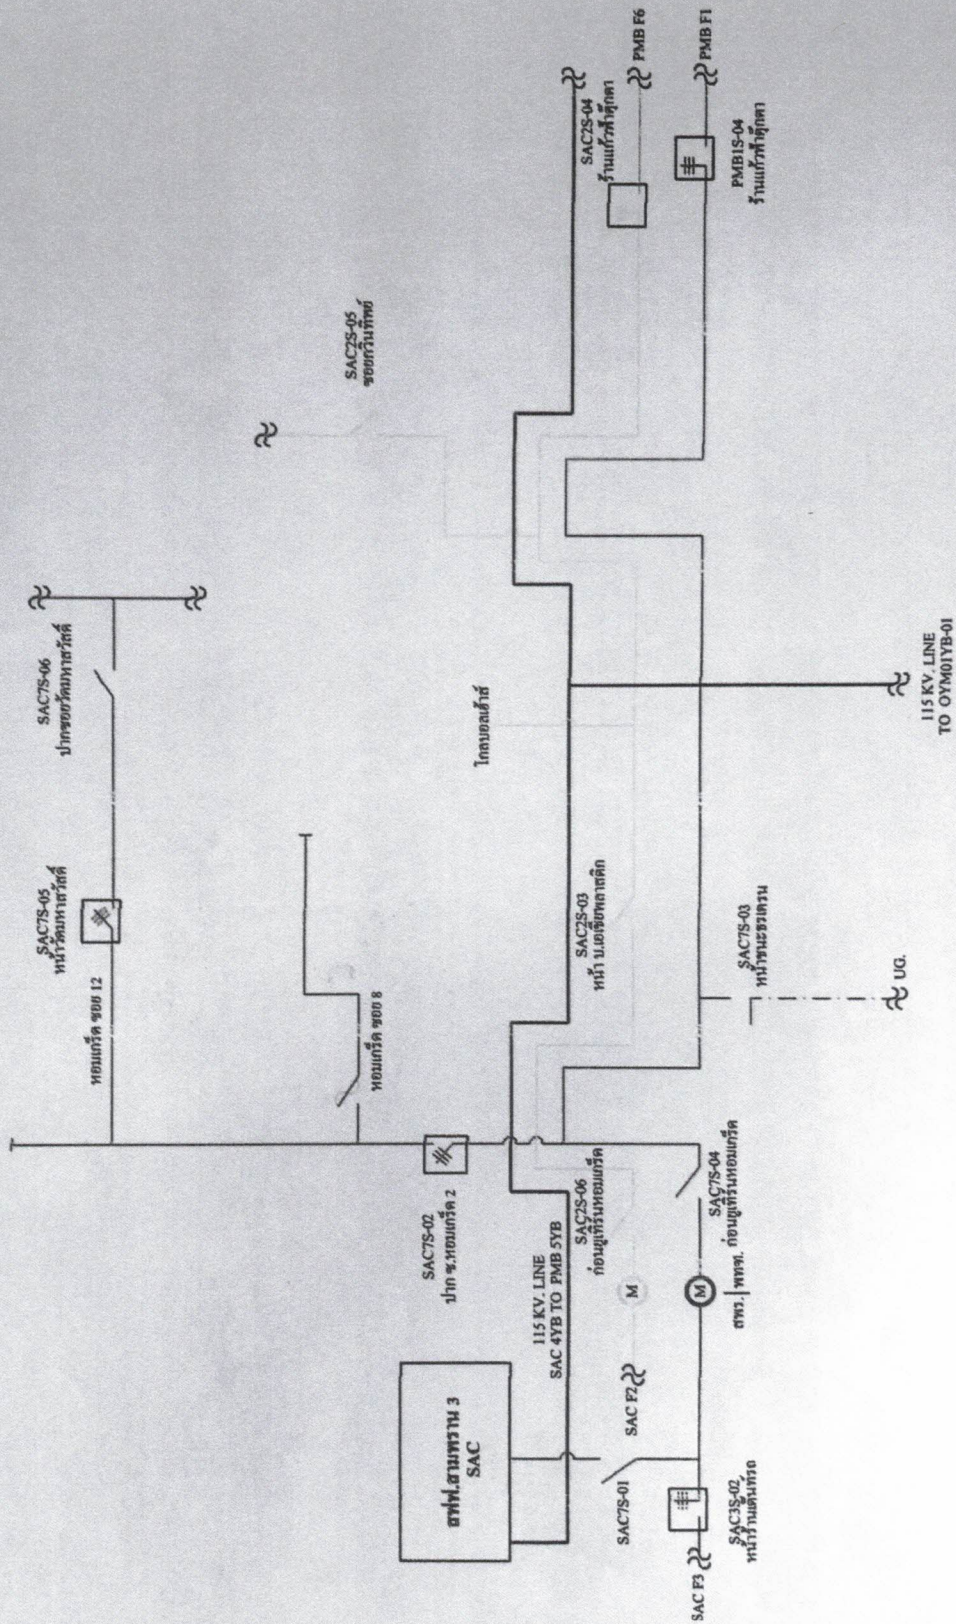



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน MV-SAC๗S-๐๒-ปป. CTB-CCB จากวงเวียนหอมเกร็ด - สูดโลน และ MV-NCA๐๓F-๑๐-ปป. CTB-CCB หอมเกร็ดซอย ๘ ม.๒ ตำบลหอมเกร็ด งานที่ปฏิบัติคือ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์หัวเสา จาก CTB เป็น CCB เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนบ)


ทั้งนี้ ผกส.กฟอ.พทุมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พชง.๕ ผกส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๕ ๖๖๕๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย มังคิลป)
ผ.กส.กฟส.พทุมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป


(นายจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) (ระดับ ๑๐) รช.ขจก.(ท) (ระดับ ๙)

ปฏิบัติงานแทน ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทุมณฑล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ (WBS WBS MV-SAC๐๓5-๐๒-ป.ุ.CTB-CCB จากวงเวียนหอมเกร็ด-สุดไลน์ และ WBS MV-NCA๐๓F-๓๐-ป.ุ.CTB-CCB หอมเกร็ดซอย ผ.)

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน... ซอยหอมเกร็ด ๒ - สุดไลน์ - หอมเกร็ด ซอย ๘ ,หอมเกร็ด ซอย ๑๒

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา...๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา...๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ

ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายกิตติพงษ์...แก้วเรือง.....

ตำแหน่ง..... พชง.๕. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว

ตัวแทนผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง..... ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3ผู้รับผิดชอบ.....ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.

จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๗พร้อมแผนผัง Switching

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก ผกส.กฟส.พทท. ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๗.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๒๕/๒๕๖๗ , ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.สุทวารรณ ตูนาโป่ง (จป.ว) ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๕๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมวันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผ.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง , ผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ


๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)

จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

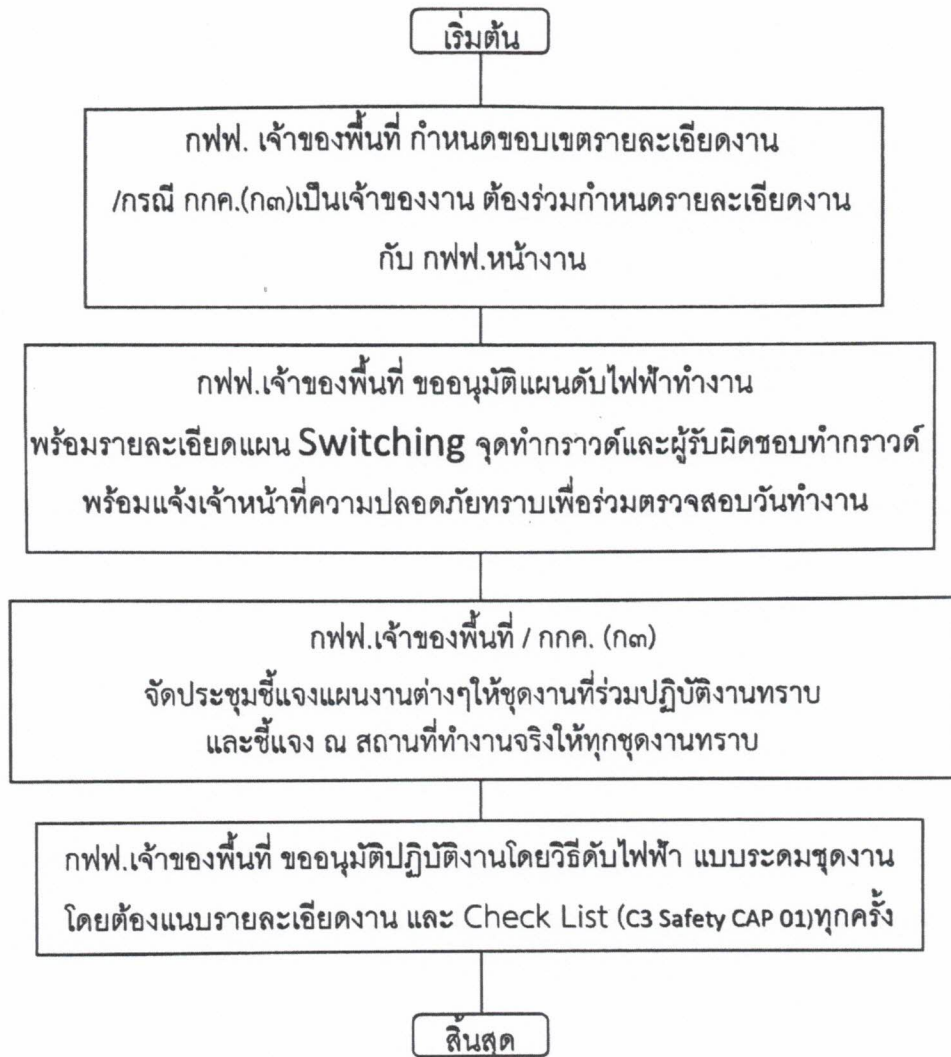



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟส.พทุมณฑล

ถึง ผ.จก.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๑๒๕ /๒๕๖๗


วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผ.จก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พทุมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี WBS MV-SAC๐๗S-๐๒-ปป. CTB-CCB จากวงเวียนหอมเกร็ด-สุดไล่น์ และ WBS MV-NCA๐๓F-๑๐-ปป. CTB-CCB หอมเกร็ดซอย ๘ ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระยะทางรวมประมาณ ๑.๐๐๐ วงจร-กม. โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พทุมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบลุจทรัพย์)
ช.ผ.บ.กฟส.พทุมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ



(นายมานิช นวนเนื่อง)
ผ.จก. (ระดับ ๑๑) รช.ผ.จก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พทุมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕
