



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปป.) ๖๑๓ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV ๐๒	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๓.๐๐	-	ปักเสาเข็มไลน์ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล นครปฐม (งบ ผขพ.)	NPV๒S-๑๐ หน้าเซ็นทรัล	NPV๒S-๑๑ หน้าเซ็นทรัล (ลูปไลน์) ถึง NPV๒S-๐๔ แยกสิรินทร ถึง NPV๒S-๑๒ ข้างร้านพีพีโพน	นายมนตรี รังน้อย
๒	๑๑๕ เควี	ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบ 22 เควี วงจร NPV07, วงจร NPW03						
๓	NPV ๐๗	ไฟไม่ดับปฏิบัติงานโดยขอทไลน์นครปฐม ทำการครอบการ์ดและ ขอศูนย์ตั้งตำแหน่ง Manual ทั้ง 3 วงจร						
๔	NPW ๐๓							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ห้างเซ็นทรัลนครปฐม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รังน้อย ตำแหน่ง ขผ.ปป.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๗๓๑๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๐๖๔๙๒๒ Long. ๑๐๐.๐๔๘๗๑๑๙  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๐๖๐๖๓๙ Long. ๑๐๐.๐๔๗๑๓๐๘

*(Signature)*

( นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ )

ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

NPV29-04

NPV29-12

NPV29-17

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV02 จาก NPV29-10 ถึง NPV29-17  
ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 27.00 น. ถึง 06.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1109/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวัชร ไชยมาธิ์ ประสานงานการขอดับไฟดับ  
2 ธ.ค. 67

for info  
( กบ.จก กบ.สฟ.นท )  
ศก.6 ปฏิบัติแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓), อก.วว. (ก.๓) ผจก. กฟภ.นจ

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เซ็นทรัลนครปฐม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 สค. 67	เวลา	23.00 น.	ถึง	06.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นฐ.	งานที่ทำ	ปักเสาสวมไลน์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1109/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	3 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 NPV02S-11 SF6 หน้าเซ็นทรัลนครปฐม อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
3	ตรวจสอบ SF6 NPV02S-12 SF6 ข้างร้านพีทีโพน อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
4	ตรวจสอบ SF6 NPV02S-04 SF6 แยกสิรินธร อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน						
5	BPC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC	ต.1	CB
6	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
7	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
8	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
9	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	NPV02S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าเซ็นทรัล
12	ปฏิบัติงานปักเสาสวมไลน์โดยชุด HOT LINE						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
14	แจ้งไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	คงManual BPC01YB-01 ,NPV04YB-01 NPV07 ,NPW03						
17	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
19	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	NPV02S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 หน้าเซ็นทรัล
22	BPC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC	ต.1	CB
23	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB
24	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB
25	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

115 KV

หน้าเซ็นทรัล



NPV 7S-04

NPV 07

ข้างร้านพิศิพิน

NPW05

NPV 2S-12



NPV 02

หน้าเซ็นทรัล

NPV 2S-10

หน้าเซ็นทรัล (คูปัด)

NPV 2S-11

แยกลิ้นทาร์




NPV 2S-04

ร้านอเมซอน

NPV 2S-05

สแยกไฟแดงศูนย์กีฬา

NPW3S-02

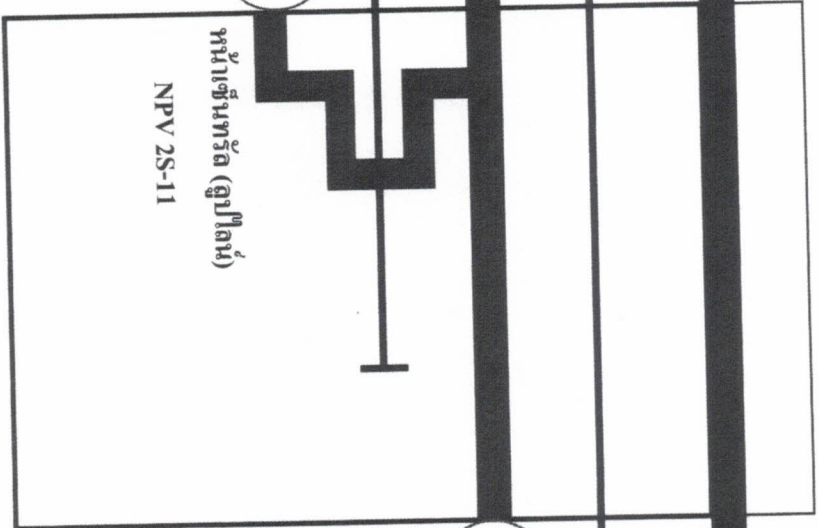

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช็อคกราวด์



แผนงานดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปกติตามแผนฉุกเฉินหน้าห้องเซ็นทรัลปฐม

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ( เวลา 23.00 น.)

ผู้รับผิดชอบการวาด ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบ 22 เควี วงจร NPV07, วงจร NPW03

ไฟไม่ดับปฏิบัติงาน โดยขอทูลเกล้าฯ กราบ ขออนุญาตและ ขอศูนย์ตั้งตำแหน่ง Manual

ทง 3 วงจร
