



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นข.(ปบ.) ๑๓๑๕ ๓๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

Switching Deadline

วันที่ 1 ก.ย. 64

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB2	๕ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงย้ายแนวระบบ จำหน่ายซอยวัดเสถียร (งานมอเตอร์เวย์)	-Dis ชั่วคราว โรงเต่าหู้	-SF6 ชั่วคราว หน้าวัดเสถียร	อภิวัฒน์ เกิดเดโช ๐๖๕๒๕๐๕๐๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนซอยวัดเสถียร(ซอยโรงแก้วสามพราน-ชุมชนหน้าวัดเสถียร)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวขำ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ + พิดเตอร์ NCB2 จาก Dis.๑๓.โรงเต่าหู้ ถึง SF6.วัดเสถียร

ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1114 /6A

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๔/๕๕ ๑๔๖๖๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ผ.ชลิต สีขาวขำ

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. นข.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 3 แผน

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ NCB02 บริเวณDIS.ชค.โรงเต้าหู้ ถึง SF6ชค.หน้าวัดเสถียร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1114/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 26 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
4	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
5	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
6	NPT02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		RE
7	- ย้ายโหลด NCB02 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT02						
8	NCB02S-18	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ(บน)
9	NCB04S-06	ปลด	สับ		นช.		DIS สระน้ำหวาน
10	SF6 ชค.NCB02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หน้าวัดเสถียร
11	NCB02S-18	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ(บน)
12	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
13	DIS ชค.NCB02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงเต้าหู้
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.นครชัยศรีรับทราบ						
15	แจ้งกพอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งกพอ.นครชัยศรีทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
18	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
19	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
20	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
21	NPT02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		
22	แจ้งกพอ.นครชัยศรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
23	หลังจากกพอ.นครชัยศรีปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
24	แจ้งกพอ.นครชัยศรีทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
25	แจ้งกพอ.นครชัยศรีทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
27	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
28	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
29	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
30	NPT02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นร.		
31	- จ่ายไฟ						
32	DIS ชค.NCB02	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงเต้าหู้
33	- ย้ายโหลด NCB02 กลับคืนจาก NPT02						
34	NCB02S-18	ปลด	สับ		นช.	SCADA	ท่าแฉลบ(บน)
35	SF6 ชค.NCB02	ปลด	สับ		นช.		หน้าวัดเสถียร
36	NCB04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		สะพานน้ำหวาน
37	NCB02S-18	สับ	ปลด		นช.	SCADA	ท่าแฉลบ(บน)
38	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
39	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
40	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
41	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
42	NPT02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นร.		
***** สิ้นสุด Switching *****							

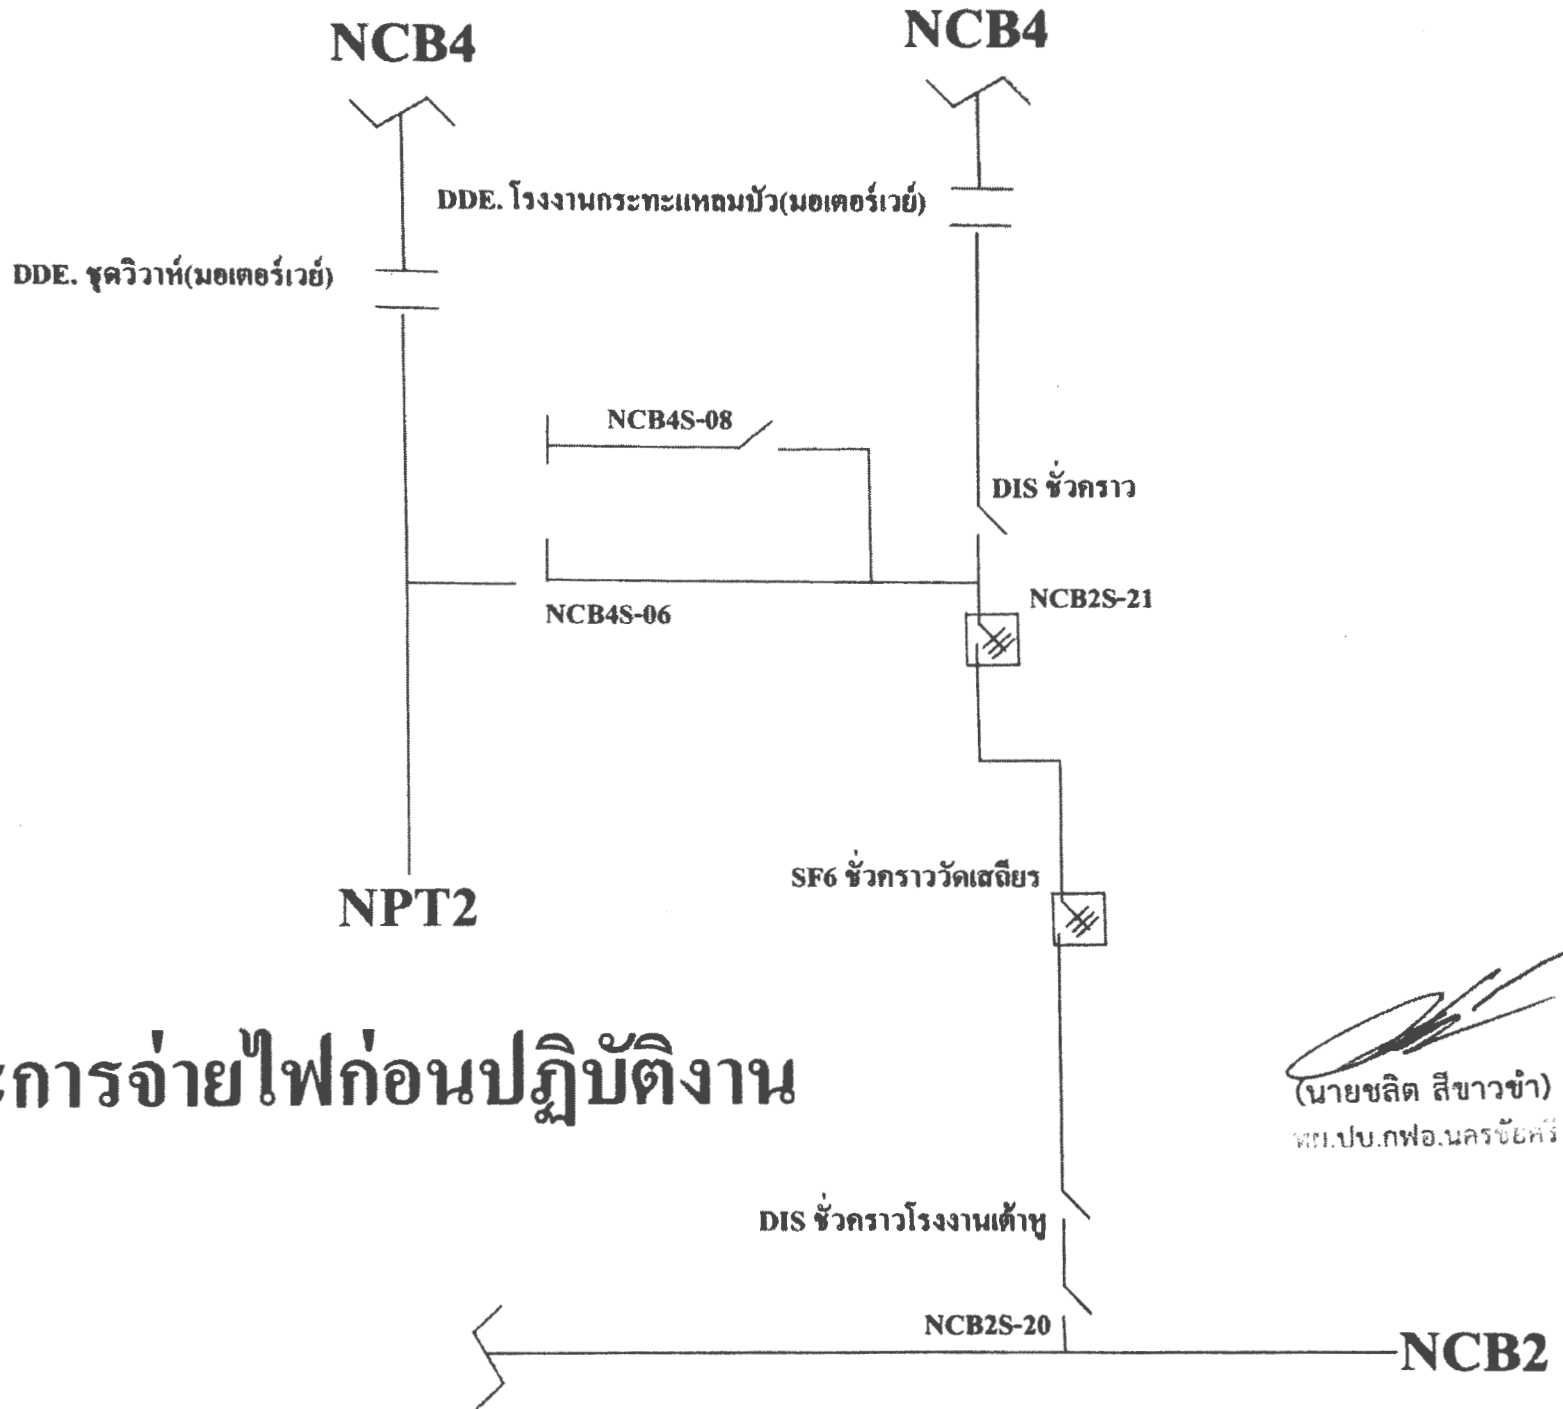

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
 ทท.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

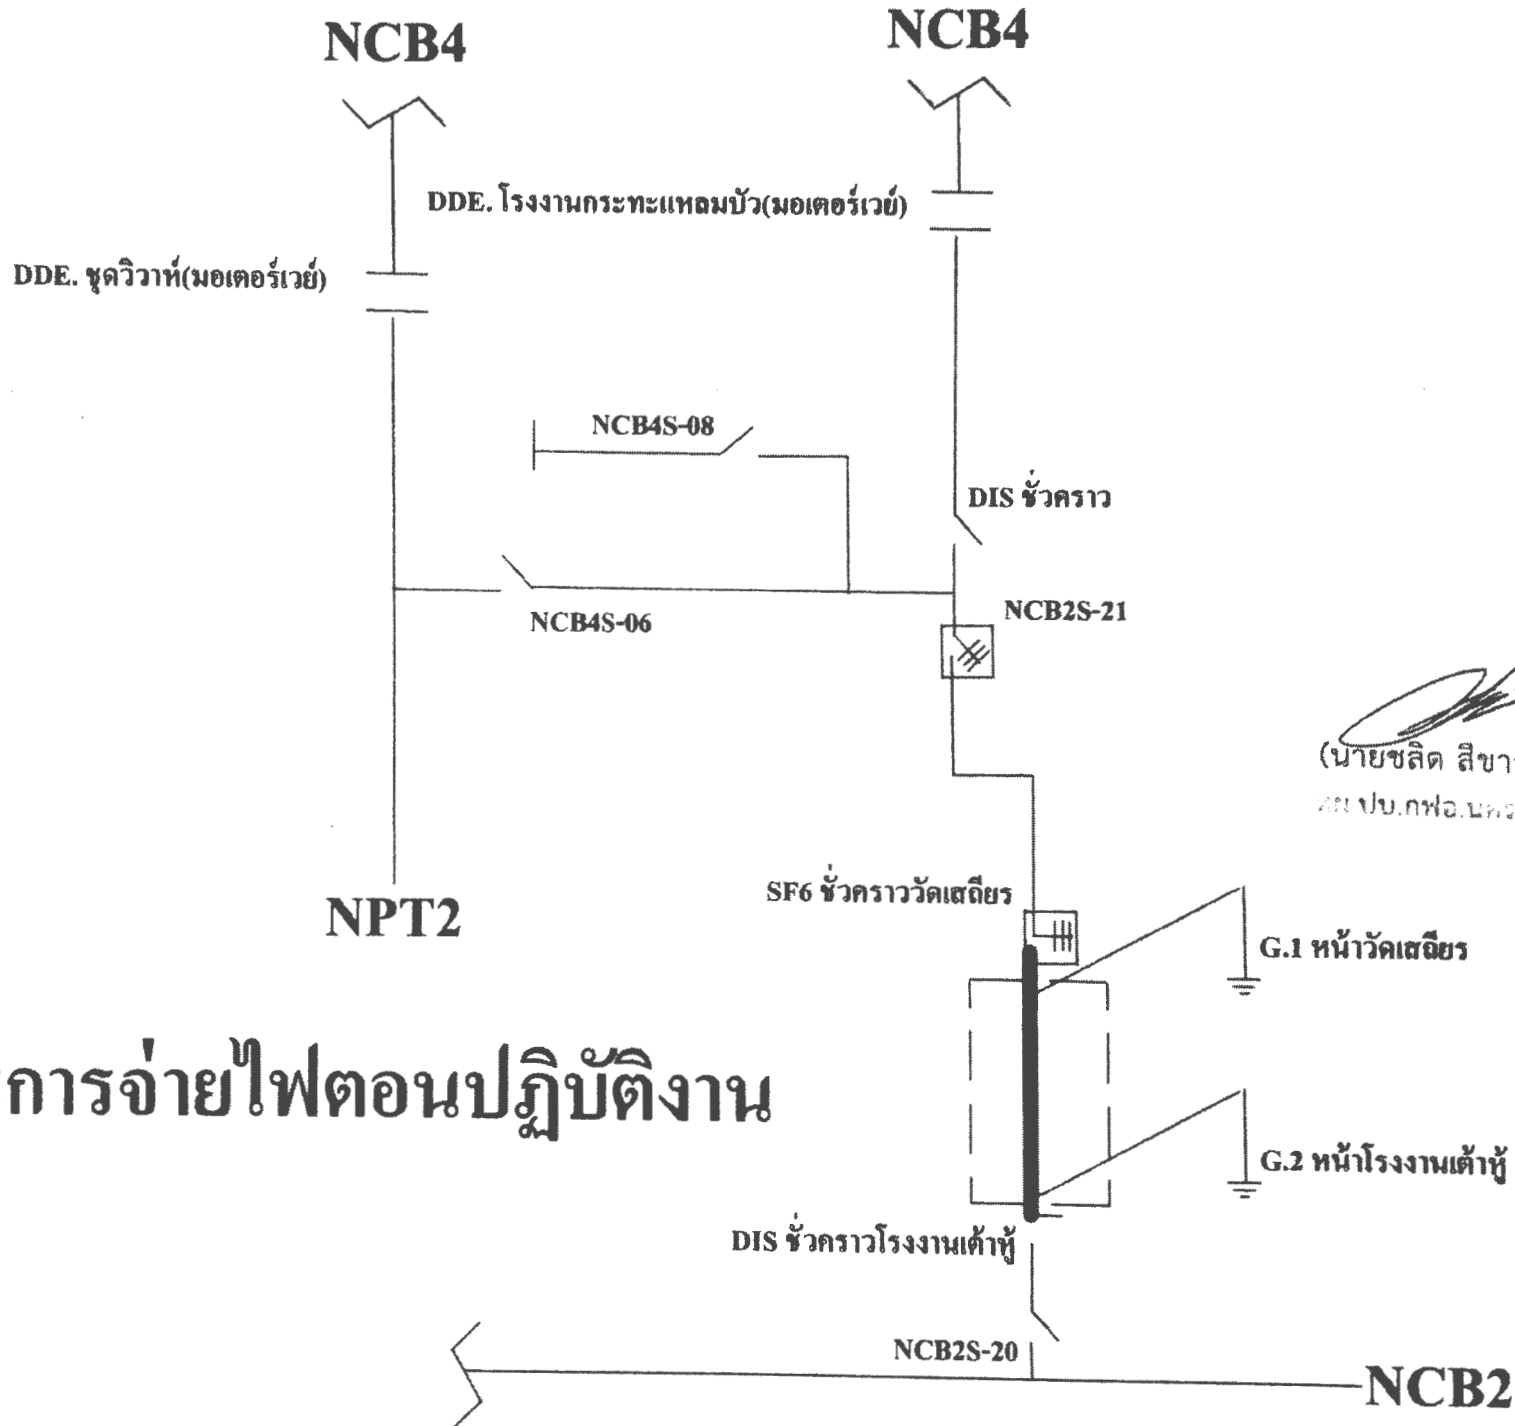

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

NCB4

NCB4

DDE. ชุดวัด (หม้อแปลง)

DDE. ไร้หม้อแปลง (หม้อแปลง)

NCBAS-06

NCBAS-06

DIS ชั่วคราว

NCB2S-21

NPT2

SF6 ชั่วคราว กักเก็บ

DIS ชั่วคราว ใช้งาน

NCB2S-20

NCB2

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาว)
ผ.บ.ป.ท.พ.บ.นครชัยศรี
