



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟจ.สค.๒(บพ) ๑๐๕๓ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

# Switching Deadline

26 ก.ค. 66

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง ออ.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บพว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการจ่ายไฟ สฟพ.สามพราน ๕ ชั่วโมง และสับเปลี่ยน Recloser ตัวใหม่ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	วันเสาร์ ที่ ๒๙ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV ตั้งแต่สะพานดำเนิน สะดวก-ประตูน้ำบางยาง ถึง Dis ชั่วโมงศาลพ่อขุนด่าน *** ปลด Dis ชั่วโมง เพื่อเปิด DDE สะพานคลองมะพลับ แล้ว สับ Dis ชั่วโมงกลับหลังเปิด DDE	BNP๔S-๑๒ ตรงข้ามวัดสวนส้ม	Dis ชั่วโมง ศาลพ่อขุนด่าน	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๐๙๐๙๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประตุนับบวงยาว - ๓.คลองตัน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชพ.บ.น. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย.)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.2(บพว)

๗ กค ๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BNP4 จาก BNP4S-12 ถึง Dis ๓๐๑-๑๐๙๐๙๖๐๖๐  
ในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1115/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกนอ

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

(นายอรรถนันท์ บัวสงค์)  
๐๑๓.5 นนท. และ อ.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐๑-๒ (บพว.)

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.บ.น.(ก3)

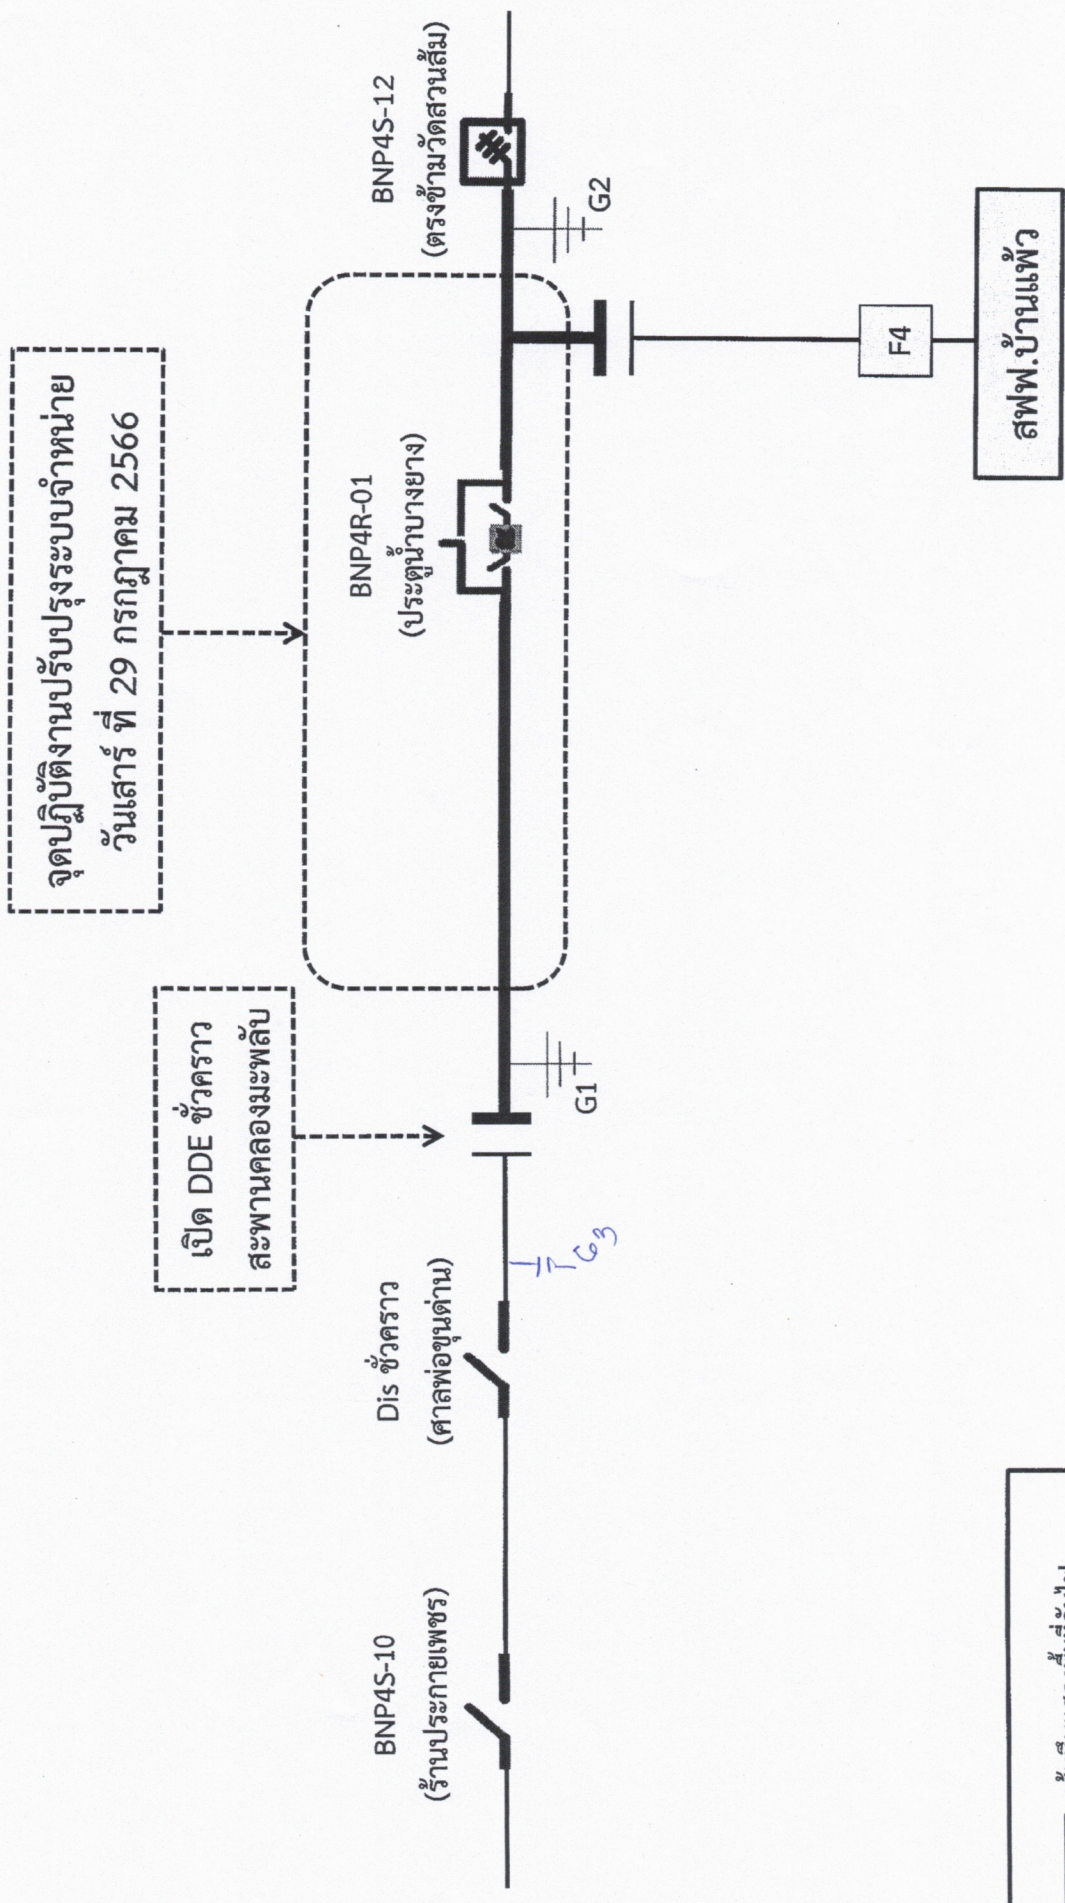
## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BNP4S-12 (SF6 ช่างวัดสวนส้ม) ถึง DIS ชค.ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค2.(บพว.) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับ สามพราน 5ชค. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1115/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร,วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร,จิรวัดน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
3	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00น.						
5	BNP04S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดสวนส้ม
6	DISชค. BNP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คลต		DIS ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
7	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
9	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพว.รับทราบ พร้อมลง We safe						
11	แจ้ง กฟอ.บพว.ทำการปลด DDE สะพานคลองมะพลับ ออกจากกันทั้งสามเฟส						
12	หลังจาก กฟอ.บพว.ทำการปลด DDE สะพานคลองมะพลับ ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟอ.บพว. ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
14	DISชค. BNP04	ปลด	สับ		คลต		DIS ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพว.รับทราบ พร้อมลง We safe						
16	แจ้งกฟอ.บพว.ปฏิบัติงานได้						
17	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
18	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
21	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP			
22	เมื่อ กฟอ.บพว. พร้อมทำการเชื่อม DDE สะพานคลองมะพลับ							
23	DISชค. BNP04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คลต		DIS	ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
24	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการทดสอบ ไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3							
25	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการเชื่อม DDE สะพานคลองมะพลับเข้าทั้งสามเฟส							
26	หลังจาก กฟอ.บพว. ทำการเชื่อม DDE สะพานคลองมะพลับเข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
27	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
28	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
29	แจ้ง กฟอ.บพว. ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3							
30	ตรวจสอบ Recloser BNP04R-01 (ตัวใหม่) ให้อยู่สถานะ OPEN							
31	เมื่อพร้อมรับไฟ							
32	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามวัดสวนส้ม
33	DISชค. BNP04	ปลด	สับ		คลต		DIS	ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
34	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
35	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน



เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับไฟ  
 ตำแหน่งจุด Short Ground
