



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)- ๘๗๒ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนSF-๖ รหัส BAM๐๒S-๐๖ บ้านทรงไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๒	๔ ก.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ชุดฮอตไลน์กระเช้าสุพรรณบุรี ร่วมกับชุดซ่อมย่อยกฟส.บปม. สับเปลี่ยน SF-๖ แทนของเดิมทดลองใช้งาน	ปลต SF-๖ BAM๐2S-06	-	นายประสาน รื่นโพธิ์วงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน รื่นโพธิ์วงศ์ ตำแหน่ง ผ.กป. โทร ๐-๘๐๐๒-๕๒๕๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM๐2 จาก BAM๐2S-06 ถึง BAM๐2S-06
ในวันที่ 4 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1117/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ โอนระชาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประจักษ์ อัครเดชา
28 มิ.ย. 65

สมพร อัครเดชา
(๖๘ ก. ๗ แทน นว.๑ป.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. กฟส.อ.บางปلام้า

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

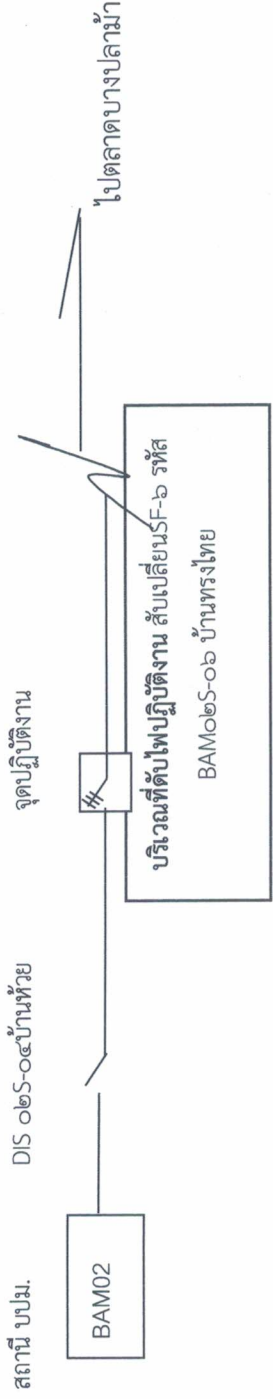
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ BAM02S-06 (SF6 บ้านทรงไทย)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 ผลิตรถยนต์รุ่นเก่า		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1117/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	29 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		TP1 โหลด 7.8 MW
3	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 4.14 MW
4	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 3.84 MW
5	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
6	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 โหลด 13.35 MW
7	SPN10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
8	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPN10						
9	BAM07S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
10	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
11	- ย้ายโหลด BAM02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก BAM07						
12	BAM02S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS วังตาเพชร
13	BAM02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SCADA	SF6 บ้านทรงไทย
14	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		TP1 -
17	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1 -
18	SPN10R-02	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
20	ขณะปฏิบัติงานให้ "OFF" Auto Reclose วงจร BAM02,07 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		TP1 -
24	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
25	SPN10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
26	- ย้ายโหลด BAM02 บางส่วน กลับจากจาก BAM07						
27	BAM02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บ้านทรงไทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BAM02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ว่างตาเพชร
29	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน กลับจาก SPN10						
30	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปม.	SCADA	R วัตถุขุ่นไกร
31	BAM07S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
32	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		TP1 -
33	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		CB -
34	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		CB -
35	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัตถุขุ่นไกร
36	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1 -
37	SPN10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนSF-๖ รหัส BAM๐๒S-๐๖ บ้านทรงไทย
วงจร BAM๐๒ สถานีไฟฟ้า บางปลาหมาก ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.



หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม
บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน
