



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline 28 ส.ค. 64
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ป.น.) ๕๒๕๒ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟภ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟภ.สค.ชั้น๑.....จะขอ Open Sw. เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้า สีแยกบางน้ำจืด และปากคลองสีวาด้านถ.เอกชัยตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BR๐๓	๒๙ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน บริเวณ สีแยกบางน้ำจืด และปากคลองสีวาด้าน ถ.เอกชัย (กรณีเร่งด่วน) แก้ไขโดยวิธีฮอทไลน์	SMC๓S-๐๒	-	นายธีระพัฒน์ สุทธิสา โทร.๐๘๙-๑๑๐๑๔๙๑
๒	KTB๐๔	๒๙ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTB๔S-๐๓	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เขียนทอง.....ตำแหน่ง.....หม.ป.บ.....โทร.....๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟภ.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC03 จาก SMC35-02 ถึง.....
ในวันที่ 29 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1119.
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KT004 จาก KT04S-03 ถึง.....
ในวันที่ 29 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1119.
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันดีเกอตรัง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอานง เขียนทอง

สมพร ตันดีเกอตรัง
(๐๘๖.๙ 1๓๓๓ ๓๕.๑๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กทบ.รต., กทสร. มนจ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จุดร้อน SMC3S-02, KTB4S-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29-ส.ค.-64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน *น.อ.สอ* งานทำ แก้วไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1119/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *dmr* วันที่ 27 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *[Signature]* วันที่ 27 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 22.4 MW
2	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 11.7 MW
3	KTB03VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 6.2 MW
4	KTB04VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 7.1 MW
5	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 0.8 MW
6	SN3 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.3 MW
7	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		SMC		- โหลด 2.1 MW
8 ย้ายโหลดวงจร SMC03 บางส่วนไปรับไฟจาก KTB03							
9	KTB03S-07	ปลด	สับ		บ.น.จ.		SF6 ก่อนโครงการอั้งซี่
10	SMC03S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บ.น.จ.		SF6 เสียบดลองส่วด้านเอกชัย
11 ย้ายโหลดวงจร KTB04 บางส่วนไปรับไฟจาก KTB08							
12	KTB04VB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
13	KTB04S-05	ปลด	สับ		บ.น.จ.		DIS ปากช. เสียบดลองเทพกาญจนา
14	KTB04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บ.น.จ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
15	KTB04VB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
16 แจ้ง กฟจ.สค. แก้วไขจุดร้อน SMC03S-02 (SMCBR-03, KTB03VB-01 Manual ไว้ตลอด) ได้							
17 แจ้ง กฟจ.สค. แก้วไขจุดร้อน KTB04S-03 (KTB04VB-01, KTB08VB-01 Manual ไว้ตลอด) ได้							
18	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
19	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
20	SN3 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21 แจ้ง กฟจ.สค. แก้วไขจุดร้อน SMC03S-02 และ KTB04S-03 แล้วเสร็จ							
22	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
23	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
24	SN3 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25 ย้ายโหลดวงจร KTB04 บางส่วนกลับคืนจาก KTB08							
26	KTB04VB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
27	KTB04S-03	ปลด	สับ		บ.น.จ.		DIS เซเวนบางน้ำจืด
28	KTB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บ.น.จ.		DIS ปากช. เสียบดลองเทพกาญจนา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
30	ย้ายโหนดวงจร SMC03 บางส่วนกลับคืนจาก KTB03						
31	SMC03S-02	ปลด	สับ		บ.น.จ.		SF6 เสียบดลองสีว่าด้านเอกชัย
32	KTBO3S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.น.จ.		SF6 ก่อนโครงการอั้งชี้
33	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
34	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
35	KTBO3VB-01	Manual	Auto		KTB		-
36	KTBO4VB-01	Manual	Auto		KTB		-
37	KTBO8VB-01	Manual	Auto		KTB		-
38	SN3 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		SMC		-
สิ้นสุด Switching							

ศกภาพการวางไฟฟ้าตอมุขีขิตองาน

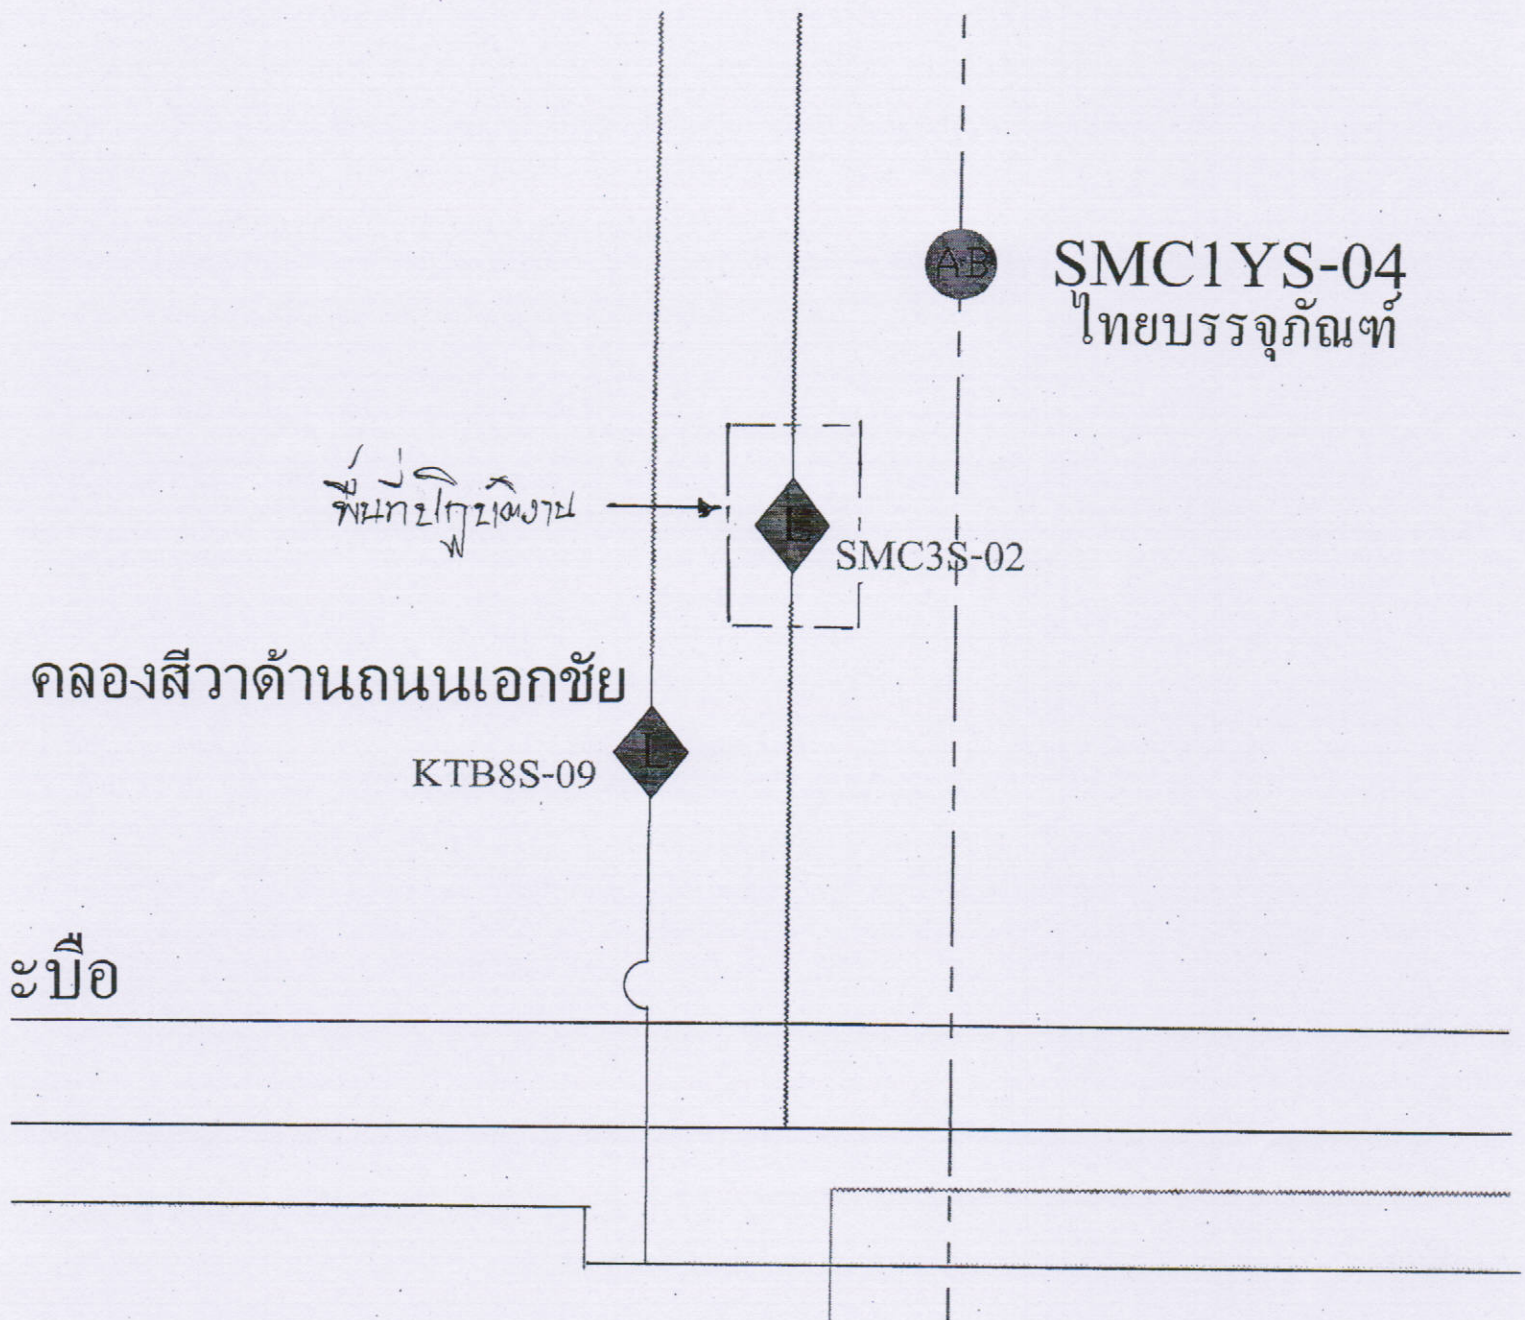

คลองสี่วาด้านถนนเอกชัย

KTB8S-09

SMC3S-02

SMC1YS-04
ไทยบรรจุภัณฑ์

ะป้อ

ศึกษาการทำไฟส่องสว่าง

