



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๑๙๖๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายนพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ..อ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB1	๔ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย วัดสำโรง(มอเตอร์เวย์)	- Dis ชั่วคราว อนามัยสำโรง	- NCB15-09	นายมนตรี มีสาร ๐๘๗๑๖๒๑๔๐๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ชุมชนบริเวณวัดสำโรง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวชา ตำแหน่ง ผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๑.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนพรัตน์ เคารพไทย)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NCB1 จาก Dis ชั่วคราว มอเตอร์เวย์ ถึง NCB15-09
ในวันที่ 4 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1121

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชลิต สีขาวชา
28 ส.ค. 69

รจก.พร ตันติเกตุศรีโก
(รจก. 71/ท.น. น.อ.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๓๖๐. ๓๕.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- บริเวณวัดสำโรง
1. สถานที่ทำงาน
 2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 ก.ย. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
 3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.นช. งานที่ทำ ย้ายแนวระบบจำหน่าย (มอเตอร์เวย์) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1121/64
 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2564
 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 สิงหาคม 2564
 6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 29 สิงหาคม 2564
 7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 3.08 MW
3	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดกลางคูเวียง
4	ย้ายโหลด NCB01 (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
5	Sw. By Pass	ปลด	สับ		นช.		DIS R.วัดสำโรง
6	NCB01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS บ้านก้านนช้าง
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
8	Dis..ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS อนามัยสำโรง
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
12	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
13	NCB01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดกลางคูเวียง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
15	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
16	NCB01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดกลางคูเวียง
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
19	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
20	Dis..ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.		DIS อนามัยสำโรง
21	ย้ายโหลด NCB01 (คืนสภาพปกติ)						
22	NCB01S-09	ปลด	สับ		นช.		DIS บ้านก้านนช้าง
23	Sw. By Pass	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS R.วัดสำโรง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
25	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดลานแหลม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


NCB1

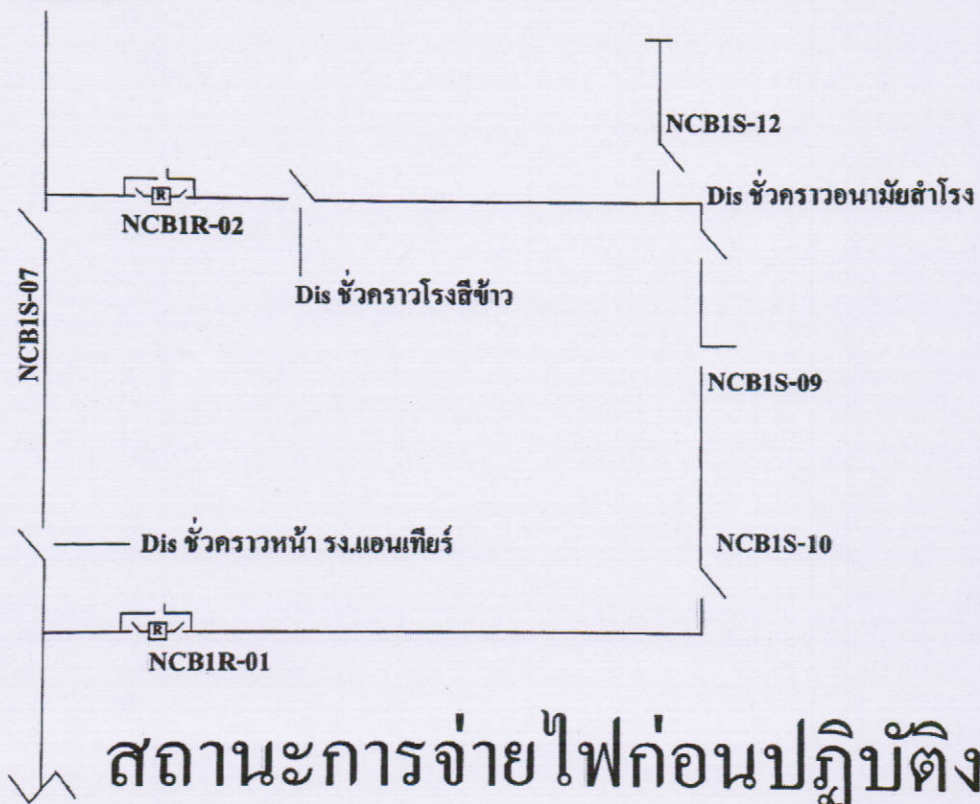


(นายชลิต สีขาวขำ)
ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

NCB1

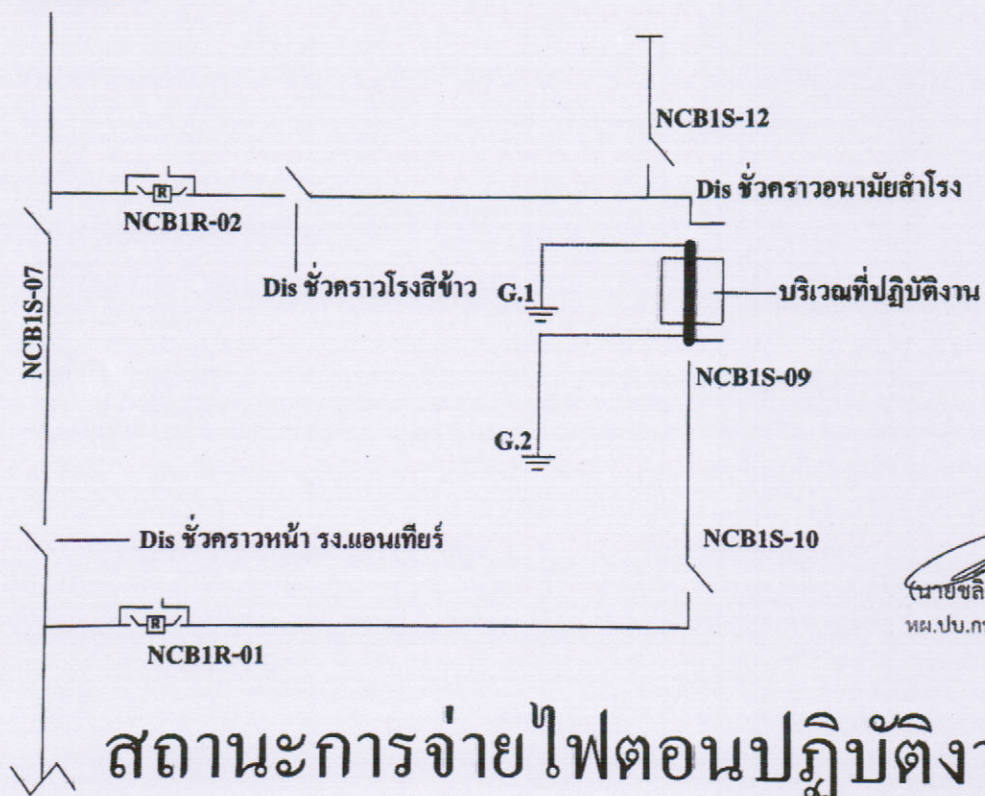

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

NCB1

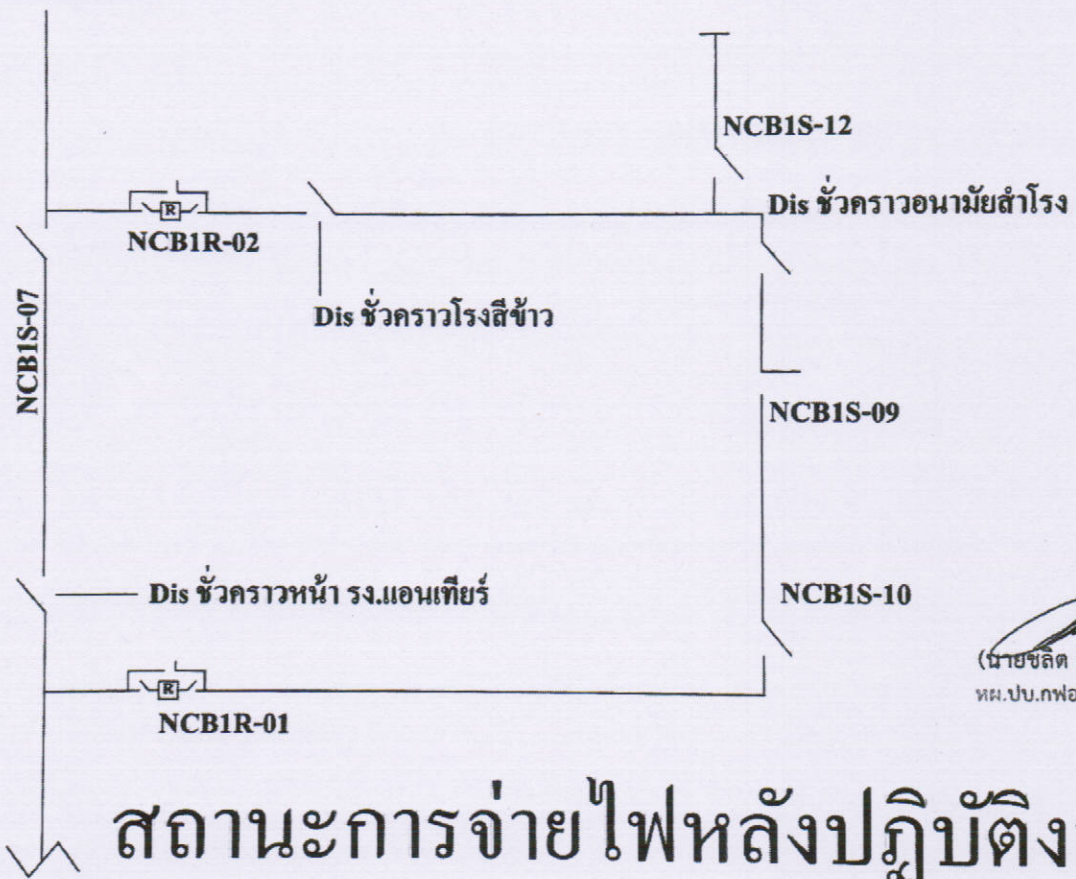

(นายชลิต สีขาวขำ)
ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....ย้ายแนวระบบจำหน่ายวัดสำโรง(งานถนนมอเตอร์เวย์).....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ย้ายแนวระบบจำหน่ายวัดสำโรง(งานถนนมอเตอร์เวย์).....
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๔ ก.ย. ๖๔ เริ่มเวลา..... ๐๙.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๕.๐๐ น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี.....
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ..... นายนพรัตน์ เคารพไทย..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี.....
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๔๑๑๑๔๓๒..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายมนตรี มีสาวงษ์.....
 ตำแหน่ง..... พชง.๖ ผบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๗๑๖๒๑๘๐๘..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.....

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวขำ ผบ.ป.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖).....
 ๒.ผู้รับขอต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่..... หน้าอนามัยสำโรง..... ผู้รับผิดชอบ..... แก๊ไฟ นช.๐๒.....
 จุดที่ ๒..... บ้านก้านช้าง..... ผู้รับผิดชอบ..... นช. กระเช้า๐๔..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕-๖..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่ ๘..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๙..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๔..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมญา หงษ์สินี.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน
 วันระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๗ ส.ค. ๖๔..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผบ., จป. กฟอ.นช.....

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปคูหน้างานจริง พร้อมชี้แจ้งจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจ้งที่หน้างาน เหตุผล.....
 ได้ชี้แจ้งที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๗ ส.ค. ๖๔.....

C๓ Safety CAP ๐๑

- หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้
- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
 - เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า
