



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 31 ก.ค. 64

เลขที่ ก๑.กปบ.(คฟ.)
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชสะอาด

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ท.ผ.คฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กปบ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ กาญจนบุรี ๔ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		<u>6 ก.ย. ๖๔</u> ๑ ก.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	จ่ายไฟสถานีฯ กาญจนบุรี ๔	-	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงาน ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ๑ ฟีดเดอร์ KCE จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 6 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1124

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ผ.คฟ.ท.

ท.ผ.คฟ.ท. อนุสรณ์ อนุประพันธ์
๐๖๑.๕๓๗ พ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กทส.๓๓๖.
อนุมัติ

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานีฯ KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	จ่ายไฟสถานีไฟฟ้าภาคศูนย์ 4 (KCE)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟสถานีไฟฟ้าภาคศูนย์ 4 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1124/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิก, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าดำนมะขามเตี้ย						
2	ตรวจสอบ DMA04YS-04 ABS.115 kV.หน้าสถานีไฟฟ้าภาคศูนย์ 4 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
3	ตรวจสอบ KCE01YB-01 ,KCE01YS-01 ,KCE01BVB-01 ,KCE01BVS-01 ให้เปิดวงจรโชว์"OPEN"						
4	ตรวจสอบ KCE01VB-01 ,KCE02VB-01 ,KCE03VB-01 ,KCE04VB-01 ให้เปิดวงจรโชว์"OPEN"						
5	ตรวจสอบ KCE01VS-01 ,KCE02VS-01 ,KCE03VS-01 ,KCE04VS-01 ให้เปิดวงจรโชว์"OPEN"						
6	ตรวจสอบ KCE01S-01 ,KCE02S-01 ,KCE03S-01 ,KCE04S-01 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
7	DMA06VB-01	Auto	Manual		DMA		
8	DMA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดมข-	RE	ป้องกันAVR.วัดทุ่งศาลาฯ
9	AVR.ไลน์DMA06	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถดมข-	AVR	วัดทุ่งศาลาฯ
10	- จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ไลน์ DMA - KCE						
11	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 kV.
12	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 kV.
13	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA	CB	115 kV.
14	- จ่ายไฟสถานีไฟฟ้าภาคศูนย์ 4 (KCE)						
15	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		ใบมีด 115 kV.
16	KCE01BVS-01	ปลด	สับ		KCE		
17	KCE01VS-01	ปลด	สับ		KCE		
18	KCE03VS-01	ปลด	สับ		KCE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	DMA04YS-04	ปลด	สับ		KCE	ABS	115 kv.ก่อนเข้า KCE
20	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	CB	115 kv.TP1
21	ปรับแรงดัน KCE-TP1 ไ่ว้ที่ 22.5 kv.				KCE		
22	KCE05VB-01	สับ	ปลด		KCE	CB	KCE05
23	KCE05VS-01	สับ	ปลด		KCE		
24	KCE05S-01	สับ	ปลด		รถดมข-	DIS	Pot Head KCE05
25	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	CB	22 kv.Incomming
26	- ตรวจสอบฟอส KCE01VB-01						
27	KCE01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE	CB	KCE01
28	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยตรวจสอบเฟสที่ KCE01S-01 ได้						
29	หลังจากกฟส.ด้านมะขามเตี้ยตรวจสอบเฟสที่ KCE01S-01 ถูกต้อง						
30	KCE01VB-01	สับ	ปลด		KCE	CB	KCE01
31	- ตรวจสอบฟอส KCE03VB-01						
32	KCE03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE	CB	KCE03
33	แจ้งกฟส.ด้านมะขามเตี้ยตรวจสอบเฟสที่ KCE03S-01 ได้						
34	หลังจากกฟส.ด้านมะขามเตี้ยตรวจสอบเฟสที่ KCE03S-01 ถูกต้อง						
35	KCE03VB-01	สับ	ปลด		KCE	CB	KCE03
36	KCE01S-01	ปลด	สับ		รถดมข-	DIS	Pot Head KCE01
37	KCE03S-01	ปลด	สับ		รถดมข-	DIS	Pot Head KCE03
38	- ย้ายโหลด DMA06 ไปจ่ายจาก KCE03 (ตัดจ่ายไฟใหม่)						
39	KCE03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE	CB	KCE03
40	KCE01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดมข-	SF6	ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าKCE
41	- ย้ายโหลด DMA06 ไปจ่ายจาก KCE01 (ตัดจ่ายไฟใหม่)						
42	KCE01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCE	CB	KCE03
43	DMA06R-03	สับ	ปลด		รถดมข-	RE	ป้องกันAVR.วัดหุงศาลาฯ
44	ปลดใบมีดด้านโหลดของ DMA06R-03 ออกทั้งสามเฟส				รถดมข-	RE	ป้องกันAVR.วัดหุงศาลาฯ
45	DMA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถดมข-	RE	ป้องกันAVR.วัดหุงศาลาฯ
46	ปรับ TAP AVR.ลงมาไว้ที่ TAP1 และ Manual TAP ไว้				รถดมข-	AVR	วัดหุงศาลาฯ
47	DMA06S-11	ปลด	สับ		รถดมข-	SF6	By-Pass AVR.วัดหุงศาลาฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
48	DMA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดมข-		SF6	สี่แยกบ้านลำทราย
49	DMA04YB-01	Manual	Auto		DMA			
50	DMA06VB-01	Manual	Auto		DMA			
51	KCE01YB-01	Manual	Auto		KCE			
52	KCE01VB-01	Manual	Auto		KCE			
53	KCE03VB-01	Manual	Auto		KCE			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์คั่น
 รองรับการแบ่งจ่ายไฟสถานี กายทองปรี 4 (ชั่วคราว) ระยะที่ 1

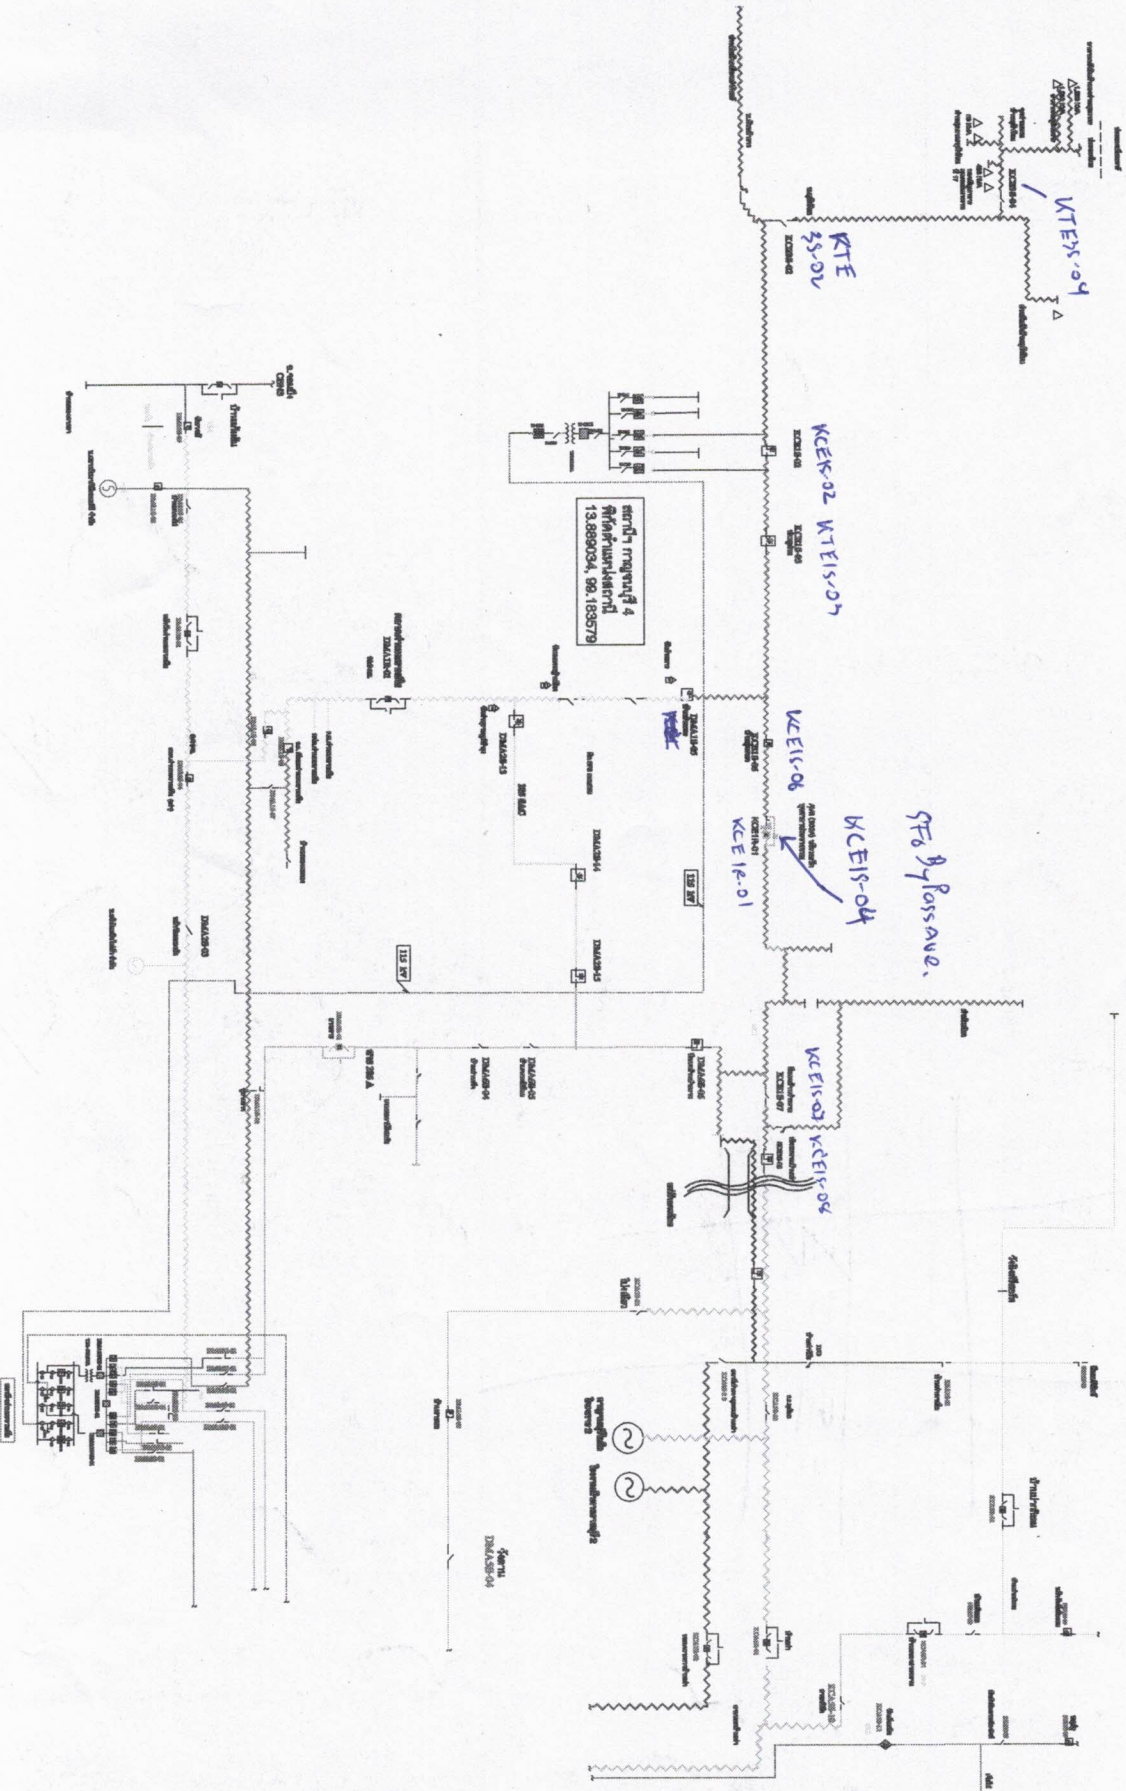

แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน รองรับการแบ่งจ่ายไฟสถานี กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) ระยะที่ 1

