



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป)๑๕๓๗ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB02	12 / ส.ค. 66	08.00	17.00	ย. ระบบจำหน่าย / สะพาน 6	- NCB02S-05	- NCB02S-06 - NCB02S-07	นายวีระยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.6 ผกส. 099-8878077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนท่ารถตุนนครชัยศรี และชุมชนสะพาน ๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่ง วิศว.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

NCB 2S-06 ,

12 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1..... ฟีดเดอร์ NCB 2 จาก NCB 2S-05 ถึง NCB 2S-07
ในวันที่ ๙.๑.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1124/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พลิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส. พิเศษศรีดา ๐๑๙๑๙


(นายพลิต ราษฎร์นิยม)
วตค.4 แผนก นพ.ฉฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก,..... นทอ. นท.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานย้ายแนวระบบจำหน่าย..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ท่ารถตู้ ถึง สะพาน ๖..... วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น..... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น..... หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี..... ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า) ชื่อ..... นายวณภมิ บำรุงศรี..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายวิระยุทธ นิमितโกคานันท์..... ตำแหน่ง..... พชง.๖ ผกส.กฟอ.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๙-๘๘๗๘๐๗๗..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ., ผู้รับจ้าง.....
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เภา วศก.๔ ผบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)..... ๒.ผู้รับชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... หน้าแบบบญ.๑ วงจร..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช.๐๒..... จุดที่ ๒..... ท่ารถตู้.๑ วงจร..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช.๐๔..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching..... ๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ..... วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑..... วิทยากร..... รจก.(ท) , ผบ.บ., ผกส., จป. กฟอ.นช. และผู้รับจ้าง.....
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

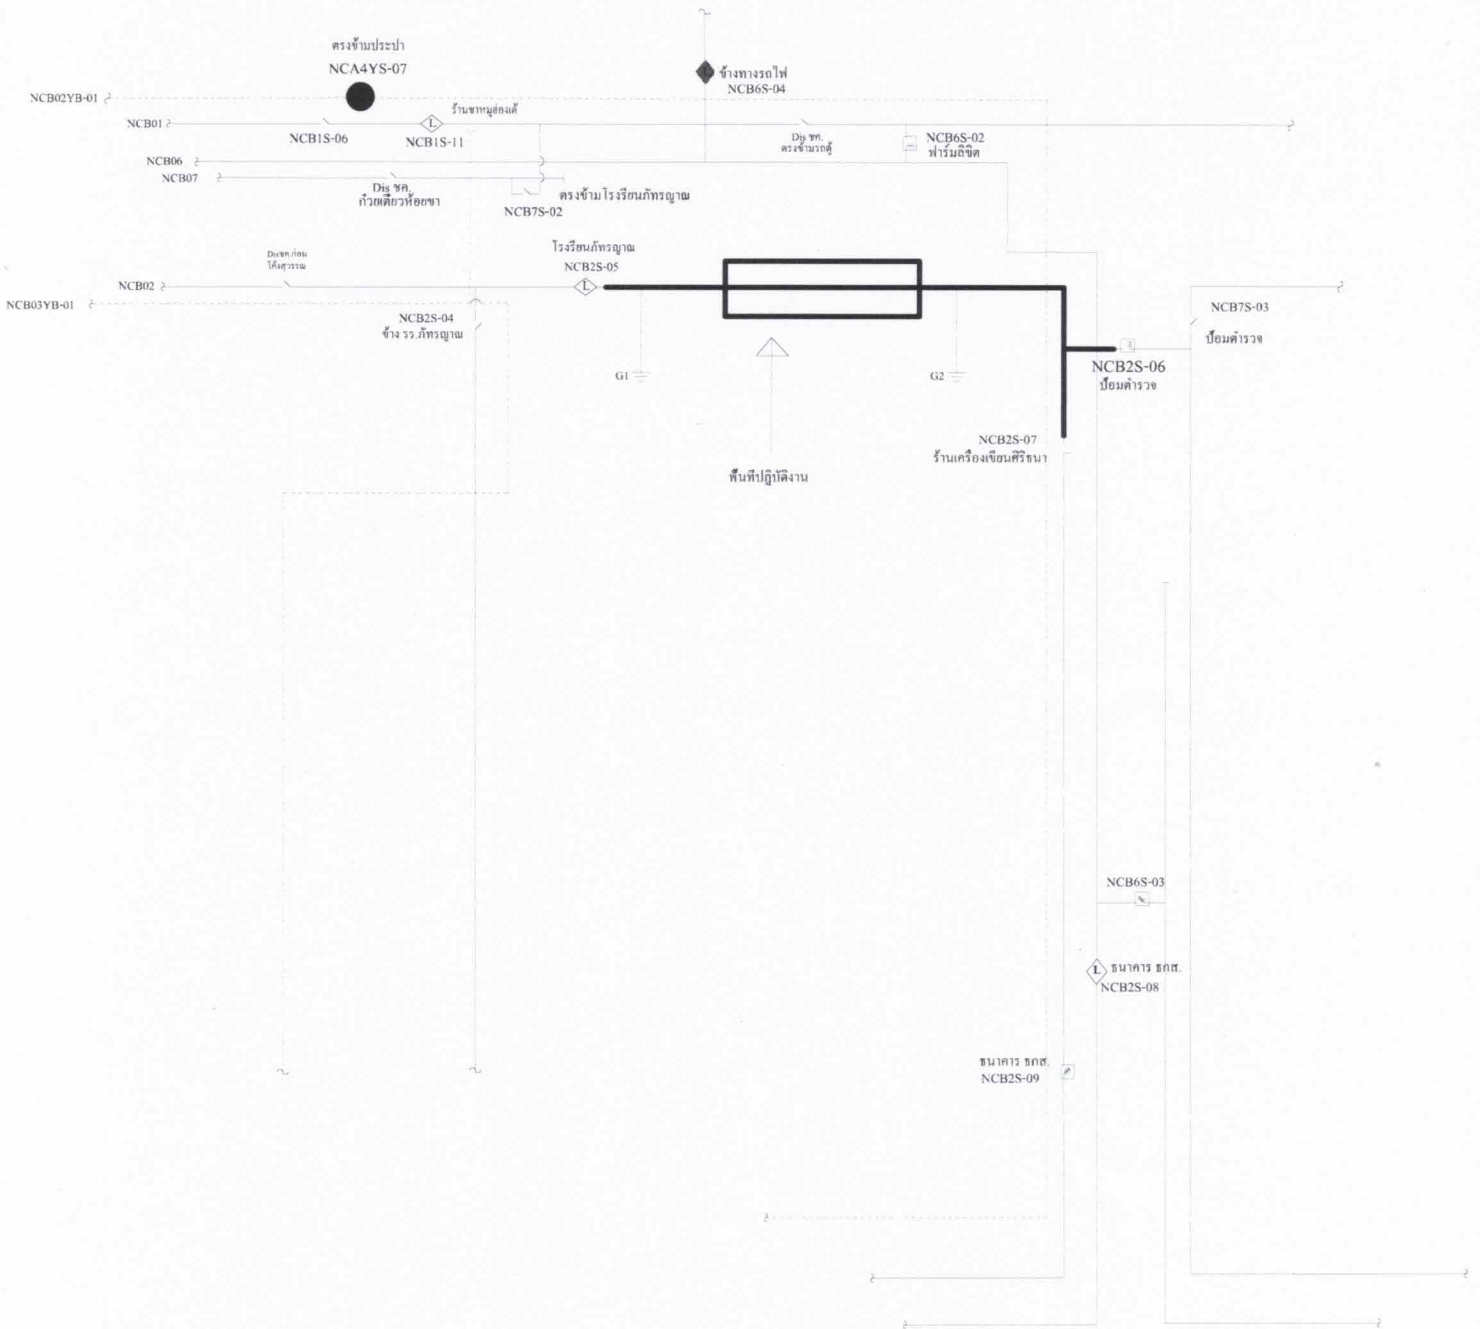

 (นายชลิต์ สีขาวขำ)
 ผบ.กฟอ.นครชัยศรี

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

