



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๕๒/๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

Switching Deadline

9 ส.ค. 67


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU01	๑๐ ส.ค. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๑.๐๐ น.	เชื่อม DDE บ้านหนองระหงษ์	PTU2R-01	PTU2S-16	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕๒๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ PTU1 จาก PTU2R-01 ถึง PTU2S-16
ในวันที่ 10 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1125/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพรัตน์ อธิษฐานเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นาย นพรัตน์ อธิษฐานเงิน)
อ.ก.บ.ททท. น.ท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. 
อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วงจร PTU01 บริเวณบ้านหนองระหงส์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	11.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE หนองระหงส์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1125/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี			วันที่	4 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายธนิต,นายมนิช, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.		R R.ตอนตาเพชร
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.30 น.						
5	PTU02R-01	สับ	ปลด		พทน.		R R.ตอนตาเพชร
6	SW.Load PTU02R-01	สับ	ปลด		พทน.		R R.ตอนตาเพชร
7	PTU02S-16	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS วัดบ่อหว่า
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พนมทวน ทราบ						
9	แจ้งให้เทสไฟ และช็อตกราวด์จุด G1,G2 ลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
10	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจาก กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We safe						
12	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์จุด G1,G2						
13	SW.Load PTU02R-01	ปลด	สับ		พทน.		R R.ตอนตาเพชร
14	PTU02R-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		พทน.		R R.ตอนตาเพชร
15	PTU02R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.		R
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

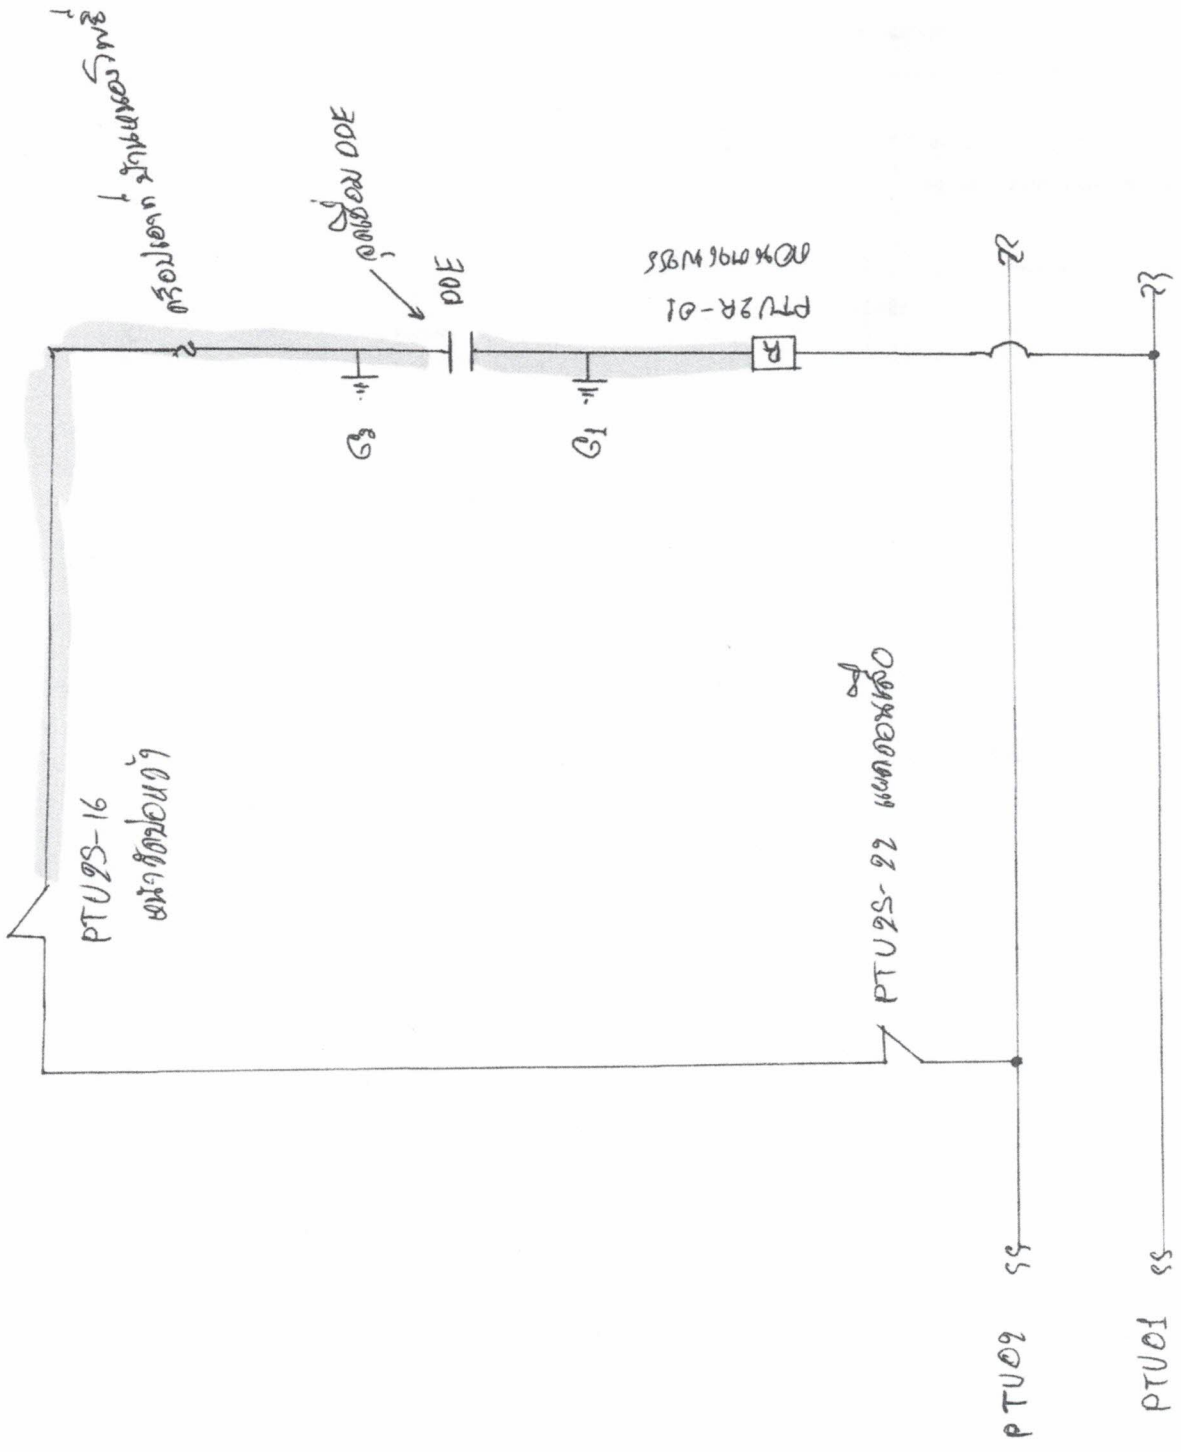

แผงจ่ายแรงดัน

300 Ω

PTU 2S-22 ปิด

2/16/64

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
จัดแปลนไฟ.อ.พจน.

หน้า 1
หน้า 2
