



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๖๗/๕ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพลฤกษ์

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาสงบ ผขพ สถานีไฟฟ้า นครปฐม๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU03	26 กรกฎาคม 2566	8.30 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูงออกจากที่ ผขพ บริเวณครัวคุณข้าว	DIS ชค. สาม แยกหัวฟุ้ง	DDE ก่อนครัว คุณข้าว	นายชินวัตร เกียรติขจร กำจาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ม.๑ โพรงมะเดื่อ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โปธิริชต์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพลฤกษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ NPU03 จาก บิ.๕๓.กฟจ.ก. ถึง ADE ก่อนครัวคุณข้าว  
ในวันที่ 26 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1126/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่าง วัฒนพงษ์ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โปธิริชต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. ๖๐

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมชาย ศรีจารุพลฤกษ์)  
๑๓.๖ ก.ค. ๖๖ น.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS ชค.สามแยกหัวทุ่ง - DDE ก่อนถึงครัวคุณชา

26 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1126/66	
	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	22 กรกฎาคม 2566	
			วันที่	22 กรกฎาคม 2566	
			วันที่	22 กรกฎาคม 2566	

1. บวญพิรพทริ,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)


2. นายศุภสวัสดิ,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
3	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
4	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
5	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
6	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
7	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
8	ย้ายโหลด NPU03 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA05						
9	BPA01S-07	ปลด	สับ		นธ.	SF6	อู่ชาลี
10	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU	-	ขนานบัส
11	BPA05S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นธ.	SF6	รง.น้ำหวานตราภ
12	DIS ชค.ไลน์ NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	สามแยกหัวทุ่ง
13	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ขนานบัส
14	BPA01S-07	สับ	ปลด		นธ.	SF6	อู่ชาลี
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
16	แจ้ง กฟจ.นธ.ทำการไลน์โหลดบริเวณที่จะปฏิบัติงานออก(มีหม้อแปลงอยู่ 1 เครื่อง)						
17	เมื่อ กฟจ.นธ.ทำการไลน์โหลดบริเวณที่จะปฏิบัติงานออก(มีหม้อแปลงอยู่ 1 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟส						
19	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นธ.ทราบ						
21	แจ้ง กฟจ.นธ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟจ.นธ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
23	เมื่อ กฟจ.นธ.Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
24	แจ้ง กฟจ.นธ.ปฏิบัติงานได้						
25	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
27	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
28	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
30	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
31	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***								
32	เมื่อ กฟจ.นฐ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ							
33	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
34	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
35	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
36	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
37	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
38	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
39	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
40	แจ้ง กฟจ.นฐ.ปลด Short Ground จุด G1							
41	แจ้ง กฟจ.นฐ.ปลด Short Ground จุด G2							
42	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
43	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟส							
44	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
45	แจ้ง กฟจ.นฐ.ทำการนำโหนดบริเวณที่ปฏิบัติงานเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 1 เครื่อง)							
46	เมื่อ กฟจ.นฐ.ทำการนำโหนดบริเวณที่ปฏิบัติงานเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 1 เครื่อง)แล้วเสร็จ							
47	ย้ายโหนด NPU03 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA05							
48	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	อู่ชาลี
49	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		-	ขนานบัส
50	DIS ชค.ไลน์ NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	สามแยกหัวทุ่ง
51	BPA05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	รง.น้ำหวานตราภ
52	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		-	ขนานบัส
53	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	อู่ชาลี
54	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
55	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
56	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
57	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
58	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
59	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
60	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

NPUS3S-05  
NPUS3S-04

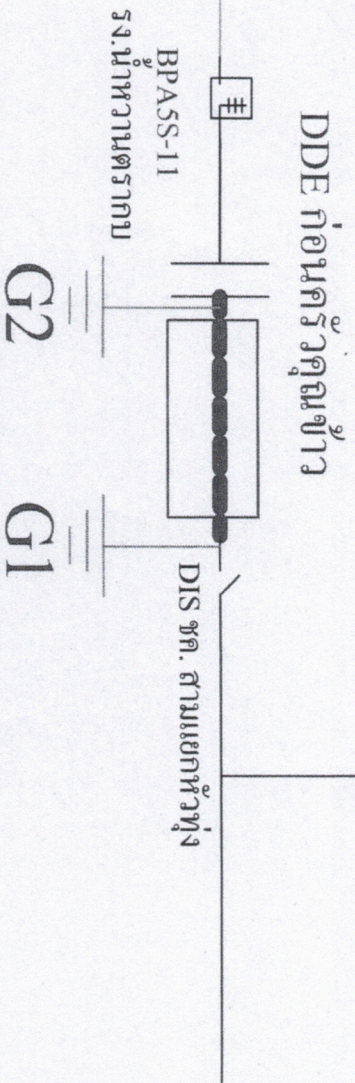

พื้นที่ค้ำไฟ



พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดเชื่อมต่อกราวด์

