



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10/08/67

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตธรรมชวล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขต ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟท.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายจุดติดตั้ง SF6 ทร. ยมราช และร้อยสายเคเบิลอากาศระบบ ๒๒KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๑	๑๑/๐๘/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายSF๖หม้อแปลง (SPA๑๐S-๐๖)และร้อยสายเคเบิล อากาศ	SF๖หม้อแปลง (SPA๑๐S-๐๖)	DEEหม้อแปลง	โทร.๐๘ ๖๕๐๓ ๐๓๐๗๖ นายวันฉลอง เทียนเทศ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พ.ช.ง.๕ (สท.) โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงกั้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยงกั้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงกั้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขต.....)

ตำแหน่ง..... ร.จ.ก.(ท.) กฟท.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวธารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์ SPA10 จาก SPA10S-06 ถึง DEE หม้อแปลง
 ในวันที่ 11 ส.ค 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1131/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.อ.อ.อ.อ.อ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย
 อ.ก.บ. ๖ กท.บ. นว.๐๗
 ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นว.๐๗


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 SPA10S-06 (หน้า รพ.ยมราช)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1131/67
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 6 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 6 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 6 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย			
	1. นายณกรินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุรัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง							
1	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
2	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07							
4	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ รพ.
5	SPA10S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.
6	UG R17	สับ	ปลด		สพ.		UG
แจ้ง Hotline ทำการปลดสายแรงสูงด้าน Source ด้าน Load ของ SF6 SPA10S-06 ออกทั้ง 3 เฟสได้							
เมื่อ Hotline ทำการปลดสายแรงสูงด้าน Source ด้าน Load ของ SF6 SPA10S-06 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
แจ้ง กฟส.สพ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สพ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
แจ้งให้ กฟส.สพ.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ.ทราบ							
13	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
14	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อ กฟส.สพ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
18	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
แจ้ง กฟส.สพ.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สพ.ทำการปลด Short Ground จุด G2							
ตรวจสอบ SF6 SPA10S-06 ย้ายจุดติดตั้งอยู่ระหว่าง UG R18 กับ UG R19 ให้อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม"ล๊อคคาน"							
ตรวจสอบโหม่ง UG R20 อยู่ตำแหน่ง Open ทั้ง 3 เฟส							
แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมสายเข้า UG R20 เข้าทั้ง 3 เฟส							
เมื่อ Hotline ทำการเชื่อมสายเข้า UG R20 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนกลับจาก SPA07							
26	UG R17	ปลด	สับ		สพ.		UG
27	UG R20	ปลด	สับ		สพ.		UG
28	SPA10S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ รพ.
30	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
31	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๑๑ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้า รพ.เจ้าพระยายมราช เพื่อย้าย SF๖ รพ.ยมราช (SPA๑๐S-๐๖)ไปรับไฟจากหัวเคเบิลR๑๘ และรื้อถอนสายเคเบิลอากาศ โครงการงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน(UG) โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
พีดเคอร์ ๑๐ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๑ ตั้งแต่บริเวณ.. SF๖หน้ารพ.ยมราช(Spa๑๐s-๐๖) -DEEหน้ารพ.

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวันฉลอง เทียนเทศ ตำแหน่ง พชง.๖.ผบ.ป.สพ. โทร ๐๘ ๖๕๐๓ ๓๐๗๖ เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายพิบูล ปานข้า ขผ.ปบ.สพ. โทร ๐๘ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

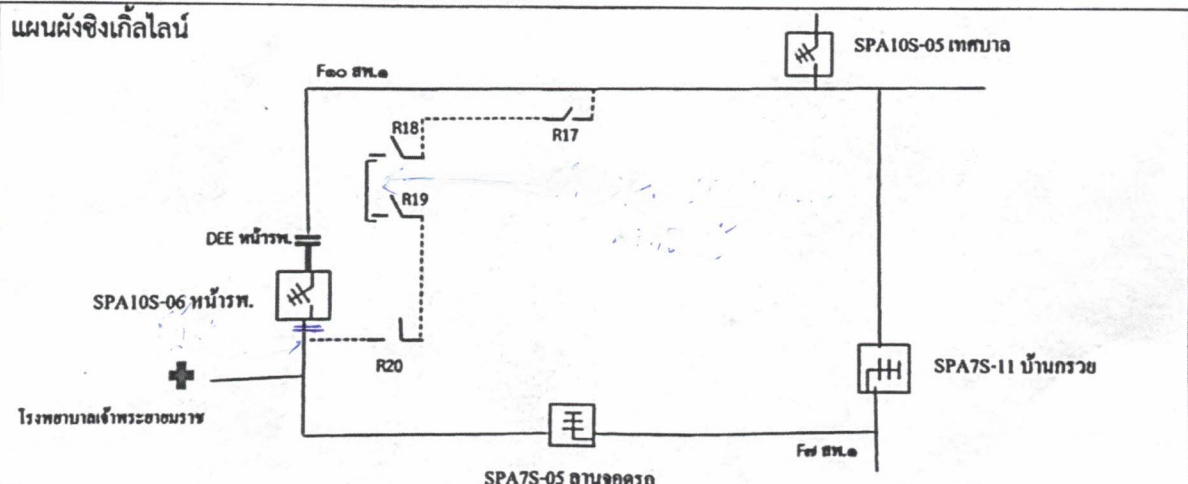

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสารองรับงานเคเบิลใต้ดิน

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลดระหว่างจุดปฏิบัติงานให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานตัดDDE หน้าโรงพยาบาล
๓. ชุดแก๊สไฟฯ ดับไฟ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

อิศร.
(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พชง.๕(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ ,๑๔๘๕๕ ,๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๑๑ ส.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ หน้ารพ. เจ้าพระยายมราช เพื่อย้าย SF๖ รพ.ยมราช (SPA๑๐S-๐๖)ไปรับไฟจากหัวเคเบิลR๑๘ และรื้อถอนสายเคเบิลอากาศ โครงการงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน(UG) โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
 ฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๑ ตั้งแต่บริเวณ.. SF๖หน้ารพ.ยมราช(Spa๑๐s-๐๖) -DEEหน้ารพ.

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวันฉลอง เทียนเทศ ตำแหน่ง พงษ.๖.ผบ.สพ. โทร ๐๘ ๖๕๐๓ ๓๐๗๖เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายพิบูล ปานขำ ชผ.ปบ.สพ. โทร ๐๙ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

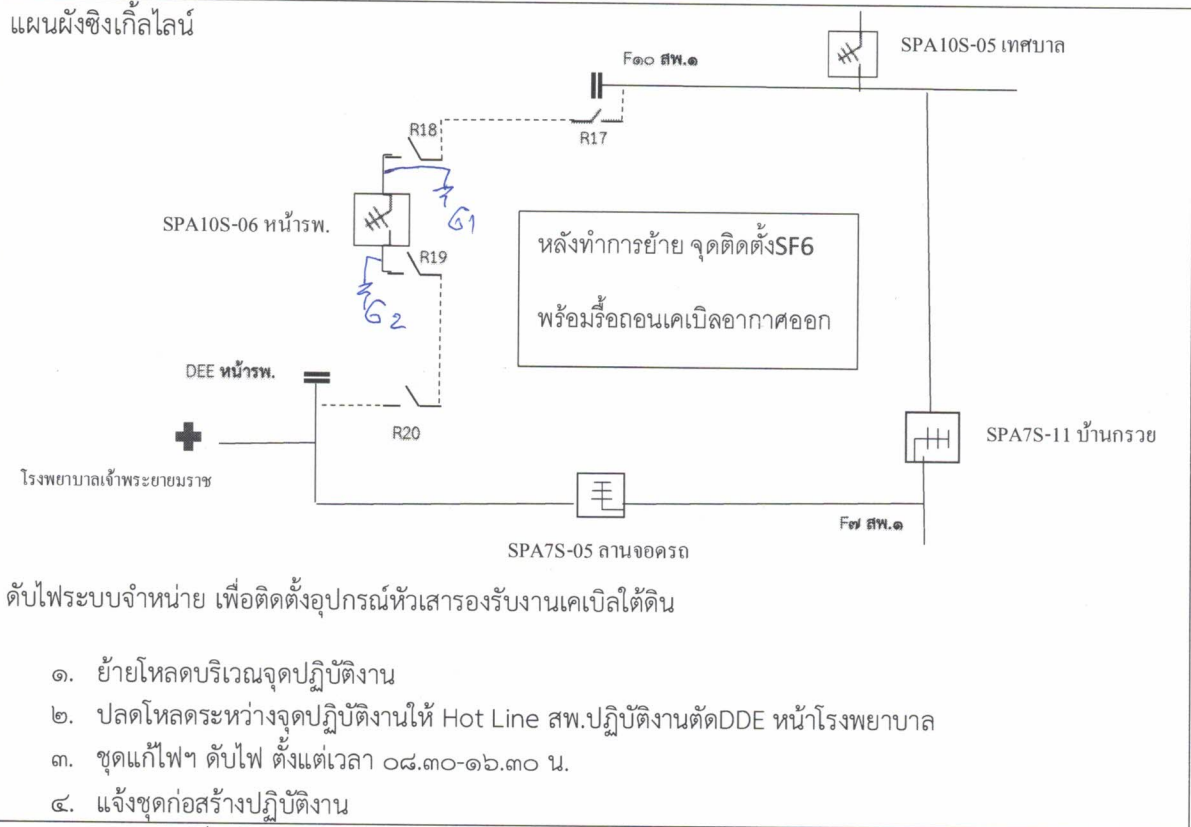

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พงษ.๕(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
