



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๐๐๓๒ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี
 จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร
 ในไลน์เมน บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒ สถานีฯ บ่อพลอย ๒	๑๖ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูง ๑๒ เมตร ในไลน์เมน บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	SF๖ บ้านวังแย้ BOU๐๒S-๐๔	SF๖ บ้านหนองตาเตช BOU๐๒S-๐๕	นายวิษณุ มีผล พงษ.๖(ปฟ) โทร.๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงษ.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๔๖๘๘๒๔
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงษ.๖ (ปฟ) โทร.๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
 ผจก.กฟส.บ่อพลอย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายสุวิทย์)

(นายสุวิทย์)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 50002 จาก B0028-04 ถึง B0028-05
ในวันที่ 16 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1134/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยมณี ประสานงานขอดับไฟกับ ๑๑๕๖๖๖๖ นายคณวัฒน์

(นายสุวิทย์ ไพรัตน์)
วตค.๕ 1๓๓ นพคพ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นายอ.อ.พ.ก., นายอ.อ.พ.อ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านวังแยม - ห้วยผาก (BOU02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย BOU02		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1134/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	9 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 2. นายพีรภัทร, นายสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิน 3. นายนครินทร์, นายพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามา					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-
3	ตรวจสอบ BOU01S-07 (SF6 บ้านหนองขอน) อยู่สถานะ ปลด โขว์ OFF และให้ดำเนินการ Lock คาน						
4	ตรวจสอบ BOU02S-05 (SF6 หนองตาเดช) อยู่สถานะ ปลด โขว์ OFF และให้ดำเนินการ Lock คาน						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. เพื่อตัด DDE จุด A,B บริเวณก่อนโค้งบ้านวังแยม และบ้านห้วยผาก						
6	BOU02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6 บ้านวังแยม
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลดจุด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลดจุด Short Ground จุด G2						
17	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-
18	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		BOU	SCADA	R ท่งแสม
19	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟถึงจุดตัด DDE จุด A,B บริเวณก่อนโค้งบ้านวังแยม และบ้านห้วยผาก						
20	BOU02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านวังแยม
21	BOU02S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองตาเดช
22	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		CB -
23	DAA09R-01	Nonreclosing	Normal		BOU	SCADA	R ท่งแสม
24	แจ้ง กพย.หปร. ปลด Lock คาน BOU01S-07 (SF6 บ้านหนองขอน) ออก						
25	หมายเหตุ กพอ.บพล. แจ้งว่าดับไฟปฏิบัติงานตั้งแต่ DDE จุด A,B บริเวณก่อนโค้งบ้านวังแยม และบ้านห้วยผาก ฟรีไลน์ไว้ประมาณ 1 เดือน						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</u>							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมดับไฟเพื่อเชื่อม DDE จุด A,B บริเวณก่อนโค้งบ้านวังแย้ และบ้านห้วยผาก เข้าระบบ						
27	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		CB -
28	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		BOU	SCADA	R ที่ungsaem
29	BOU02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6 บ้านวังแย้
30	BOU02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองตาเดช
31	ตรวจสอบ BOU01S-07 (SF6 บ้านหนองขอน) อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>OFF</u> และให้ดำเนินการ <u>Lock คาน</u>						
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
36	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		CB -
37	DAA09R-01	Nonreclosing	Normal		BOU	SCADA	R ที่ungsaem
38	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</u>							
40	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลดจุด Short Ground จุด G1						
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลดจุด Short Ground จุด G2						
43	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		CB -
44	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
45	BOU02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านวังแย้
46	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		CB -
47	แจ้ง กพย.หปร. ปลด Lock คาน BOU01S-07 (SF6 บ้านหนองขอน) ออก						
48	แจ้ง กพย.หปร. ปลด Lock คาน BOU02S-05 (SF6 บ้านหนองตาเดช) ออก						
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

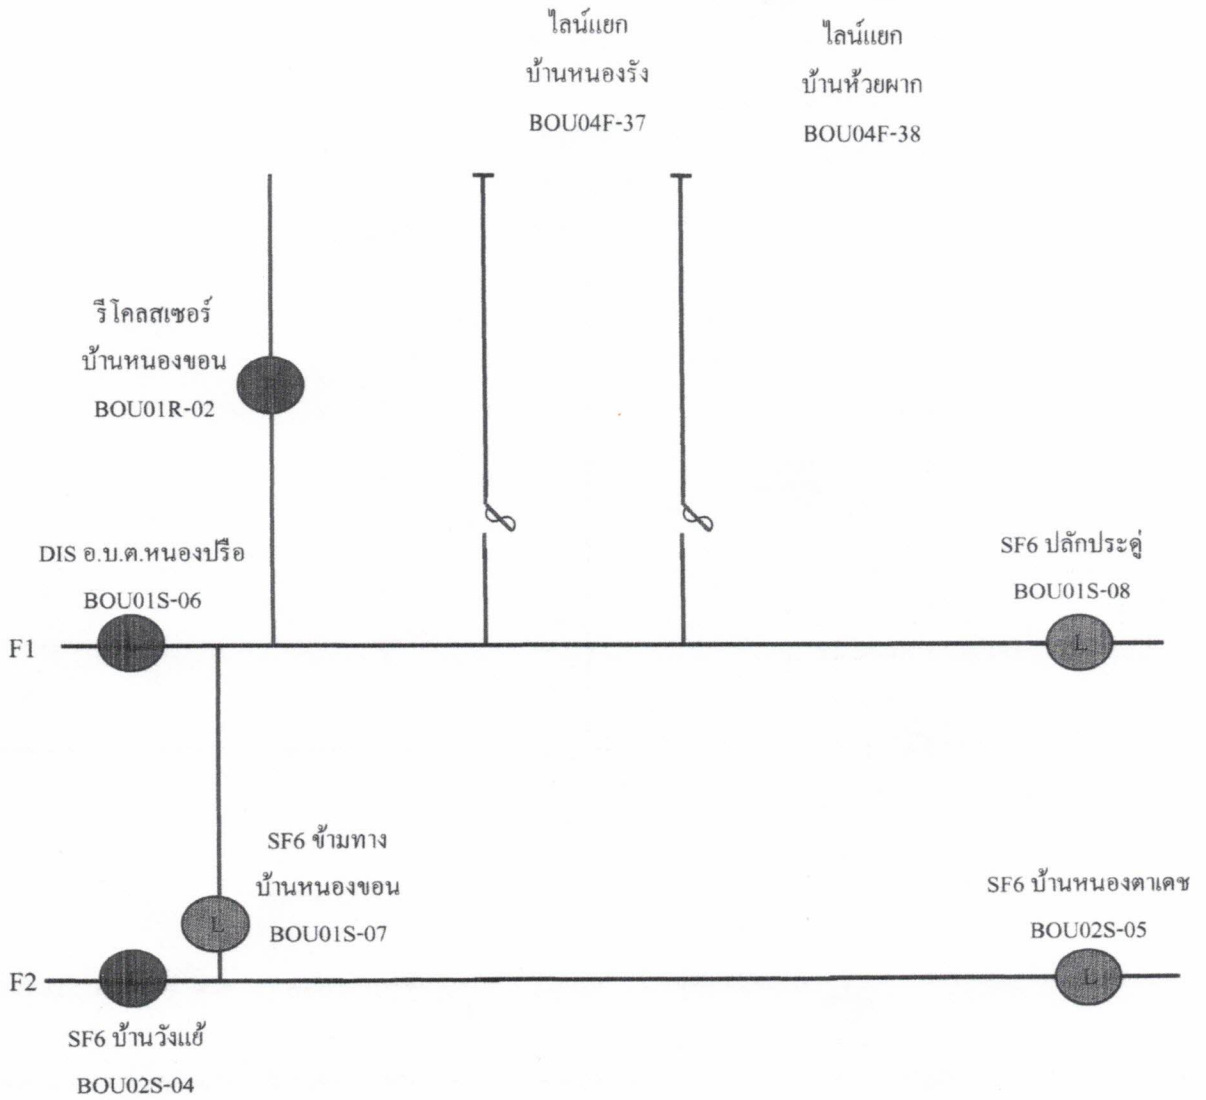


Handwritten signature or mark.


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

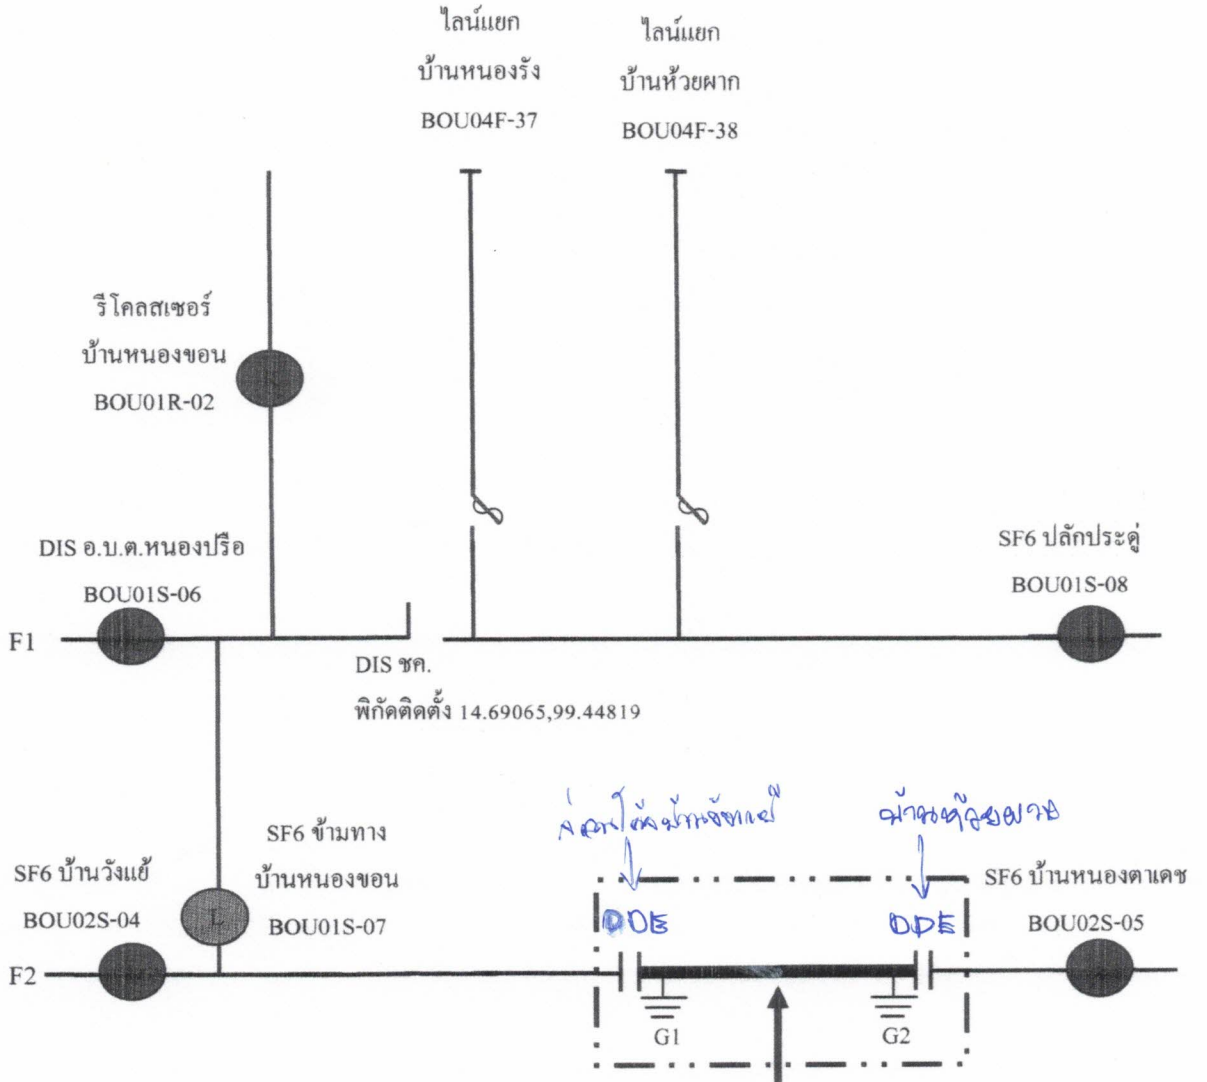

จุดปฏิบัติงาน
ก่อนโค้งบ้านวังแค-ห้วยผาก
รื้อถอนเสา ๑๒ เมตร

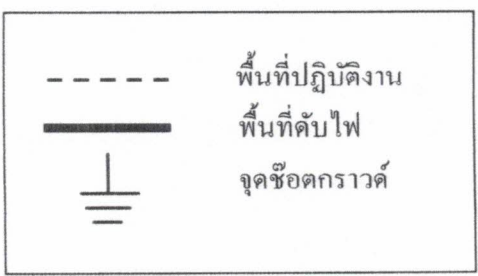

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

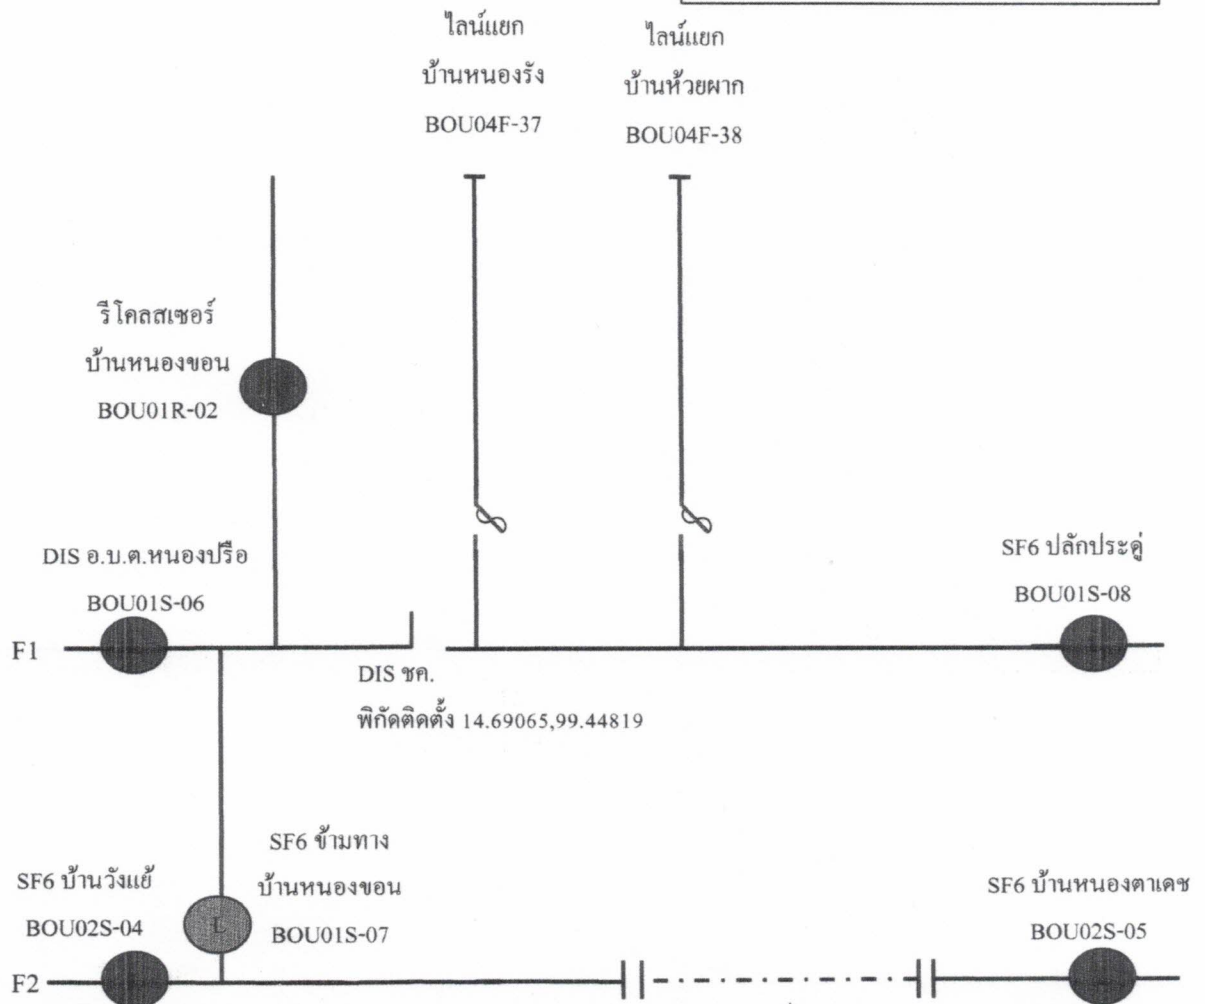

จุดปฏิบัติงาน ฟรีไลน์
ก่อนโค้งบ้านวังแย้-ห้วยผาก
เพื่อรื้อถอนเสา ๑๒ เมตร
