



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

..... 18 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๑๐๓๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูงขนาด ๑๒ เมตร
ในไลน์เมน บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๒	๒๑ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูง ๑๒ เมตร ในไลน์เมน บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	SF๖อบต.หนองปรือ BOU๐๑S-๐๖ DIS ๖ค. ก่อนเข้าชนของรั้ว	SF๖ บ้านปลัก ประจู่ BOU๐๑S-๐๘	นายวิษณุ มีผล พงษ์.๖(ปฟ) โทร.๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพั้ง.....ตำแหน่ง พชง.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๕๖๙๕๒๔.....

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล.....ตำแหน่ง พชง.๖ (ปฟ) โทร.๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BOU01 จาก DIS ชด. คอนบินทอนบุรี BOU015-08
ในวันที่ 21 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1135/67
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ใ้แก้วฉิมนึก ประสานงานขอดับไฟกับ พว. นเวศ นุฒพันธ์
10 ธ.ค. 67


(นาย ศิริวัฒน์ ใ้แก้วฉิมนึก)
อ.ก.ก. 5 แทน ผคฟ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ชนค. กฟล. ๒ปร. กฟล. ๑๗.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนโค้งบ้านวังแยม-ห้วยผาก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูง BOU01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1135/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก				วันที่	10 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	10 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	10 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานใกล้เคียง 1134/67 รื้อถอนย้ายแนวเสาแรงสูง BOU02						
3	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-
4	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.	R	บ้านเขาช่องคืบ
5	ตรวจสอบ BOU01S-08 (SF6 ปลักประตู) อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โข้ว <u>OFF</u> และให้ดำเนินการ <u>Lock คาบ</u>						
6	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
7	DIS ชค. BOU01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทปร.		DIS ก่อนบ้านหนองรัง
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานตัด DDE จุด A และจุด B วงจร BOU01 ตามผังแนบได้						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานตัด DDE จุด A และจุด B วงจร BOU01 ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
16	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-
17	LWA07R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.	R	บ้านเขาช่องคืบ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-
20	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.	R	บ้านเขาช่องคืบ
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
23	- ฟรีไลน์ จาก DDE จุด A ถึง DDE จุด B ประมาณ 1 เดือน (ไม่มีผู้ใช้ไฟ)						
24	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟไปชนจุดที่ตัด DDE ทั้ง 2 ด้าน						
25	DIS ชค. BOU01	ปลด	สับ		ทปร.		DIS ก่อนบ้านหนองรัง



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	BOU01S-08	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6	ปลักประตู
27	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-	-
28	LWA07R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R	บ้านเขาช่องคับ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง								
29	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานจุด DDE จุด A ถึง DDE จุด B แล้วเสร็จ							
30	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		-	-
31	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R	บ้านเขาช่องคับ
32	- เมื่อพร้อมดับไฟ							
33	DIS ชค. BOU01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS	ก่อนบ้านหนองรัง
34	BOU01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6	ปลักประตู
35	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
38	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานเชื่อม DDE จุด A และจุด B วงจร BOU01 ตามผังแนบได้							
41	เมื่อผู้ควบคุมงานเชื่อม DDE จุด A และจุด B วงจร BOU01 ตามผังแนบแล้วเสร็จ							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
44	- เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับ							
45	DIS ชค. BOU01	ปลด	สับ		หปร.		DIS	ก่อนบ้านหนองรัง
46	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-	-
47	LWA07R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R	บ้านเขาช่องคับ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

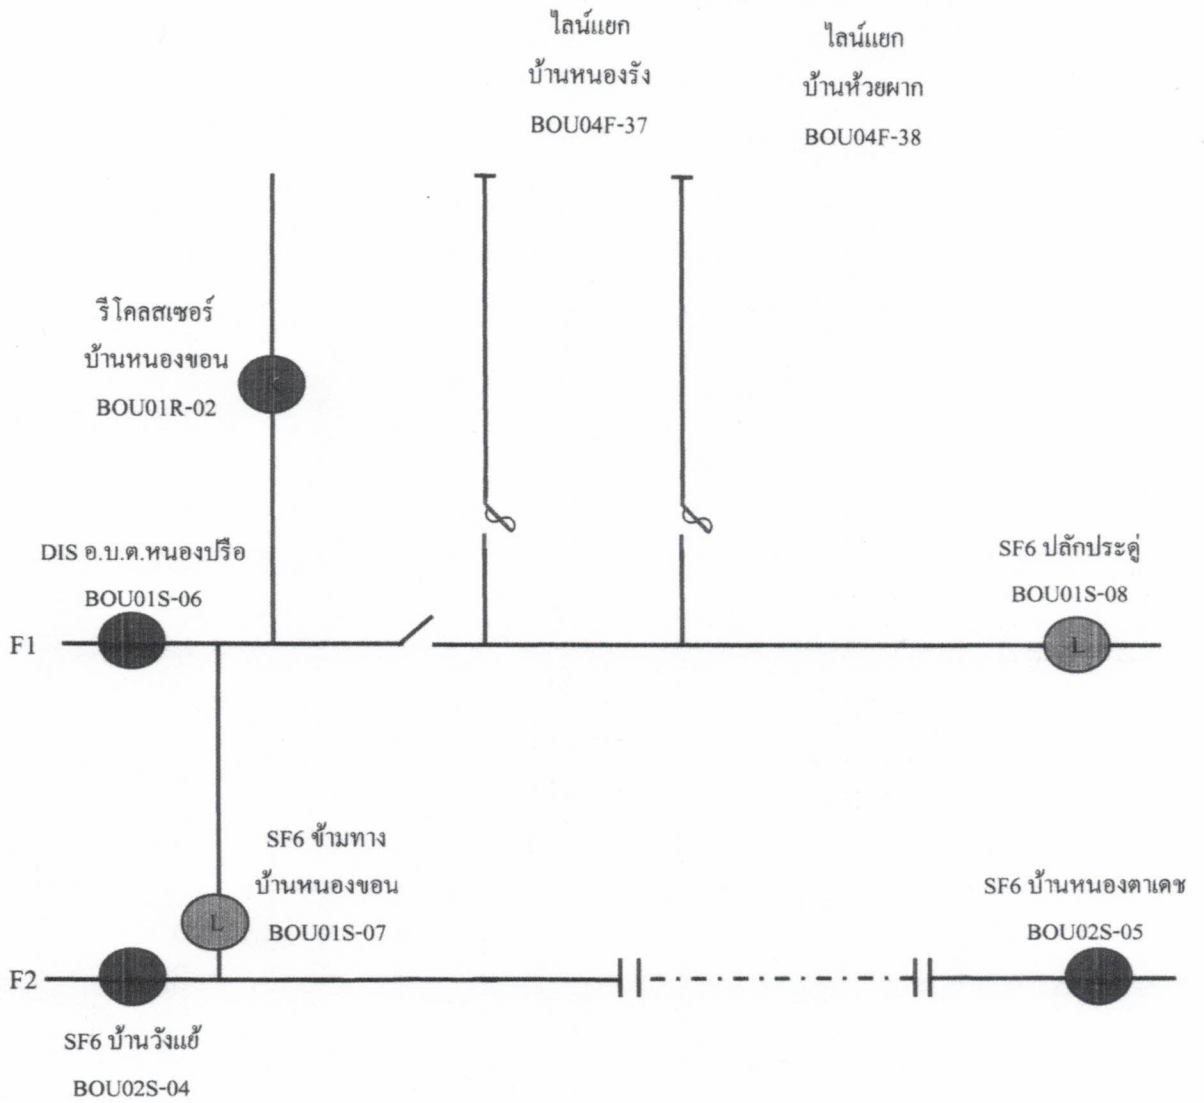

Handwritten signature or mark.


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

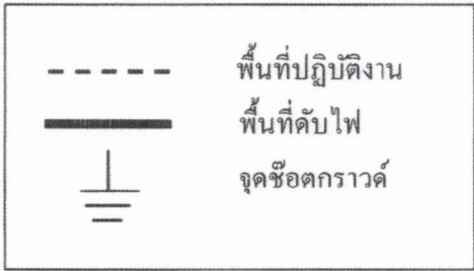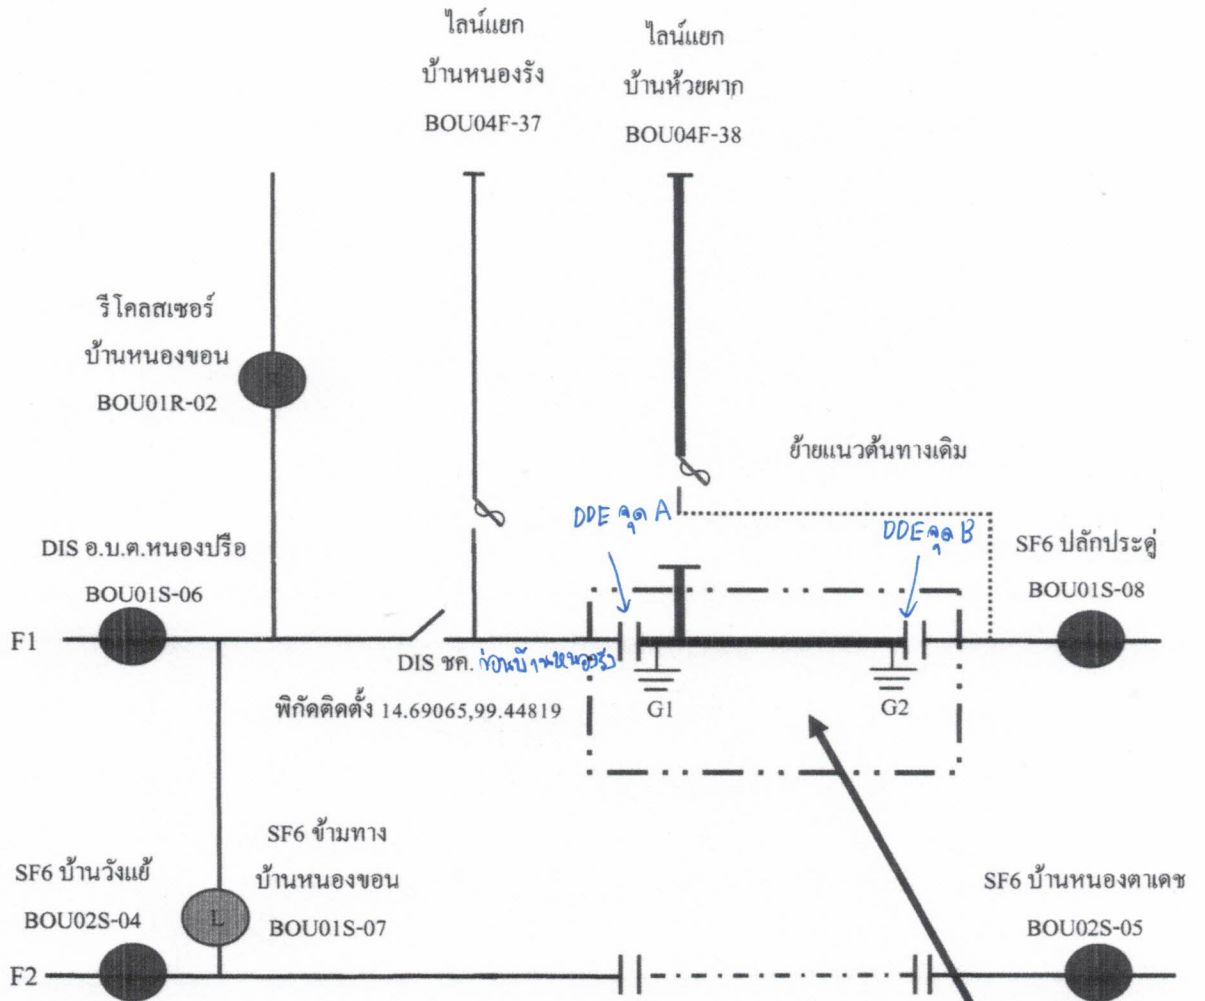

จุดปฏิบัติงาน
ก่อนโค้งบ้านวังแย้-ห้วยผาก
รือถนนเสา ๑๒ เมตร

Handwritten mark

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

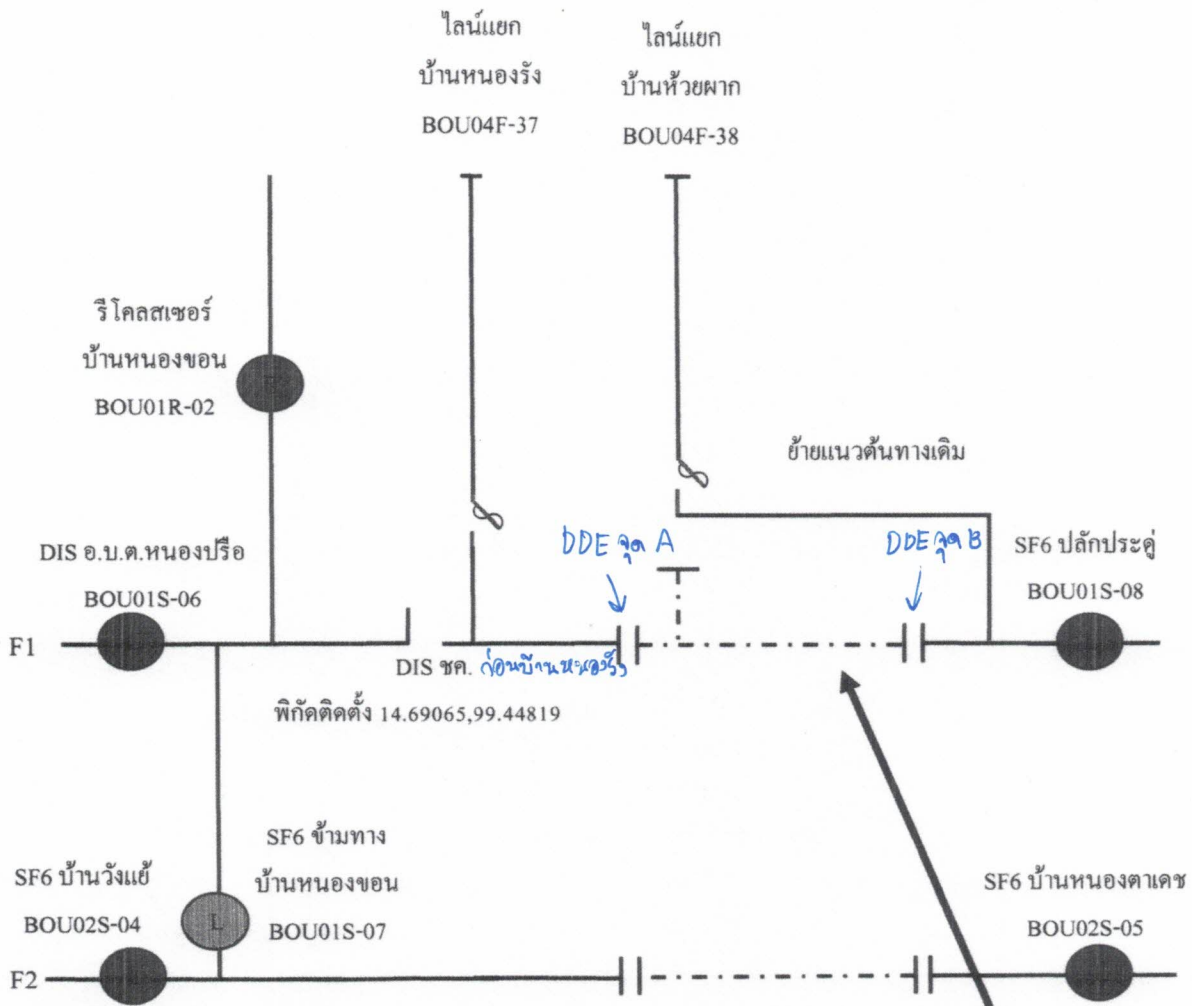

จุดปฏิบัติงาน
ก่อนโค้งบ้านวังแย้-ห้วยผาก
รื้อถอนเสา ๑๒ เมตร

Handwritten signature or mark.
