

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๕๘/๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัช
 ชื่อผู้ส่ง นายมานโชน วาสุกีรี

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ...ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม...
 สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--|--|---|
| ๑. | KTE ๐๒ | ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗ | ๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม | เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๘๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม | เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-TG๓ หมายเลข ๒๗๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม | นายนพพร ชาวไชยศรี ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK ๗๒๔๗A) จนถึง ฝั่งตรงข้าม
 ตรอ.เจริญทรัพย์ มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat, Long : ๑๓.๖๓๕๔๙๖, ๑๐๐.๒๒๒๓๒๔
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat, Long : ๑๓.๖๓๕๑๕๓, ๑๐๐.๒๑๗๖๘๒

(นายมานโชน วาสุกีรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.กทบ.

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ KTE2 Dis ต. เจริญทรัพย์ Dis ต. ๗๐๐ / วิทยุโทร. 1
 ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1137/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บรรณพงษ์ หกทต. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผ.จก.

กฟส.กทบ. กฟส.กท. ๒(คฟ๒)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอรรถพร ชาวไชยศรี) 1
 ๐๘๗. 5๖๗๖๗.๐๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | KTE02 DISชค.เสาสัญญาณทรู ถึง DISชค.ตรอ.เจริญทรัพย์ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 ส.ค. 67 | เวลา | 08.30 น. | ถึง เวลา | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.กทบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1137/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวรรณพงษ์ นกเทศ | | | วันที่ | 6 สิงหาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 6 สิงหาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 6 สิงหาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิราวัฒน์ นายวีรวัชร, นายพิชชา, นายวัฒนา, นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, วรรณพงษ์ | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | 3. นางสาวสุภักษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นายพิรภัทร | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | KTE02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | | โหลด 0.7MW |
| 3 | KTE03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | | โหลด 5.1MW |
| 4 | - ย้ายโหลด KTE02 ไปจ่ายไฟจาก KTE03 | | | | | | |
| 5 | KTE02S-16 | ปลด | สับ | | บพว. | SCADA | SF6 แสนร์กรีสมอร์ท |
| 6 | DISชค.KTE02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | | DIS ตรอ.เจริญทรัพย์ |
| 7 | - ดับไฟ เวลา 08.30น. | | | | | | |
| 8 | DISชค.KTE02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กทบ. | | DIS เสาสัญญาณทรู |
| 9 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กทบ. รับทราบ | | | | | | |
| 10 | แจ้งให้ กฟส.กทบ. ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด | | | | | | |
| 11 | ทำการ Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 12 | ทำการ Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 13 | แจ้ง กฟส.กทบ. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 14 | KTE02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTE | | |
| 15 | KTE03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTE | | |
| | สิ้นสุด Switching เข้า | | | | | | |
| 16 | เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 17 | KTE02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | | |
| 18 | KTE03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | | |
| 19 | ทำการปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | ทำการปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | - จ่ายไฟ | | | | | | |
| 22 | DISชค.KTE02 | ปลด | สับ | | กทบ. | | DIS เสาสัญญาณทรู |
| 23 | - ย้ายโหลด KTE02 ไปจ่ายไฟจาก KTE03 | | | | | | |
| 24 | DISชค.KTE02 | ปลด | สับ | | กทบ. | | DIS ตรอ.เจริญทรัพย์ |
| 25 | KTE02S-16 | สับ | ปลด | | บพว. | SCADA | SF6 แสนร์กรีสมอร์ท |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 26 | KTE02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTE | | |
| 27 | KTE03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTE | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A) จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)

จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ตรอ.เจริญทรัพย์

เสาสัญญาณ TRUE



สายส่ง
BNP - KTE

สายส่ง
BNP - KTE

KTE07

KTE07

ถ. สค 3011

สับ



KTE02 DIS.ชั่วคราว
(เสาต้น DDE
ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง
SD-SA2 หมายเลข 271)

สับ



DIS.ชั่วคราว
(เสาต้น DDE
ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง
SD-SA2 หมายเลข 281)

KTE02

ไป อ.บ้านแพ้ว




ไปสะพานท่าจีน 2



หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1 ราย

แผนผังสถานปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A) จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)
 จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

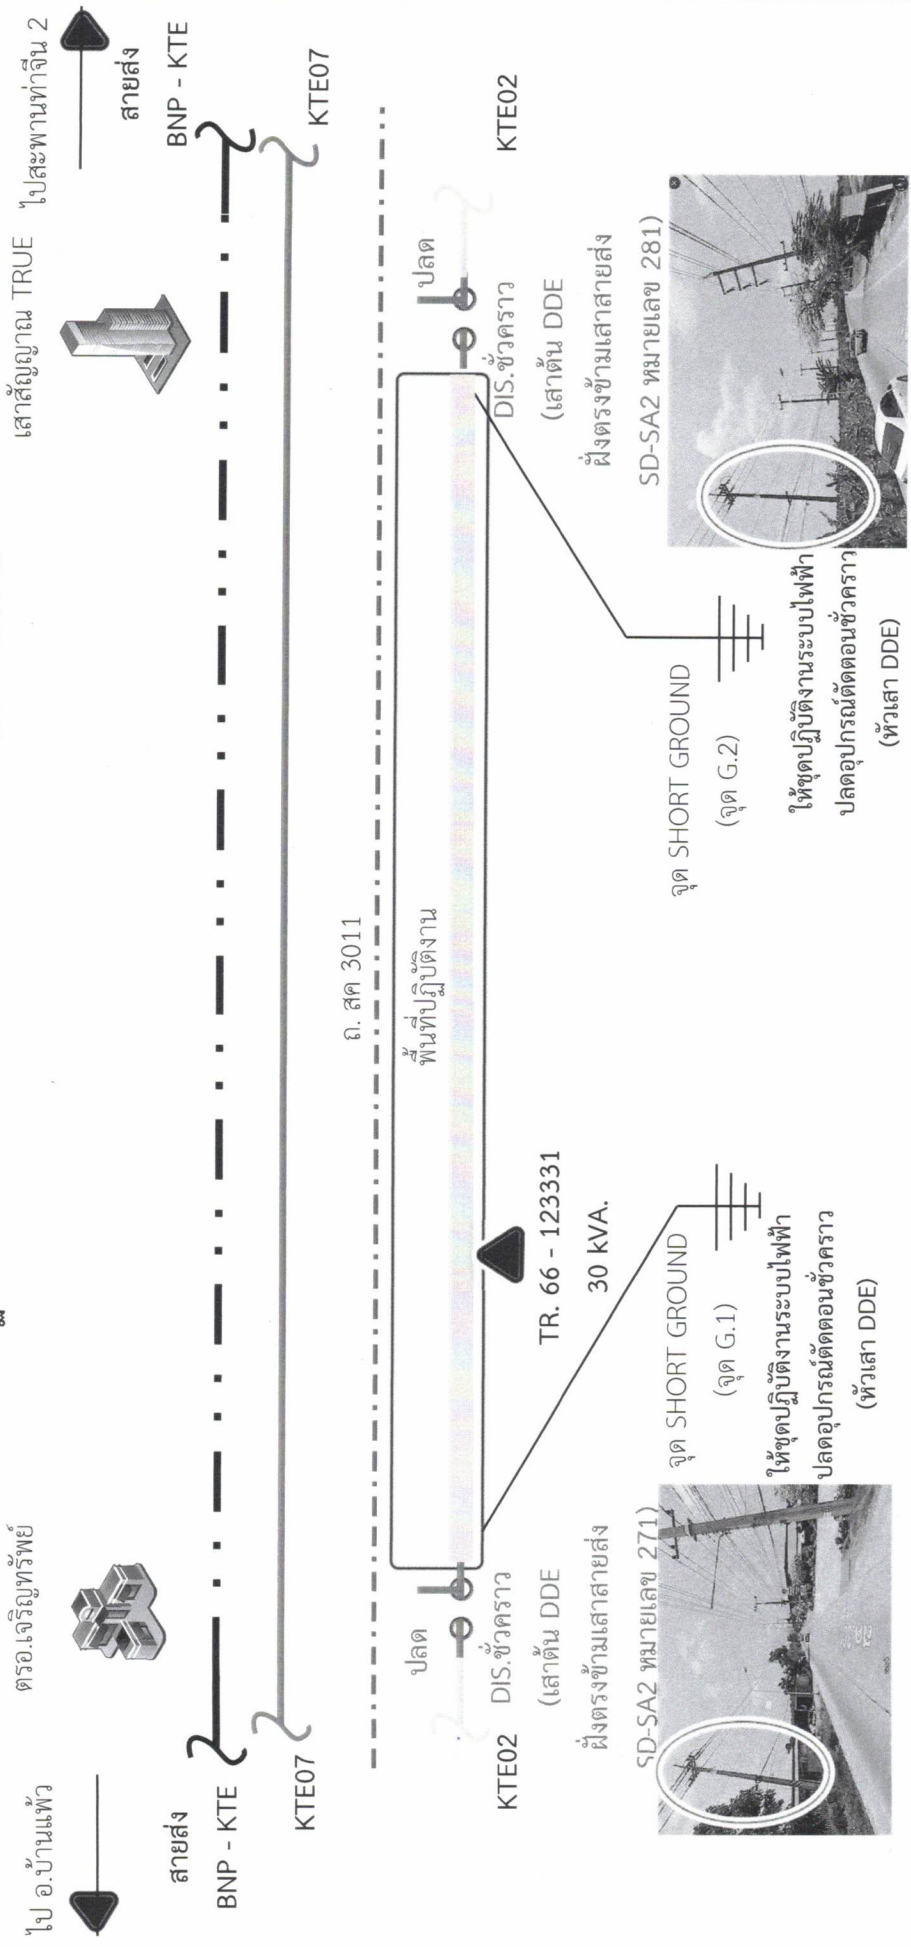

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 1 ราย

พื้นที่ดับไฟ
