



Switching Deadline

28 ก.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต...../๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายทัตธนันท์ ทวีธาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและปักเสา บริเวณแหล่งปูนมั่นคงดี-Disชั่วคราวบางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๑	๒๕/๐๗/๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง รองรับงานเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชุมชนไทรหน้าหอคอย บรรหาร	DDEถนนพระ ทันวา	DDEธ.นคร หลวงไทย	โทร.๐๘๔-๒๕๕๓๖๔๐ นายทิบูล ปานข้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชจ.๖ (สช.) โทร ๐๘๑-๔๔๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวาณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกัดเคอร์..... จาก DDE ถนนพระทันวา ถึง DDE ธ. นครหลวงไทย

ในวันที่ ๒๙ กค ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1149/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่าง จิตรธนะศักดิ์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป.

(นาย สว่าง จิตรธนะศักดิ์ ๖๖ โฉมใหม่)
อก.๕ ๖๖๗๔ เข.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	DDE ถนนพระพินา - DDE ๓.นครหลวงไทย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ท่า	รือถอนและปักเสา	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1149/66	
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	27 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	27 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	27 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายมโน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง							
1	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- Load 2.8 MW
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- Load 6.3 MW
4	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปปรับไฟจาก SPA07						
5	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอตรล รพ.
6	SPA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ธนาคารนครหลวงไทย
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทย (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
8	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทย (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 2 จุดได้						
11	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
12	SPA10S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ธนาคารนครหลวงไทย
13	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทยเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
14	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทยเข้า(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ.ทราบ						
16	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
18	เมื่อ กฟจ.สพ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
21	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
22	แจ้ง กฟจ.สพ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กฟจ.สพ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
26	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
27	แจ้ง กฟจ.สพ.ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้ง กฟจ.สพ.ปลด Short Ground จุด G2						
29	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทย (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
30	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทย (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
31	SPA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ๓.นครหลวงไทย
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 2 จุดได้						
34	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
35	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทยเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
36	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS SPA10S-04 - DDE ๓.นครหลวงไทยเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
37	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA07						
38	SPA10S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ๓.นครหลวงไทย
39	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอตจร รพ.
40	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
42	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๕ ก.ค.๖๕ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... ถนนขุนไกร เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดิน โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์...๑๐...สถานี...สุพรรณบุรี ๑ ...ตั้งแต่บริเวณ.. DDEถนนพระทันวา- DDEถนนนครหลวงไทย

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายพิบูล ปานข้า ตำแหน่ง ชม.ปบ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายธนัช มาลัยวงษ์ ตำแหน่ง หม.ปบ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..โทร ๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

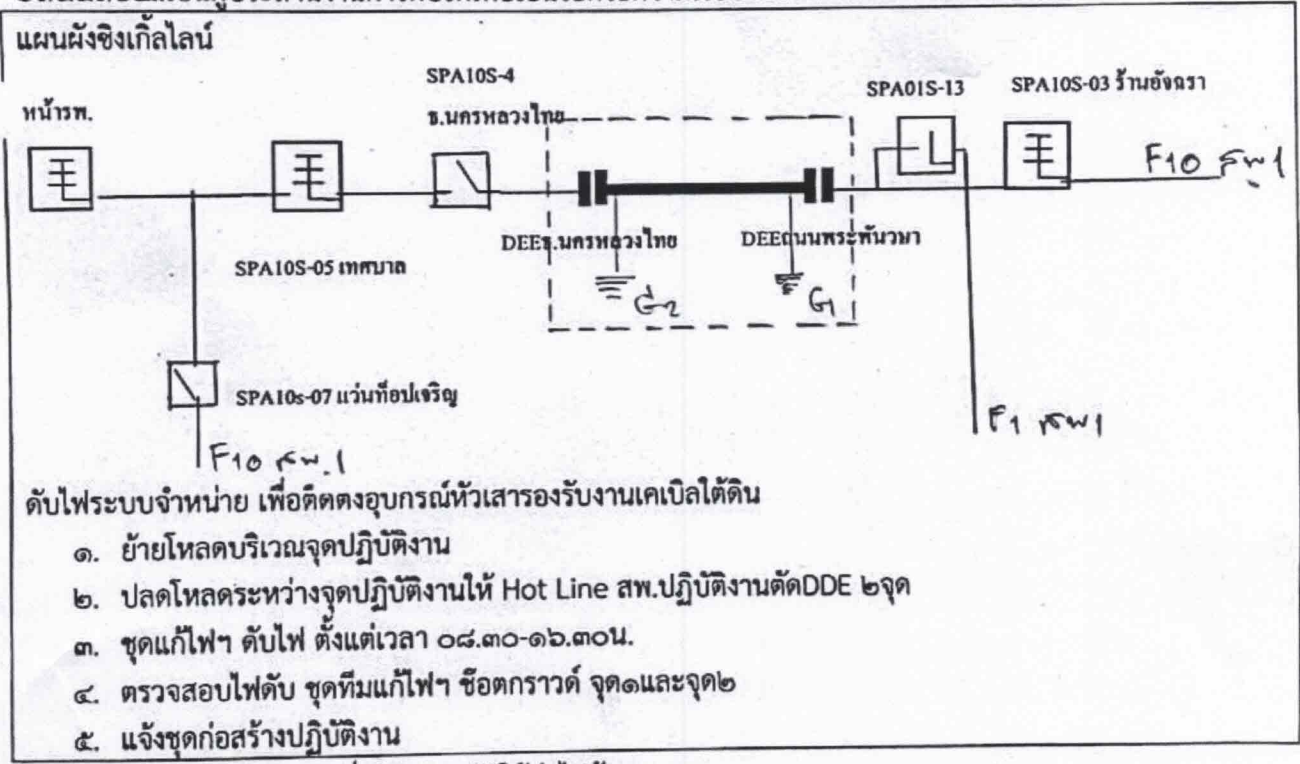

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.ผบ.กฟจ.สพ.)

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
