



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.) ๗๐๐/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านข้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด้านข้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F9 ด้านข้าง	๑๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	รื้อถอน DIS DAA๙S-๐๖ เปลี่ยนเป็น SF๖ และรื้อถอน เสา ๑๒ ม. เปลี่ยนเป็น ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๗ ต้น	DAA9S-06	สุดไลน์	นายอัศดา คงลัดดา โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไลน์บ้านวังน้ำโจน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติวินโชค ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๙๙-๕๖๓๔๙๙๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านข้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA 9 จาก DAA9S-06 ถึง สุดไลน์
ในวันที่ 11 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1157/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังสินธุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ธนาเดช กิตติวินโชค

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นร.๐๗.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

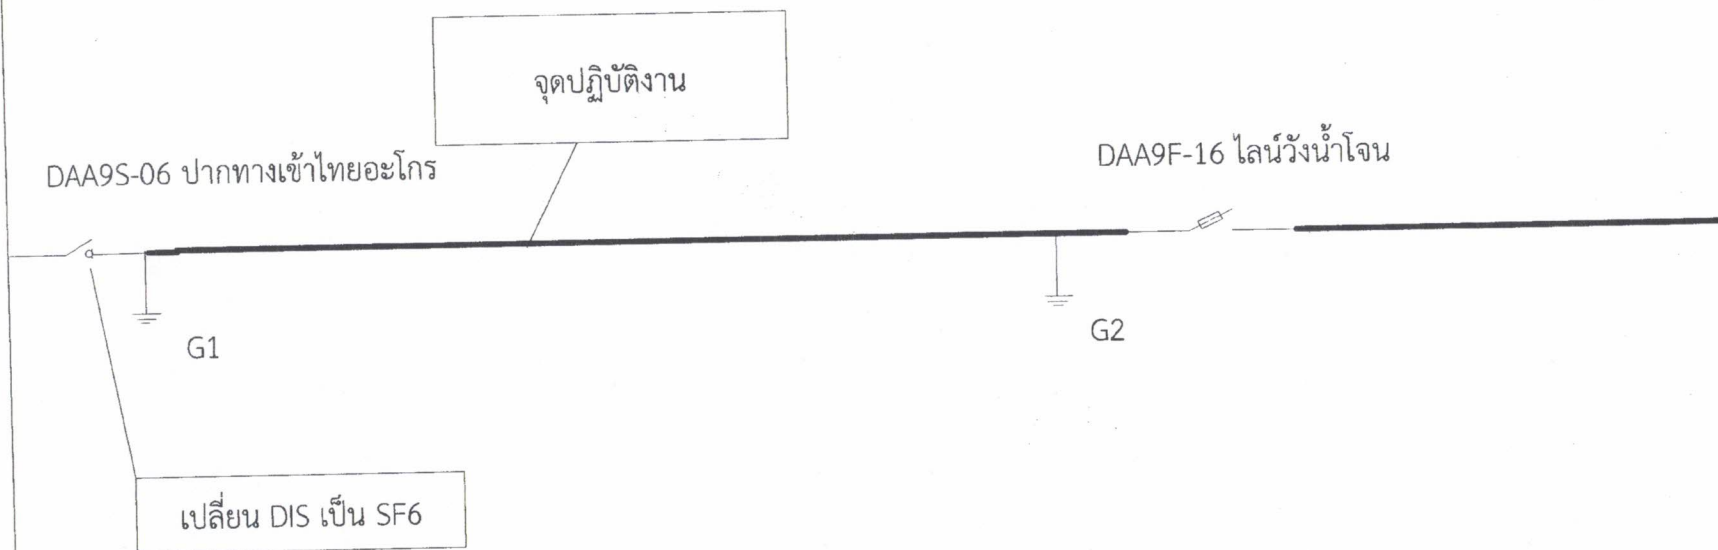
1. สถานที่ทำงาน ปากทางเข้าไทยอะโกร (DAA09)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ก.ค. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1157/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวคิน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
3	ดับไฟย้ายโหลดในส่วนของ กฟส.หนองหญ้าไซ (เปลี่ยนขนาด D/O บ.สวนส้ม ขนาด 15 A เป็น 30 A)						
4	Drop บ.สวนส้ม	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ.สวนส้ม
5	หลังจากเปลี่ยนขนาด D/O บ.สวนส้ม ขนาด 15 A เป็น 30 A แล้วเสร็จ						
6	Drop บ.วังน้ำโจรส	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ.วังน้ำโจรส
7	Drop บ.สวนส้ม	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ.สวนส้ม
8	Drop บ.ดงเชือก	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ.ดงเชือก
9	- ดับไฟไลน์ DAA09 เวลา 09.00 น.						
10	DAA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ปากทางเข้าไทยอะโกร
11	แจ้ง Hot Line ทำการปลด PG ก่อนเข้า DAA09S-06 ปากทางไทยอะโกร ได้						
12	หลังจาก Hot Line ทำการปลด PG ก่อนเข้า DAA09S-06 ปากทางไทยอะโกร เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
17	แจ้ง กฟส.ดช. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
19	หลังจาก กฟส.ดช. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
20	เมื่อ กฟส.ดช. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยัน We Safe						
21	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
22	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
24	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
25	- จ่ายไฟ						
26	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ รหัส DAA09S-06 ปากทางไทยอะโกร อยู่สถานะ OPEN+Lock						
27	แจ้ง Hot Line ทำการจัม PG ก่อนเข้า DAA09S-06 ปากทางไทยอะโกร ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจาก Hot Line ทำการจี้ม PG ก่อนเข้า DAA09S-06 ปากทางไทยอะโกร เสร็จเรียบร้อย						
29	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
30	DAA09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 ปากทางเข้าไทยอะโกร
31	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
32	ดับไฟย้ายโหลดในส่วนของ กฟส.หนองหญ้าไซ						
33	Drop บ.ดงเขือก	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ.ดงเขือก
34	Drop บ.วังน้ำโจรส	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ.วังน้ำโจรส
35	Drop บ.สวนส้ม	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ.สวนส้ม
***** สิ้นสุด Switching *****							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานรื้อถอน DIS DAA9S-06 เปลี่ยนเป็น SF6
และรื้อถอนเสา 12 ม. เปลี่ยนเป็น 12.20 ม. จำนวน 7 ต้น กฟสอ.ด่านช้าง

F9 สถานีด่านช้าง



ขอทไลน์กระเช้าสุพรรณ ปลดพีจี ต้น BA ให้
