



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๓๖๕๖ /๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
 ชื่อผู้ส่ง นายสนชัย ไตรัสมี

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖
 ตำแหน่ง อภ.ปม.(ก๓)
 ตำแหน่ง วศก.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า...กฟง.สค.ชั้น๑...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ปากทางวัด
 บางสีคต ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๓	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ปากทางวัดบางสีคต	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ปุ่มเซลล์ ไข่มุก	DIS ติดตั้งชั่วคราว เลยปากทางวัดบาง สีคต	นายสมพจน์ อางน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๘๘๓๓๓
๒	SMB๐๘	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๘S-๐๔ ปุ่มเซลล์ไข่มุก	SMB๘S-๐๗ ปากทางวัดบางสีคต	
๓	SMB๐๘	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๘S-๐๗ ปากทางวัดบางสีคต	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ปากทางวัด บางสีคต	
๔	SMB๐๘	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๘S-๐๔ ปุ่มเซลล์ไข่มุก	SMB๘S-๐๕ สะพานลอยบาง กระเจ้า	
๕	SMB๑๓	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๑	SMB๑๓S-๐๒ ปากทางวัดบางสีคต	
๖	SMB๑๓	๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๓S-๐๒ ปากทางวัดบางสีคต	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ปากทางวัด บางสีคต	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ปากทางวัดบางสีคต.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เขียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทผ.ปน.....โทร.....๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสนชัย ไตรัสมี)

ตำแหน่ง.....วศก.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMB03 จาก DDE ไปชดเชยไฟหมอก ถึง DTS ซก. เลขปากทาวัดบนวัดสัตตา
ในวันที่ 6 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1159/66


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 พัดเตอร์ SMB08 จาก SMB85-04 ถึง SMB85-05
ในวันที่ 6 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SMB85-07 ถึง DDE ปากทาวัดบนวัดสัตตา
SMB85-04 ถึง SMB85-07

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5, 6 พัดเตอร์ SMB13 จาก SMB135-01 ถึง SMB135-02
ในวันที่ 6 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SMB135-02 ถึง DDE ปากทาวัดบนวัดสัตตา

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิระวัฒน์ แก้วสงัด ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ไธมาศ เกษมมาตย์


(นาย ศิริวัฒน์ แก้วสงัด)
จศก. 5 เขตฯ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ๑.ลค. กฟ๑.บพอ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3 แผ่น

แผนผังแนบ..... 2 แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางวัดบางสีดต				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1159/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	27 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	กชพร			วันที่	27 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นางสาวพิชชา, นายสามารถ, นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	Load 4.1 MW.
6	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	Load 7.7 MW.
7	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	Load 4.2 MW.
8	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW	-	-
9	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW	-	Load 6.2 MW.
10	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW	-	Load 4.2 MW.
11	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME	-	-
12	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME	-	-
13	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	Load 1.8 MW.
14	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	Load 4.2 MW.
15	SMB04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		R ข้างวัดช่องลม
16	ย้ายโหลด SMB 4 กลับจาก SMW 3						
17	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	-	-
18	SMB04S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ป้อน PT ก่อนปากทางท่าฉลอม
19	ย้ายโหลด SMB 3 ไปจ่ายจาก SME 1						
20	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
21	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME	-	ขนานบัส
22	SMB08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
23	SMB03S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 หน้า CP
24	DIS ชด.ไลน์ SMB 03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS เลยกปากทางวัดบางสีดต
25	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME	-	ขนานบัส
26	ย้ายโหลด SMB 8 บางส่วนไปจ่ายจาก SME 6						
27	SMB04S-13	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 วัดกระเช้าขาว
28	SMB08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
29	ย้ายโหลด SMB 8 บางส่วนไปจ่ายจาก SMB 4						
30	SMB08S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยกระเช้าขาว
31	SMB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6 ปากทางวัดบางสีดต

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SMBBVB-01	ล๊اب	ปลด		SMB		- ขนานบัส
33	ย้ายโหลด SMB 13 ไปจ่ายจาก SMW 2						
34	SMB13S-05	ปลด	ล๊اب		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
35	SMB13S-02	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6 ปากทางวัดบางสีดต
36	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
37	SMB13VB-01	ล๊اب	ปลด		สค.		-
38	SMB13S-01	ล๊اب	ปลด		สค.		POT HEAD F.13
39	SMB08S-04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บั้มเซลล์ไข่มุก
40	แจ้ง Hotline ตัด DDE บริเวณบั้มเซลล์ไข่มุก 1 จุด บริเวณปากทางวัดบางสีดต 2 จุด ตามผัง (ไม่มีโหลด)						
41	เมื่อ Hotline ตัด DDE บริเวณบั้มเซลล์ไข่มุก 1 จุด บริเวณปากทางวัดบางสีดต 2 จุด ตามผังแล้วเสร็จ						
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
43	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
44	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
45	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G3						
46	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G4						
47	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G5						
48	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G6						
49	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G7						
50	เมื่อไฟฟ้านำงาน ทำการเตสไฟ และซ็อดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
51	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
52	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
53	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
56	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
57	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
58	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
59	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
60	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
61	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
62	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
63	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
64	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
65	SMB04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		R ข้างวัดช่องลม
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
66	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ						
67	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
69	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
70	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
71	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
73	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
74	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
75	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
76	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
77	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
78	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
79	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
80	SMB04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		R ข้างวัดช่องลม
81	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G1						
82	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G2						
83	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G3						
84	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G4						
85	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G5						
86	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G6						
87	แจ้งหน่วยงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G7						
88	แจ้ง Hotline เชื่อม DDE บริเวณบึงเขลลิ่งหมู่ 1 จุด บริเวณปากทางวัดบางสีคต 2 จุด ตามผัง (ไม่มีไหลต)						
89	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE บริเวณบึงเขลลิ่งหมู่ 1 จุด บริเวณปากทางวัดบางสีคต 2 จุด ตามผังแล้วเสร็จ						
90	SMB08S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS บึงเขลลิ่งหมู่
91	SMB13S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.13
92	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		สค.		-
93	ย้ายไหลต SMB 13 กลับจาก SMW 2						
94	SMB13S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางวัดบางสีคต
95	SMB13S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
96	ย้ายไหลต SMB 8 บางส่วนกลับจาก SMB 4						
97	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
98	SMB08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางวัดบางสีคต
99	SMB08S-11	สับ	ปลด		สค.		DIS ปากซอยกระเช้าขาว
100	ย้ายไหลต SMB 8 บางส่วนกลับจาก SME 6						
101	SMB08S-05	ปลด	สับ		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
102	SMB04S-13	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 วัดกระเช้าขาว
103	ย้ายไหลต SMB 3 กลับจาก SME 1						
104	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
105	DIS ชด.ไลน์ SMB 03	ปลด	สับ		สค.		DIS เลยปากทางวัดบางสีคต
106	SMB03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หน้า CP
107	SMB08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
108	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
109	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
110	ย้ายไหลต SMB 4 ไปจ่ายจาก SMW 3						
111	SMB04S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บึง PT ก่อนปากทางท่าฉลอม
112	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
114	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
115	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
116	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
117	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
118	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
119	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
120	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
121	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
122	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
123	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
124	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
125	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
126	SMB04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		R ข้างวัดช่องลม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

การประเมินความพร้อมในการดำเนินงาน

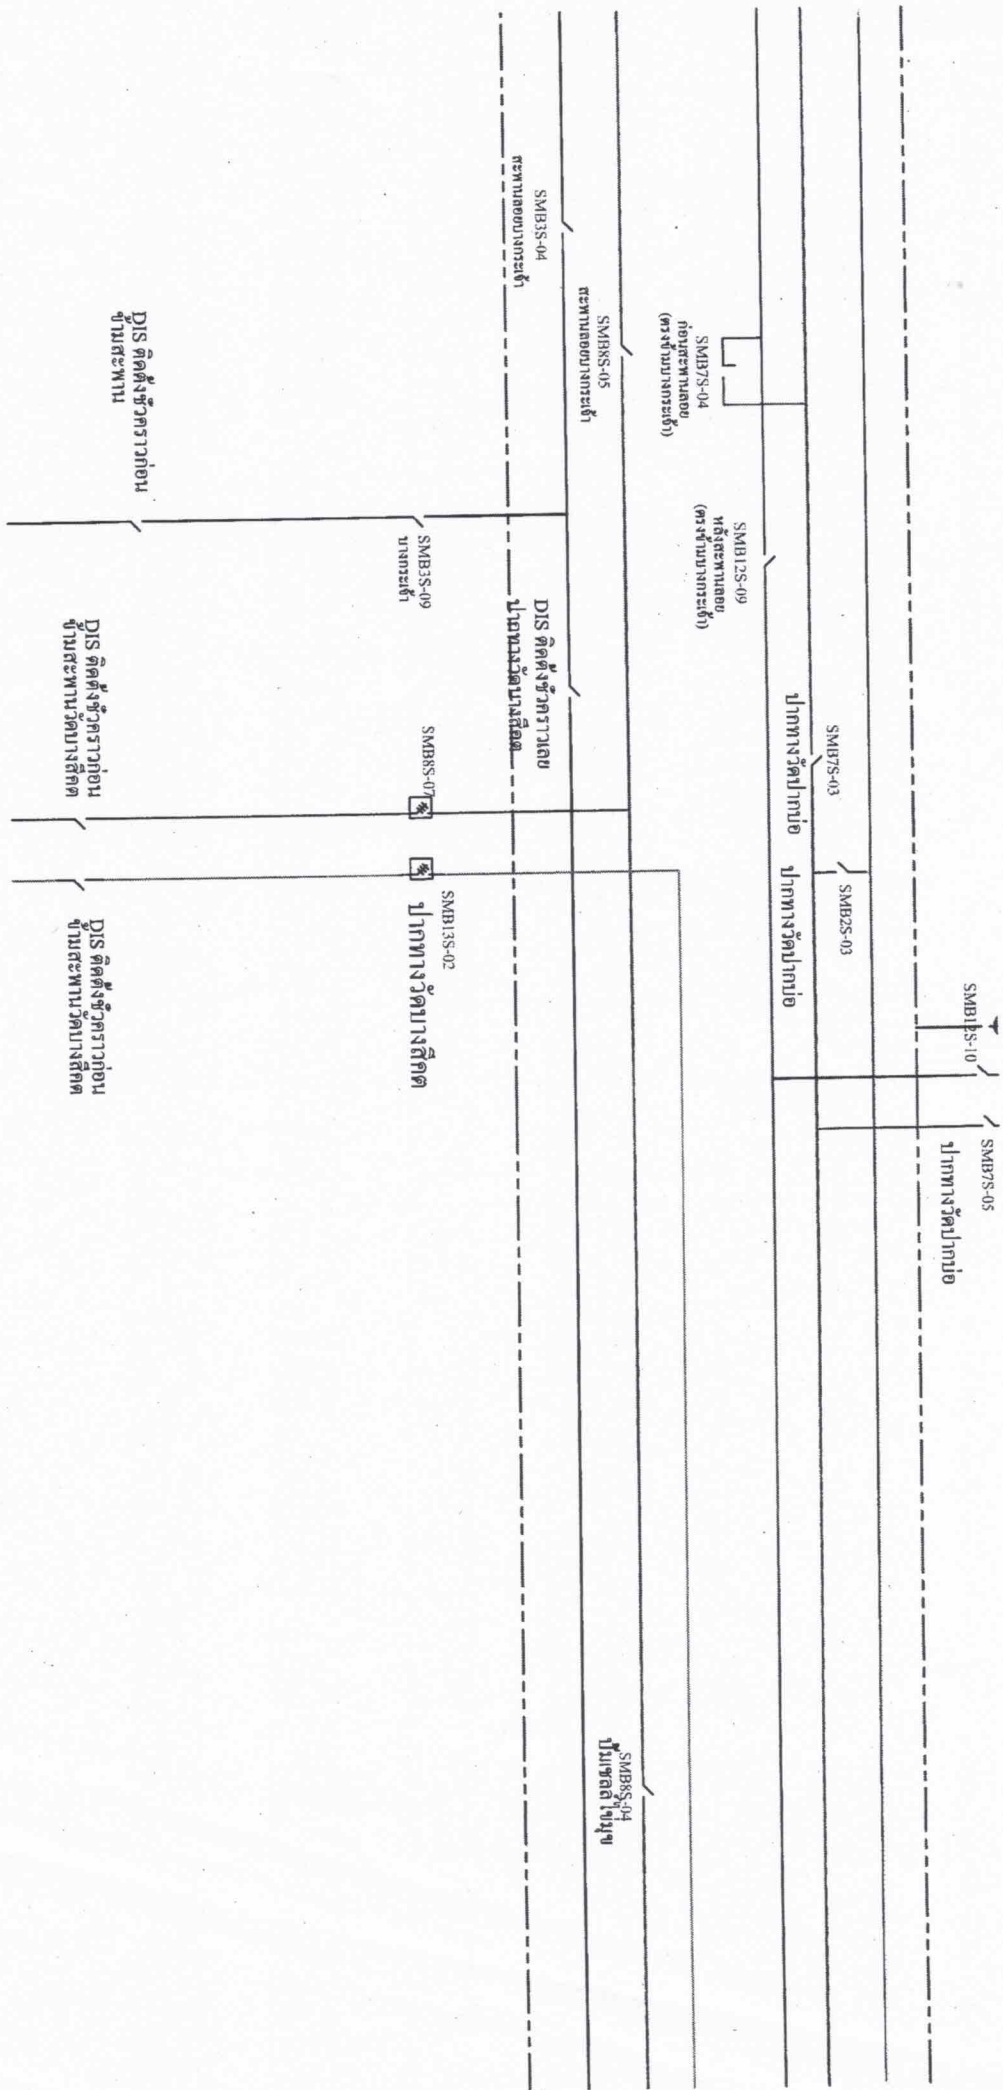

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

