



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓...../๑๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โคทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย...เจ็ทสุววรรณ.....

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟภ.สท.....

Switching Deadline
วันที่ 13 ก.ค. 65

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา, รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9สท.	16/07/65	08.00	17.00	ปักเสาแรงสูง รองรับงาน สถานีสุพรรณบุรี๒	Dis ชั่วคราว เกาะ	Dis SPA085-08 บ่อปลาศิริเพ็ญ	โทร.๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๔
						DDEจุดA	DDEจุดB	นายบิชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายสมบุญรัตน์...สุววรรณ...ตำแหน่ง...ร.จ.ก.(ท.)...โทร...๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายชัชชัย เจ็ทสุววรรณ)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟภ.สท.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คพ. ทิวธารมาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ 9PA09 จาก DDEจุด A ถึง DDEจุด B


ในวันที่ 16.๖.๖5 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1165/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิกัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สมบุญรัตน์ สิงห์โคทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. ชัชชัย สุววรรณ

10 ก.ค. 65


นายชัชชัย เจ็ทสุววรรณ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. ร.ก.ป.บ. ร.ก.ป.บ. ร.ก.ป.บ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.มุกเพชร - DIS SPA08S-08 บ่อปลาศิริเพ็ญ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SPA09	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1165/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมษ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	SCADA	-
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	SCADA	-
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	SCADA	-
4	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	SCADA	-
5	SPA08R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.	SCADA	R คั่นคลองวัดป่า
6	SPA09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
7	BAM02R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
8	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM02						
9	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
10	BAM02S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SF6	สี่แยกมะขามล้ม
11	DIS ชค.ไลน์ BAM02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	มุกเพชร
12	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
13	ย้ายโหลด SPA09 ด้านหลังบางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA09 วงจรเดียวกัน						
14	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	DIS หมู่บ้านจามจุรี
15	SPA08S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	บ่อปลาศิริเพ็ญ
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
17	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดตัด DDEจุด A,B (ตามผังแนบ)						
18	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลดบริเวณจุดตัด DDEจุด A,B แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง HL กฟจ.สพ.ทำการตัด DDE จุด A,B ออกทั้ง 3 เฟสได้						
20	เมื่อ HL กฟจ.สพ.ทำการตัด DDE จุด A,B ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
25	หลังจากชดปฏิบัติงาน Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.สพ.รับทราบและปฏิบัติงานได้							
27	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	SCADA	-	-
28	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	SCADA	-	-
29	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	SCADA	-	-
30	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	SCADA	-	-
31	SPA08R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
32	SPA09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
33	BAM02R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	บ้านสูตร
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
34	เมื่อ กฟจ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
35	หลังจาก กฟจ.สพ.ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
36	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	SCADA	-	-
37	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	SCADA	-	-
38	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	SCADA	-	-
39	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	SCADA	-	-
40	SPA08R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
41	SPA09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
42	BAM02R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		บปม.	SCADA	R	บ้านสูตร
43	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short ground จุด G1							
44	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short ground จุด G2							
45	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short ground จุด G3							
46	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short ground จุด G4							
47	แจ้ง HL กฟจ.สพ.ทำการเชื่อม DDE จุด A,B เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
48	เมื่อ HL กฟจ.สพ.ทำการเชื่อม DDE จุด A,B เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
49	ย้ายโหลด SPA09 ด้านหลังบางส่วนกลับจาก SPA09 วงจรเดียวกัน							
50	SPA08S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS	บ่อปลาศิริเพ็ญ
51	SPA07S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	SCADA	DIS	หมู่บ้านจามจรี
52	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก BAM02							
53	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
54	DIS ชค.ไลน์ BAM02	ปลด	สับ		สพ.		DIS	มุกเพชร
55	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	สี่แยกมะขามล้ม
56	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
57	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	SCADA	-	-
58	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	SCADA	-	-
59	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	SCADA	-	-
60	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	SCADA	-	-
61	SPA08R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
62	SPA09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
63	BAM02R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	บ้านสูตร
สิ้นสุด Switching								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

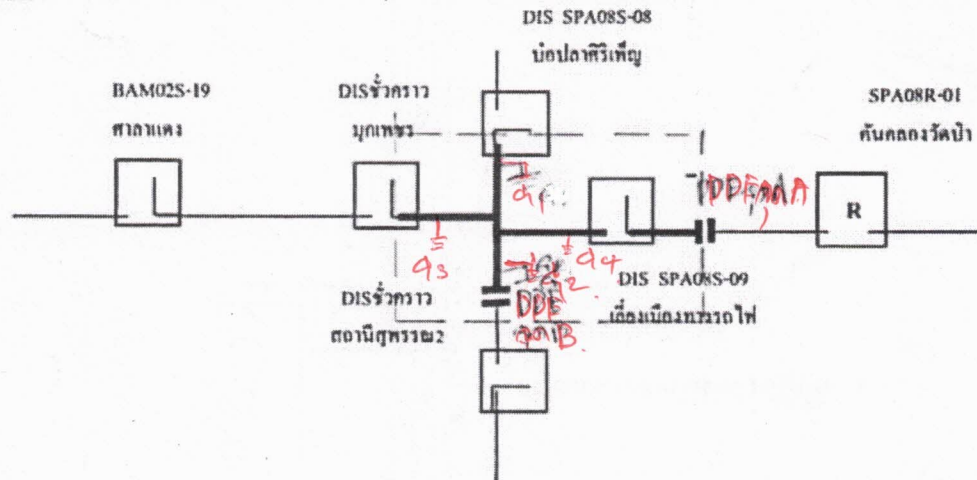
เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลยโรงแรมเทรนนิน-บ่อปลาศิริเทัญ ...เพื่อ...บีกเสาแรงสูง๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..เลยโรงแรมเทรนนิน-บ่อปลาศิริเทัญ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปริชา ทองระย้า ตำแหน่ง ชูคอสร้าง กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๐-๑๕๓๕๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร ..ตำแหน่ง หม.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก



ดับไฟเพื่อบีกเสาแรงสูง ระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒

- ๑. ย้ายโหลตพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒. ปลดโหลตจุด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเคด ๒จุด
- ๓. ตรวจสอบไฟดับ จุดหิมแก่ไฟช็อคกราวด์จุด๑และจุด๒
- ๔. แจ้งชูคอสร้าง กฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

06

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๕๘๕๕๕, ๑๕๘๖๐

5/16

PM-151V

1/15/20

